

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may	
					17	24	31	07	14	21	28		
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL - PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	150 días	lun 01/04/19	jue 29/08/19									
2	INICIO	150 días	lun 01/04/19	jue 29/08/19									
3	CANAL DE RIEGO (REVESTIMIENTO DE CANAL)	150 días	lun 01/04/19	jue 29/08/19									
4	TRABAJOS PROVISIONALES	3 días	lun 01/04/19	jue 04/04/19									
5	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.60 x 3.40m	1 día	lun 01/04/19	mar 02/04/19									
6	CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	2 días	mar 02/04/19	jue 04/04/19									
7	TRABAJOS PRELIMINARES	150 días	lun 01/04/19	jue 29/08/19									
8	HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO ANCHO 4.00m	10 días	vie 12/04/19	lun 22/04/19									
9	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CANAL	10 días	mar 02/04/19	vie 12/04/19									
10	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, CONTROL DE NIVELES	40 días	jue 04/04/19	mar 14/05/19									
11	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	140 días	lun 01/04/19	lun 19/08/19									
12	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150 días	lun 01/04/19	jue 29/08/19									
13	DEMOLICIONES	11 días	mar 02/04/19	sáb 13/04/19									
14	DEMOLICION DE TRAMOS DE CANAL EXISTENTE EN MAL ESTADO	11 días	mar 02/04/19	sáb 13/04/19									
15	DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE EN MAL ESTADO INC./ELIMINACION	3 días	mié 03/04/19	sáb 06/04/19									
16	MOVIMIENTO DE TIERRAS	121 días	mié 03/04/19	vie 02/08/19									

Proyecto: PTO CURA1.mpp Fecha: mar 28/05/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may		
					17	24	31	07	14	21	28			
17	EXCAVACION CON RETOEXCAVADORA PARA CONFORMACION DE CAJA DE CANAL	30 días	mié 03/04/19	vie 03/05/19										
18	REFINE DE PISO Y TALUD DE CAJA DE CANAL	30 días	lun 08/04/19	mié 08/05/19										
19	TRANSPORTE DE MATERIAL DE HORMIGON GRUESO MEJORADO CON PIEDRA DE 2" A 4"	40 días	mié 10/04/19	lun 20/05/19										
20	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE HORMIGON GRUESO MEJORADO CON PIEDRA DE 2" A 4"	40 días	jue 11/04/19	mar 21/05/19										
21	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO (60 AFIRMADO + 40% HORMIGON FINO)	26 días	vie 12/04/19	mié 08/05/19										
22	COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIAL (60% AFIRMADO + 40% HORMIGON FINO)	110 días	dom 14/04/19	vie 02/08/19										
23	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A D=7.5KM. DE LA OBRA	30 días	sáb 06/04/19	lun 06/05/19										
24	CANAL DE RIEGO (REVESTIMIENTO DE CANAL)	105 días	mar 16/04/19	mar 30/07/19										
25	CANAL DE RIEGO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2, e=0.15m, CEMENTO TIPO MS	80 días	jue 18/04/19	dom 07/07/19										
26	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE CANAL DE RIEGO SEGUN SECCION CON CERCHAS	75 días	mar 16/04/19	dom 30/06/19										
27	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA EN CANAL DE RIEGO @ 2.50m, e=1"	75 días	lun 29/04/19	sáb 13/07/19										
28	CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	80 días	vie 19/04/19	lun 08/07/19										
29	LIMPIEZA FINAL EN SECCION DE CANAL	90 días	mié 01/05/19	mar 30/07/19										
30	PUENTE TIPO 01	63 días	jue 04/04/19	jue 06/06/19										
31	MOVIMIENTO DE TIERRAS	19 días	jue 04/04/19	mar 23/04/19										

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	






















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may		
					17	24	31	07	14	21	28			
32	EXCAVACION MANUAL	6 días	jue 04/04/19	mié 10/04/19										
33	PREPARACION DE SUB RASANTE P/BASE DE PUENTE	3 días	vie 12/04/19	lun 15/04/19										
34	COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO e=0.30m - MANUAL	3 días	lun 15/04/19	jue 18/04/19										
35	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON GRUESO) COMPACTADO EN CAPAS e=0.20m	5 días	jue 18/04/19	mar 23/04/19										
36	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	6 días	sáb 06/04/19	vie 12/04/19										
37	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A D=7.5KM. DE LA OBRA	2 días	vie 12/04/19	dom 14/04/19										
38	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	4 días	mar 23/04/19	sáb 27/04/19										
39	SOLADO PROP 1:8 C:H e=0.10m	4 días	mar 23/04/19	sáb 27/04/19										
40	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	32 días	sáb 27/04/19	mié 29/05/19										
41	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN PUENTE TIPO 01 - CEMENTO TIPO MS	10 días	dom 19/05/19	mié 29/05/19										
42	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE PUENTE	11 días	sáb 27/04/19	mié 08/05/19										
43	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60	11 días	mié 08/05/19	dom 19/05/19										
44	OTROS	8 días	mié 29/05/19	jue 06/06/19										
45	TARRAJEO EN PUENTE PROP. 1:4 e=1.5cm	3 días	lun 03/06/19	jue 06/06/19										
46	CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	5 días	mié 29/05/19	lun 03/06/19										
47	ESTRUCTURA DE RETENCION Y PASE DE AGUA	111 días	dom 07/04/19	sáb 27/07/19										
48	MOVIMIENTO DE TIERRAS	27 días	dom 07/04/19	sáb 04/05/19										
49	EXCAVACION MANUAL	11 días	dom 07/04/19	jue 18/04/19										

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may	
					17	24	31	07	14	21	28		
50	PREPARACION DE SUB RASANTE P/BASE DE ESTRUCTURA	6 días	jue 18/04/19	mié 24/04/19									
51	COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO e=0.30m - MANUAL	5 días	mié 24/04/19	lun 29/04/19									
52	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON GRUESO) COMPACTADO EN CAPAS e=0.20m	5 días	lun 29/04/19	sáb 04/05/19									
53	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	15 días	mié 10/04/19	jue 25/04/19									
54	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A D=7.5KM. DE LA OBRA	10 días	lun 15/04/19	jue 25/04/19									
55	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	8 días	sáb 04/05/19	dom 12/05/19									
56	SOLADO PROP 1:8 C:H e=0.10m	8 días	sáb 04/05/19	dom 12/05/19									
57	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	36 días	dom 12/05/19	lun 17/06/19									
58	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE RETENCION	15 días	dom 02/06/19	lun 17/06/19									
59	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE RETENCION	9 días	dom 12/05/19	mar 21/05/19									
60	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60	12 días	mar 21/05/19	dom 02/06/19									
61	OTROS	40 días	lun 17/06/19	sáb 27/07/19									
62	TARRAJEO DE ESTRUCTURAS DE RETENCION 1:4, e=1.5cm	15 días	vie 12/07/19	sáb 27/07/19									
63	CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	15 días	jue 27/06/19	vie 12/07/19									
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA DE 1.25m x 2.30m SEGUN DISEÑO	10 días	lun 17/06/19	jue 27/06/19									
65	REPOSICION DE PAÑOS DETERIORADOS	64 días	mié 10/04/19	jue 13/06/19									

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may	
					17	24	31	07	14	21	28		
66	TRABAJO PRELIMINARES	8 días	mié 10/04/19	jue 18/04/19									
67	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	8 días	mié 10/04/19	jue 18/04/19									
68	DEMOLICIONES	16 días	jue 18/04/19	sáb 04/05/19									
69	DEMOLICION DE TRAMOS DE CANAL EXISTENTE EN MAL ESTADO	16 días	jue 18/04/19	sáb 04/05/19									
70	MOVIMIENTO DE TIERRAS	59 días	sáb 13/04/19	mar 11/06/19									
71	EXCAVACION MANUAL EN SECCION DE CANAL	11 días	sáb 13/04/19	mié 24/04/19									
72	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN SECCION DE CANAL - MANUAL	11 días	mar 16/04/19	sáb 27/04/19									
73	COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO (60% AFIRMADO + 40% DE HORMIGON FINO) e=0.20m	51 días	dom 21/04/19	mar 11/06/19									
74	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	20 días	mar 16/04/19	lun 06/05/19									
75	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A D=7.5KM. DE LA OBRA	15 días	lun 22/04/19	mar 07/05/19									
76	CANAL DE RIEGO PAÑOS DETERIORADOS	50 días	mié 24/04/19	jue 13/06/19									
77	CANAL DE RIEGO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2, e=0.15m, CEMENTO TIPO MS	25 días	sáb 27/04/19	mié 22/05/19									
78	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE CANAL DE RIEGO SEGUN SECCION A REPONER	11 días	mié 24/04/19	dom 05/05/19									
79	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA EN CANAL DE RIEGO @ 2.50m, e=1"	9 días	sáb 25/05/19	lun 03/06/19									
80	CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	25 días	mar 30/04/19	sáb 25/05/19									
81	LIMPIEZA FINAL EN SECCION DE CANAL A REPONER	10 días	lun 03/06/19	jue 13/06/19									

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may	
					17	24	31	07	14	21	28		
82	RESERVORIO	52 días	sáb 13/04/19	mar 04/06/19									
83	TRABAJO PRELIMINARES	18 días	sáb 13/04/19	mié 01/05/19									
84	LIMPIEZA Y DESBROCE DE RESERVORIO	10 días	sáb 13/04/19	mar 23/04/19									
85	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, CONTROL DE NIVELES DE RESERVORIO	15 días	mar 16/04/19	mié 01/05/19									
86	MOVIMIENTO DE TIERRAS	28 días	lun 22/04/19	lun 20/05/19									
87	EXCAVACION CON RETOEXCAVADORA PARA CONFORMACION DE RESERVORIO	20 días	lun 22/04/19	dom 12/05/19									
88	REFINE Y PERFILADO DE PISO Y TALUD DE RESERVORIO	15 días	sáb 27/04/19	dom 12/05/19									
89	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO (60 AFIRMADO + 40% HORMIGON FINO)	9 días	lun 29/04/19	mié 08/05/19									
90	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO (60% AFIRMADO + 40% HORMIGON FINO)	20 días	mar 30/04/19	lun 20/05/19									
91	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A D=7.5KM. DE LA OBRA	8 días	dom 12/05/19	lun 20/05/19									
92	CONCRETO SIMPLE	15 días	lun 20/05/19	mar 04/06/19									
93	DADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJE DE GEOMEMBRANA HDPE - 0.75mm	15 días	lun 20/05/19	mar 04/06/19									
94	SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA	15 días	lun 20/05/19	mar 04/06/19									
95	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE HDPE	15 días	lun 20/05/19	mar 04/06/19									
96	TUBERIA - LINEA DE IMPULSION DE RESERVORIO	55 días	mar 16/04/19	lun 10/06/19									
97	TRABAJO PRELIMINARES	17 días	mar 16/04/19	vie 03/05/19									

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may	
					17	24	31	07	14	21	28		
98	LIMPIEZA Y DESBROCE DE LINEA DE IMPULSION EN TUBERIA	7 días	mar 16/04/19	mar 23/04/19									
99	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, CONTROL DE NIVELES	15 días	jue 18/04/19	vie 03/05/19									
100	MOVIMIENTO DE TIERRAS	48 días	mar 23/04/19	lun 10/06/19									
101	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.50x0.60m PARA LINEA DE IMPULSION DE TUBERIA DE 8"	20 días	mar 23/04/19	lun 13/05/19									
102	TRANSPORTE DE ARENA FINA SELECCIONADO	15 días	dom 28/04/19	lun 13/05/19									
103	RELLENO DE PROTECCION CON ARENA FINA EN TUBERIA DE IMPULSION	35 días	mié 01/05/19	mié 05/06/19									
104	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA RELLENOS DE TUBERIA DE IMPULSION	35 días	lun 06/05/19	lun 10/06/19									
105	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A D=7.5KM. DE LA OBRA	13 días	vie 26/04/19	jue 09/05/19									
106	TENDIDO DE TUBERIA	35 días	mié 01/05/19	mié 05/06/19									
107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC 8"	35 días	mié 01/05/19	mié 05/06/19									
108	CASETA DE BOMBEO	77 días	vie 19/04/19	vie 05/07/19									
109	TRABAJOS PRELIMINARES	4 días	vie 19/04/19	mar 23/04/19									
110	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CASETA DE BOMBEO	2 días	vie 19/04/19	dom 21/04/19									
111	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, CONTROL DE NIVELES	2 días	dom 21/04/19	mar 23/04/19									
112	MOVIMIETO DE TIERRAS - CASETA DE BOMBEO	15 días	mar 23/04/19	mié 08/05/19									
113	EXCAVACION MANUAL PARA EXCAVACION	5 días	mar 23/04/19	dom 28/04/19									
114	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	2 días	dom 28/04/19	mar 30/04/19									

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	






















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may	
					17	24	31	07	14	21	28		
115	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE HORMIGON GRUESO MEJORADO CON PIEDRA DE 2" A 4"	4 días	mar 30/04/19	sáb 04/05/19									
116	COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIAL (60% AFIRMADO + 40% HORMIGON FINO)	4 días	sáb 04/05/19	mié 08/05/19									
117	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A D=2.00 KM DE LA OBRA	2 días	jue 25/04/19	sáb 27/04/19									
118	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN CASETA DE BOMBEO	25 días	lun 29/04/19	vie 24/05/19									
119	SOLADO PROP 1:8 C:H e=0.10m	3 días	lun 29/04/19	jue 02/05/19									
120	CIMIENTO CORRIDO PROP. C:H e=0.10m	5 días	dom 05/05/19	vie 10/05/19									
121	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE CIMIENTO CORRIDO EN CASETA DE BOMBEO	4 días	mié 01/05/19	dom 05/05/19									
122	SOBRECIMIENTO PROP. C:H 1:10 + 30% PM	5 días	lun 13/05/19	sáb 18/05/19									
123	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN CASETA DE BOMBEO	3 días	vie 10/05/19	lun 13/05/19									
124	FALSO PISO - CASETA DE BOMBEO	3 días	sáb 18/05/19	mar 21/05/19									
125	PISO PULIDO DE e=0.10cm	3 días	mar 21/05/19	vie 24/05/19									
126	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	26 días	dom 05/05/19	vie 31/05/19									
127	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CASETA DE BOMBEO - CEMENTO TIPO MS	15 días	jue 16/05/19	vie 31/05/19									
128	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL DE CASETA DE BOMBEO	10 días	lun 13/05/19	jue 23/05/19									

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may
					17	24	31	07	14	21	28	
129	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - CASETA DE BOMBEO	8 días	dom 05/05/19	lun 13/05/19								
130	MAMPOSTERIA	15 días	vie 31/05/19	sáb 15/06/19								
131	MURO APAREJO DE SOGA	15 días	vie 31/05/19	sáb 15/06/19								
132	REVOQUES Y ENLUCIDOS	18 días	lun 17/06/19	vie 05/07/19								
133	TARRAJEO INTERIOR DE MUROS, e=1.5cm	7 días	lun 17/06/19	lun 24/06/19								
134	TARRAJEO EXTERIOR DE MUROS, e=1.5cm	7 días	lun 24/06/19	lun 01/07/19								
135	TARRAJEO DE COLUMNAS, e=1.5cm	7 días	lun 24/06/19	lun 01/07/19								
136	TARRAJEO DE VANOS, e=1.5CM	4 días	vie 21/06/19	mar 25/06/19								
137	TARRAJEO DE CIELO RAZO, e=1.5CM	4 días	lun 01/07/19	vie 05/07/19								
138	CARPINETRIA DE MADERA	4 días	lun 17/06/19	vie 21/06/19								
139	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA	4 días	lun 17/06/19	vie 21/06/19								
140	CARPINTERIA DE ALUMINIO	8 días	mar 25/06/19	mié 03/07/19								
141	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO OSCURO E=6MM HOJAS CORREDIZAS	8 días	mar 25/06/19	mié 03/07/19								
142	OTROS	17 días	vie 31/05/19	lun 17/06/19								
143	CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	17 días	vie 31/05/19	lun 17/06/19								
144	EXPROPIACIONES	45 días	lun 01/04/19	jue 16/05/19								
145	REMUNERACION POR UTILIZACION DE TERRENO AGRICOLA PRIVADO	45 días	lun 01/04/19	jue 16/05/19								
146	INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL	45 días	lun 01/04/19	jue 16/05/19								

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	






















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may
					17	24	31	07	14	21	28	
147	ELABORACION Y EJECUCION DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL	45 días	lun 01/04/19	jue 16/05/19								
148	OBTENCION DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICO	45 días	lun 01/04/19	jue 16/05/19								
149	RED PRIMARIA	78 días	vie 31/05/19	sáb 17/08/19								
150	SUMINISTRO DE MATERIALES	72 días	vie 31/05/19	dom 11/08/19								
151	POSTES Y MATERIAL DE CONCRETO	20 días	vie 31/05/19	jue 20/06/19								
152	POSTES C.A.C DE 13/400/180/375	10 días	vie 31/05/19	lun 10/06/19								
153	POSTE C.A.C DE 13/600/210/405	10 días	lun 10/06/19	jue 20/06/19								
154	CRUCETA SIMETRICA DE C.A.V. DE 2.00M	10 días	lun 10/06/19	jue 20/06/19								
155	CRUCETA ASIMÉTRICA DE C.V. DE 1.50M	10 días	lun 10/06/19	jue 20/06/19								
156	MEDIA PLATAFORMA DE CAV DE 1.30 M	10 días	lun 10/06/19	jue 20/06/19								
157	PROTECCIÓN CON CRISTAFLEX	10 días	lun 10/06/19	jue 20/06/19								
158	PROTECCION CON PINTURA BITUMINOSA	10 días	lun 10/06/19	jue 20/06/19								
159	CONDUCTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS	24 días	dom 02/06/19	mié 26/06/19								
160	CONDUCTOR DE ALEACIÓN ALUMINIO AAAC DESNUDO, CALIBRE 35MM2	20 días	dom 02/06/19	sáb 22/06/19								
161	CONDUCTOR DE COBRE DURO DE 25 MM2/CONEX. A TRAFOS Y SECCIONAMIENTO	10 días	mié 05/06/19	sáb 15/06/19								
162	CONDUCTOR DE COBRE BLANDO 25 MM2/ATERRAM A FERRETERIA	20 días	jue 06/06/19	mié 26/06/19								
163	CABLE ELECTRICO NYY 3 X 70 MM2.	20 días	jue 06/06/19	mié 26/06/19								
164	CABLE NYY 3-1X10 MM2	5 días	jue 06/06/19	mar 11/06/19								

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may
					17	24	31	07	14	21	28	
165	FERRETERIA Y ACCESORIOS	28 días	jue 06/06/19	jue 04/07/19								
166	AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN, 27 Kv, LINEA DE FUGA CON ESPIGA	5 días	jue 06/06/19	mar 11/06/19								
167	ESPIGA LARGA DE Fº Gº P/CRUCETA, DE 19 MM Ø X 356 MM DE LONG	4 días	mar 11/06/19	sáb 15/06/19								
168	AISLADOR POLIMÉRICO DE SUSPENSIÓN CON ACCESORIOS	12 días	sáb 15/06/19	jue 27/06/19								
169	AISLADOR EXTENSOR DE LÍNEA DE FUGA	6 días	dom 16/06/19	sáb 22/06/19								
170	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 02 PERNOS.	12 días	dom 16/06/19	vie 28/06/19								
171	ADAPTADOR TIPO LIRA DE FºGº DE 16 MM Ø X 356 MM DE LONGITUD	12 días	dom 16/06/19	vie 28/06/19								
172	CONECTOR BIMETÁLICO TIPO CUÑA (L)	12 días	dom 16/06/19	vie 28/06/19								
173	CONECTOR (SPLIT BOLT) TIPO PERNO PARTIDO P/CONDUCTOR DE 25 MM2	14 días	dom 16/06/19	dom 30/06/19								
174	PERNO MAQUINADO DE Fº Gº DE 16MM X 405 MM DE LONGITUD, CON 02 ARANDELAS, TUERCAS Y CONTRATUERCAS	7 días	dom 16/06/19	dom 23/06/19								
175	PERNO OJO DE FºGº DE 16MM X 356MM DE LONGITUD, MAQUINADO CON 02 ARANDELAS, TUERCAS Y CONTRATUERCAS	9 días	dom 16/06/19	mar 25/06/19								
176	ARANDELA CUADRADA PLANA Fº Gº 57X57X5MM AGUJERO DE 20M	18 días	dom 16/06/19	jue 04/07/19								
177	ARANDELA CUADRADA CURVA DE Fº Gº 57X57X5 MM AGUJERO DE 20MM	6 días	dom 16/06/19	sáb 22/06/19								
178	PLANCHA DE COBRE TIPO "J" PARA PUESTA A TIERRA	12 días	dom 16/06/19	vie 28/06/19								

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	






















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may
					17	24	31	07	14	21	28	
179	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	12 días	dom 16/06/19	vie 28/06/19								
180	VARILLA PREFORME SIMPLE DE ARMAR DE ALUMINIO	7 días	dom 16/06/19	dom 23/06/19								
181	SECCIONADORES	19 días	jue 04/07/19	mar 23/07/19								
182	SECCIONADOR TIPO CUT OUT 27 KV,150 KV BIL	6 días	jue 04/07/19	mié 10/07/19								
183	FUSIBLE TIPO K 3 Amp	3 días	mié 10/07/19	sáb 13/07/19								
184	CUBIERTA AISLANTE DE 22.9 KV	12 días	jue 11/07/19	mar 23/07/19								
185	PUESTA A TIERRA	5 días	sáb 13/07/19	jue 18/07/19								
186	POZO PUESTA A TIERRA	5 días	sáb 13/07/19	jue 18/07/19								
187	TRANSFORMADOR Y TABLERO DE DISTRIBUCION	24 días	jue 18/07/19	dom 11/08/19								
188	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA, 22.9/0.440-0.22 KV	7 días	jue 18/07/19	jue 25/07/19								
189	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	5 días	jue 25/07/19	mar 30/07/19								
190	TERMINALES DE COMPRESIÓN DE 160 AMP.	12 días	mar 30/07/19	dom 11/08/19								
191	MONTAJE ELECTROMECHANICO	44 días	jue 04/07/19	sáb 17/08/19								
192	OBRAS PRELIMINARES	10 días	jue 04/07/19	dom 14/07/19								
193	REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE RED PRIMARIA	10 días	jue 04/07/19	dom 14/07/19								
194	MONTAJE DE POSTES	38 días	vie 05/07/19	lun 12/08/19								
195	REPLIEGE DE ESTRUCTURAS DE 13 M HASTA PUNTO DE IZAMIENTO	10 días	vie 05/07/19	lun 15/07/19								
196	EXCAVACIÓN DE HOYO DE POSTES DE 13M	5 días	lun 15/07/19	sáb 20/07/19								
197	IZAJE Y CIMENTACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 13M	3 días	vie 09/08/19	lun 12/08/19								
198	INSTALACIÓN DE CRUCETAS Y PALOMILLAS	4 días	mié 24/07/19	dom 28/07/19								
199	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MONOPOSTE	4 días	mié 24/07/19	dom 28/07/19								

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	






















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may
					17	24	31	07	14	21	28	
200	PROTECCIÓN BASE DE POSTE CON CONOS DE REFUERZO	4 días	mié 24/07/19	dom 28/07/19								
201	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FONDO EN POSTE DE 13 M	4 días	sáb 20/07/19	mié 24/07/19								
202	MONTAJE DE ARMADOS	16 días	mié 24/07/19	vie 09/08/19								
203	ARMADO DE PUNTO DE DISEÑO P.A.	4 días	mié 24/07/19	dom 28/07/19								
204	ARMADO EN POSTE SECCIONAMIENTO PS	4 días	dom 28/07/19	jue 01/08/19								
205	ARMADO DE POSTE DE ALINEAMIENTO	4 días	jue 01/08/19	lun 05/08/19								
206	MONTAJE DE ARMADO SAM, INC ACCESORIOS Y FERRETERÍA	4 días	lun 05/08/19	vie 09/08/19								
207	MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y TABLERO	4 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19								
208	MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA, TRIFASICO	4 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19								
209	MONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	4 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19								
210	MONTAJE DE SISTEMA DE SECCIONAMIENTO	4 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19								
211	TENDIDO DE CONDUCTOR Y PUESTA A FLECHA	4 días	mar 13/08/19	sáb 17/08/19								
212	TENDIDO Y PUESTA DE CABLE ELECTRICO NYY 3 X 70 MM2.	4 días	mar 13/08/19	sáb 17/08/19								
213	TENDIDO Y PUESTA DE CABLE NYY 3-1X10 MM2	4 días	mar 13/08/19	sáb 17/08/19								
214	MONTAJE DE PUESTA A TIERRA	4 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19								
215	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA INCLUYE EXCAVACION	4 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19								
216	OTROS	28 días	sáb 20/07/19	sáb 17/08/19								
217	ENUMERACIÓN DE POSTES	4 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19								
218	ROTULADO DE SÍMBOLOS DE PUESTA A TIERRA	4 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19								
219	ROTULADO DE SEÑALES DE PELIGRO EN TABLERO	4 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19								
220	ROTULADO DE SEÑALES DE PELIGRO EN POSTES	4 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19								

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	






















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may
					17	24	31	07	14	21	28	
221	DERECHO DE CORTE Y EMPALME PROGRAMADO POR ENOSA	4 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19								
222	DERECHO DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ENOSA	4 días	mar 13/08/19	sáb 17/08/19								
223	TRANSPORTE DE MATERIALES	4 días	sáb 20/07/19	mié 24/07/19								
224	PÓLIZA DE SEGURO DE RIESGO ELÉCTRICO	4 días	mar 13/08/19	sáb 17/08/19								
225	EQUIPAMIENTO	35 días	mié 24/07/19	mié 28/08/19								
226	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN ESTACION DE BOMBEO	35 días	mié 24/07/19	mié 28/08/19								
227	EQUIPAMIENTO ELECTROBOMBAS - ACCESORIOS	17 días	mié 24/07/19	sáb 10/08/19								
228	EQUIPAMIENTO MOTOR 3Ø, 440V-60HZ, FS 1.15	5 días	mié 24/07/19	lun 29/07/19								
229	BOMBA CENTRIFUGA-Q=32/ L/SEG HDT=67MTS BASE DE ACERO-ACOPLE	17 días	mié 24/07/19	sáb 10/08/19								
230	SUMINISTRO DE VALVULAS	2 días	sáb 10/08/19	lun 12/08/19								
231	VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO CHECK 8" Ø DN 200 BRIDADA	2 días	sáb 10/08/19	lun 12/08/19								
232	VÁLVULA DE PIE CON REJILLA 8" Ø DN 200 BRIDADA	2 días	sáb 10/08/19	lun 12/08/19								
233	VALVULA COMPUERTA DE 2" Ø DN 50 BRIDADA	2 días	sáb 10/08/19	lun 12/08/19								
234	VALVULA COMPUERTA DE 8" Ø DN 50 BRIDADA	2 días	sáb 10/08/19	lun 12/08/19								
235	VÁLVULA ROMPE PRESIÓN 2" Ø DN 50 BRIDADA	2 días	sáb 10/08/19	lun 12/08/19								
236	SUMINISTRO DE UNIONES-TUBERIAS-OTROS	16 días	lun 12/08/19	mié 28/08/19								
237	UNIÓN FLEXIBLE DREESER DN 200 BRIDADA	4 días	lun 12/08/19	vie 16/08/19								
238	TUBERÍA DE 8" (DN200) Ø, FE E = 3/16"	11 días	vie 16/08/19	mar 27/08/19								
239	TUBERÍA DE 2" (DN50) Ø, FE E = 3/16"	4 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19								
240	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE 8" A 6" Ø (VARIABLE)	4 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19								

Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may
					17	24	31	07	14	21	28	
241	EXPANSIÓN CONCENTRICA DE 4" A 8" Ø (VARIABLE)	12 días	vie 16/08/19	mié 28/08/19								
242	BRIDA DN 200	4 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19								
243	BRIDA DN 50	4 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19								
244	CODO 45° FFD 200	4 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19								
245	KIT DE PERNOS Y EMPAQUETADURAS	4 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19								
246	SOPORTE DE ESTRUCTURA DE FFD PARA TUBERÍA DE 6"	4 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19								
247	SUMINISTRO DE MANÓMETROS-VACUOMETROS	4 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19								
248	VACUOMETRO	4 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19								
249	MANÓMETRO Y ACCESORIOS	4 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19								
250	SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL Y MANDO-OTROS	4 días	lun 12/08/19	vie 16/08/19								
251	TABLERO DE CONTROL Y MANDO PARA MOTOR, 440V CON ARRANCADOR SOFT STAR (VER ESPECIFIC. TÉCNICAS)	4 días	lun 12/08/19	vie 16/08/19								
252	MONTAJE DEL SISTEMA DE BOMBEO: MOTOR-BOMBA-JUNTAS-TABLEROS Y OTROS	4 días	lun 12/08/19	vie 16/08/19								
253	SUMIN. E INST. DE CONDUCTOR THW 3-1X50MM2+35mm2, DESDE EL TABLERO DE CONTROL Y MANDO A MOTOR	4 días	lun 12/08/19	vie 16/08/19								
254	INSTALACIÓN DE DADO DE CONCRETO PARA TUBERÍAS (VER PLANOS)	4 días	lun 12/08/19	vie 16/08/19								
255	EXP. REPLANTEO PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, GARANTÍA, CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO	4 días	lun 12/08/19	vie 16/08/19								
256	INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS	8 días	vie 16/08/19	sáb 24/08/19								
257	EQUIPO DE ALUMBRADO PÚBLICO	8 días	vie 16/08/19	sáb 24/08/19								


Proyecto: PTO CURA1.mpp
Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '19							may
					17	24	31	07	14	21	28	
258	LUMINARIA LED 50W INCL. EQUIPOS AUXILIARES	4 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19								
259	PASTORAL DE F°G° 1 1/2" INCLU. ABRAZADERA	4 días	mar 20/08/19	sáb 24/08/19								
260	CABLE TIPO NLT 2X2.5MM2	4 días	mar 20/08/19	sáb 24/08/19								
261	CONECTOR TIPO CUÑA DE 2.5MM2, AZUL TIPO IV	4 días	mar 20/08/19	sáb 24/08/19								
262	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES	8 días	mié 24/07/19	jue 01/08/19								
263	TABLEROS ELECTRICOS	4 días	mié 24/07/19	dom 28/07/19								
264	SUMINISTRO Y COLOC. DE ST (SUB TABLERO)(DE 0.30 X 0,20 X 0,15 MTS)	4 días	mié 24/07/19	dom 28/07/19								
265	INSTALACIONES DE INTERIOR	4 días	dom 28/07/19	jue 01/08/19								
266	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO	4 días	dom 28/07/19	jue 01/08/19								
267	SALIDA Y SUMIN. TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	4 días	dom 28/07/19	jue 01/08/19								




Proyecto: PTO CURA1.mpp Fecha: mar 28/05/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

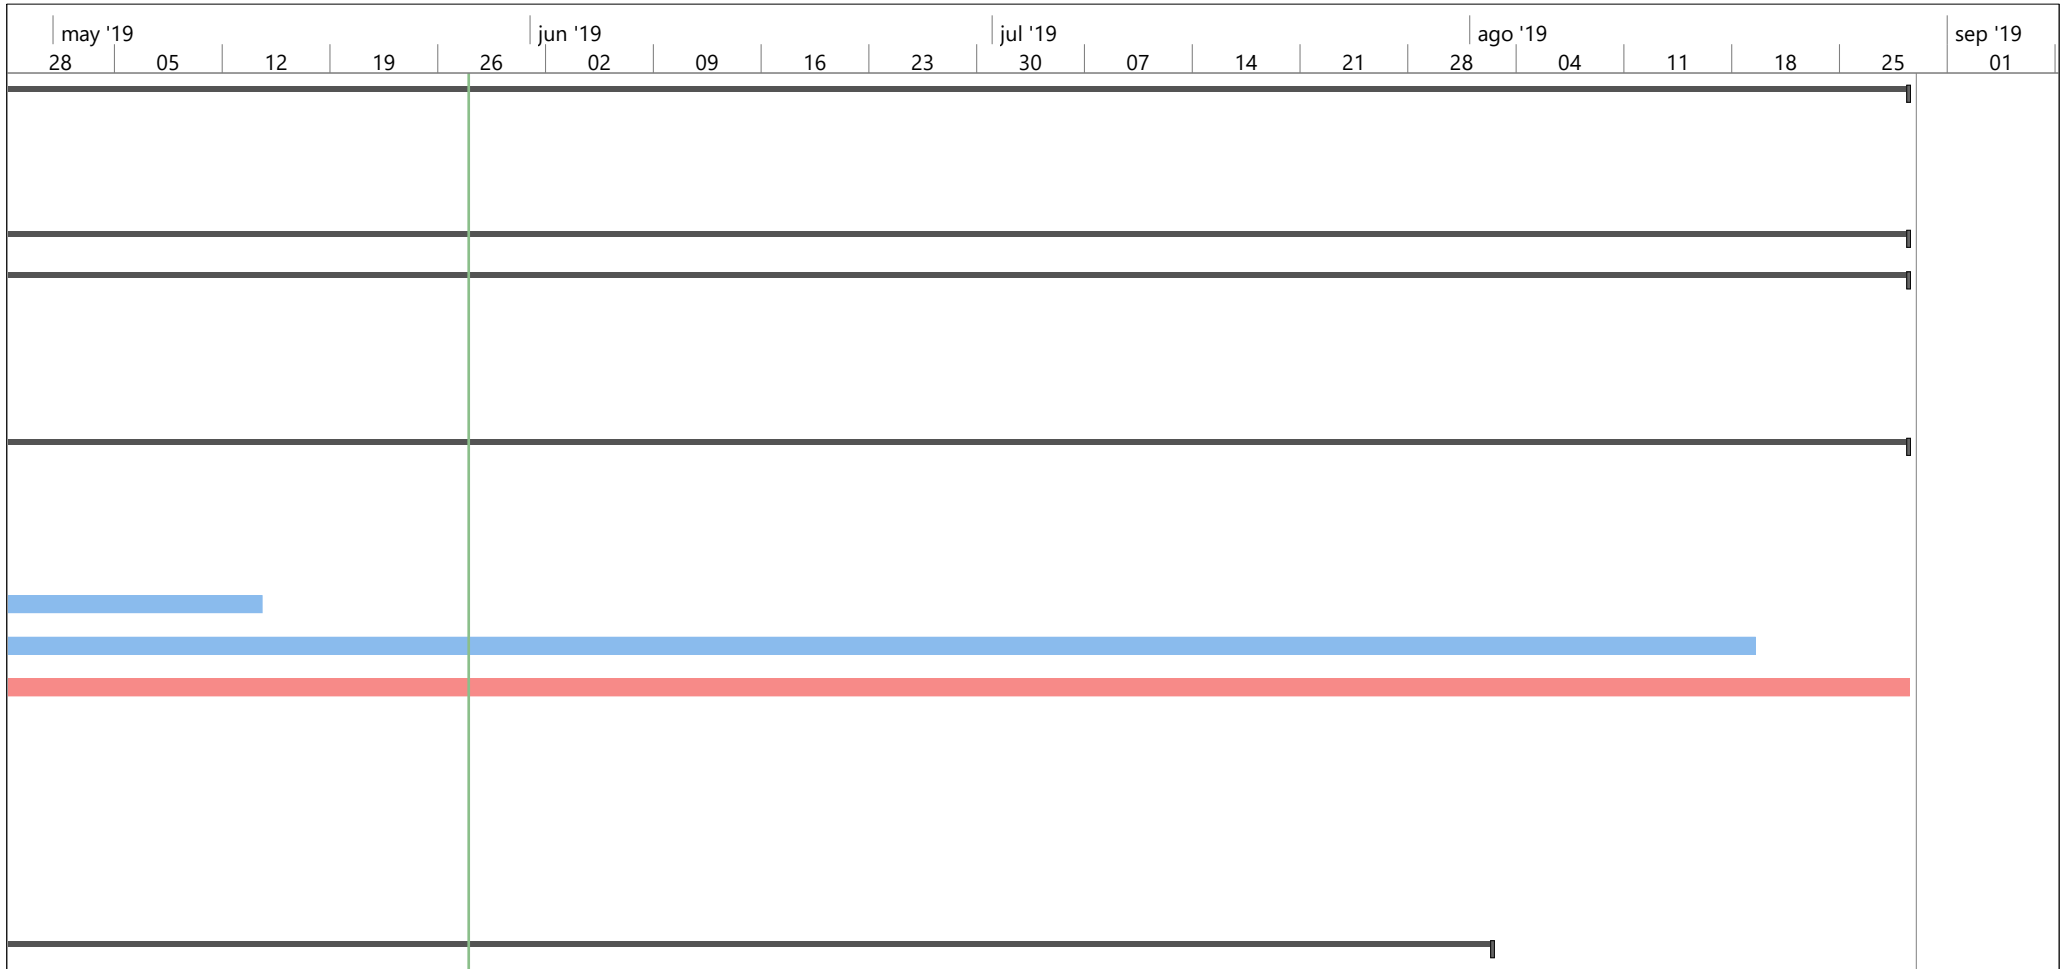


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

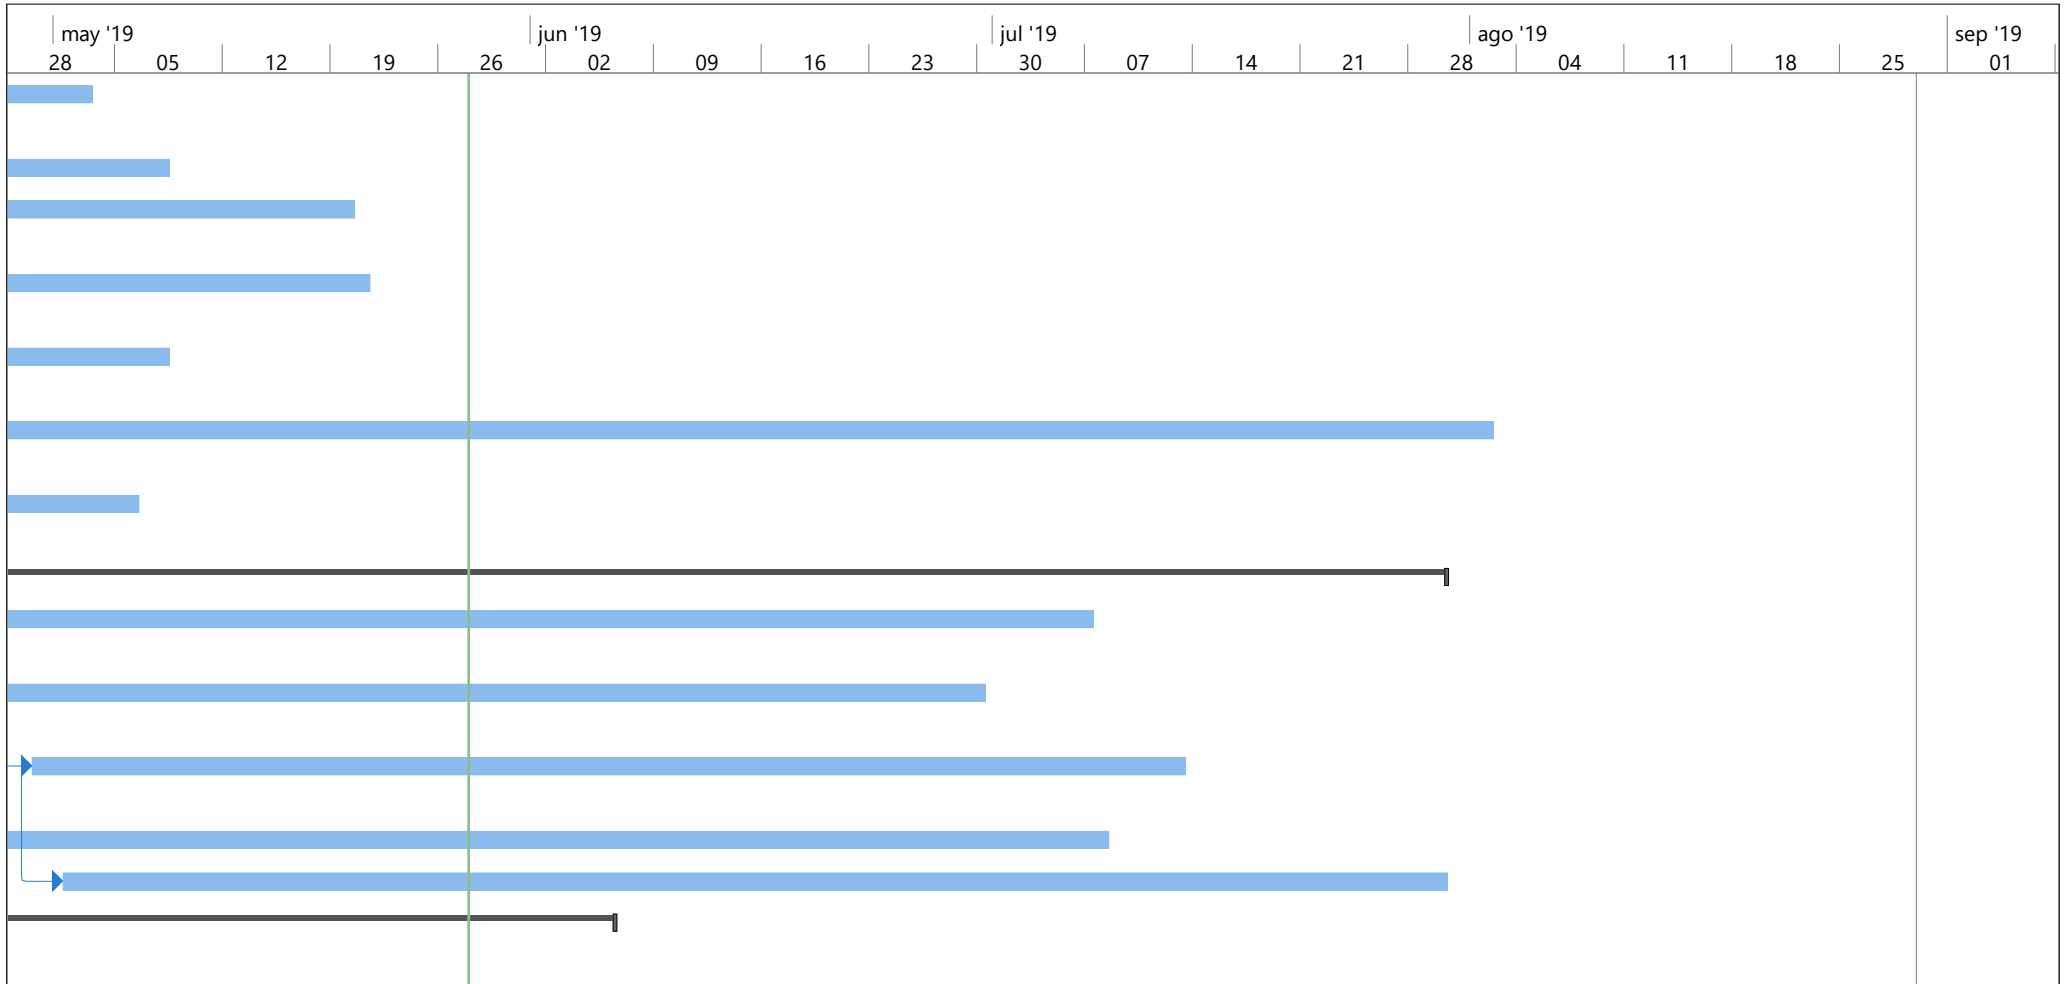


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

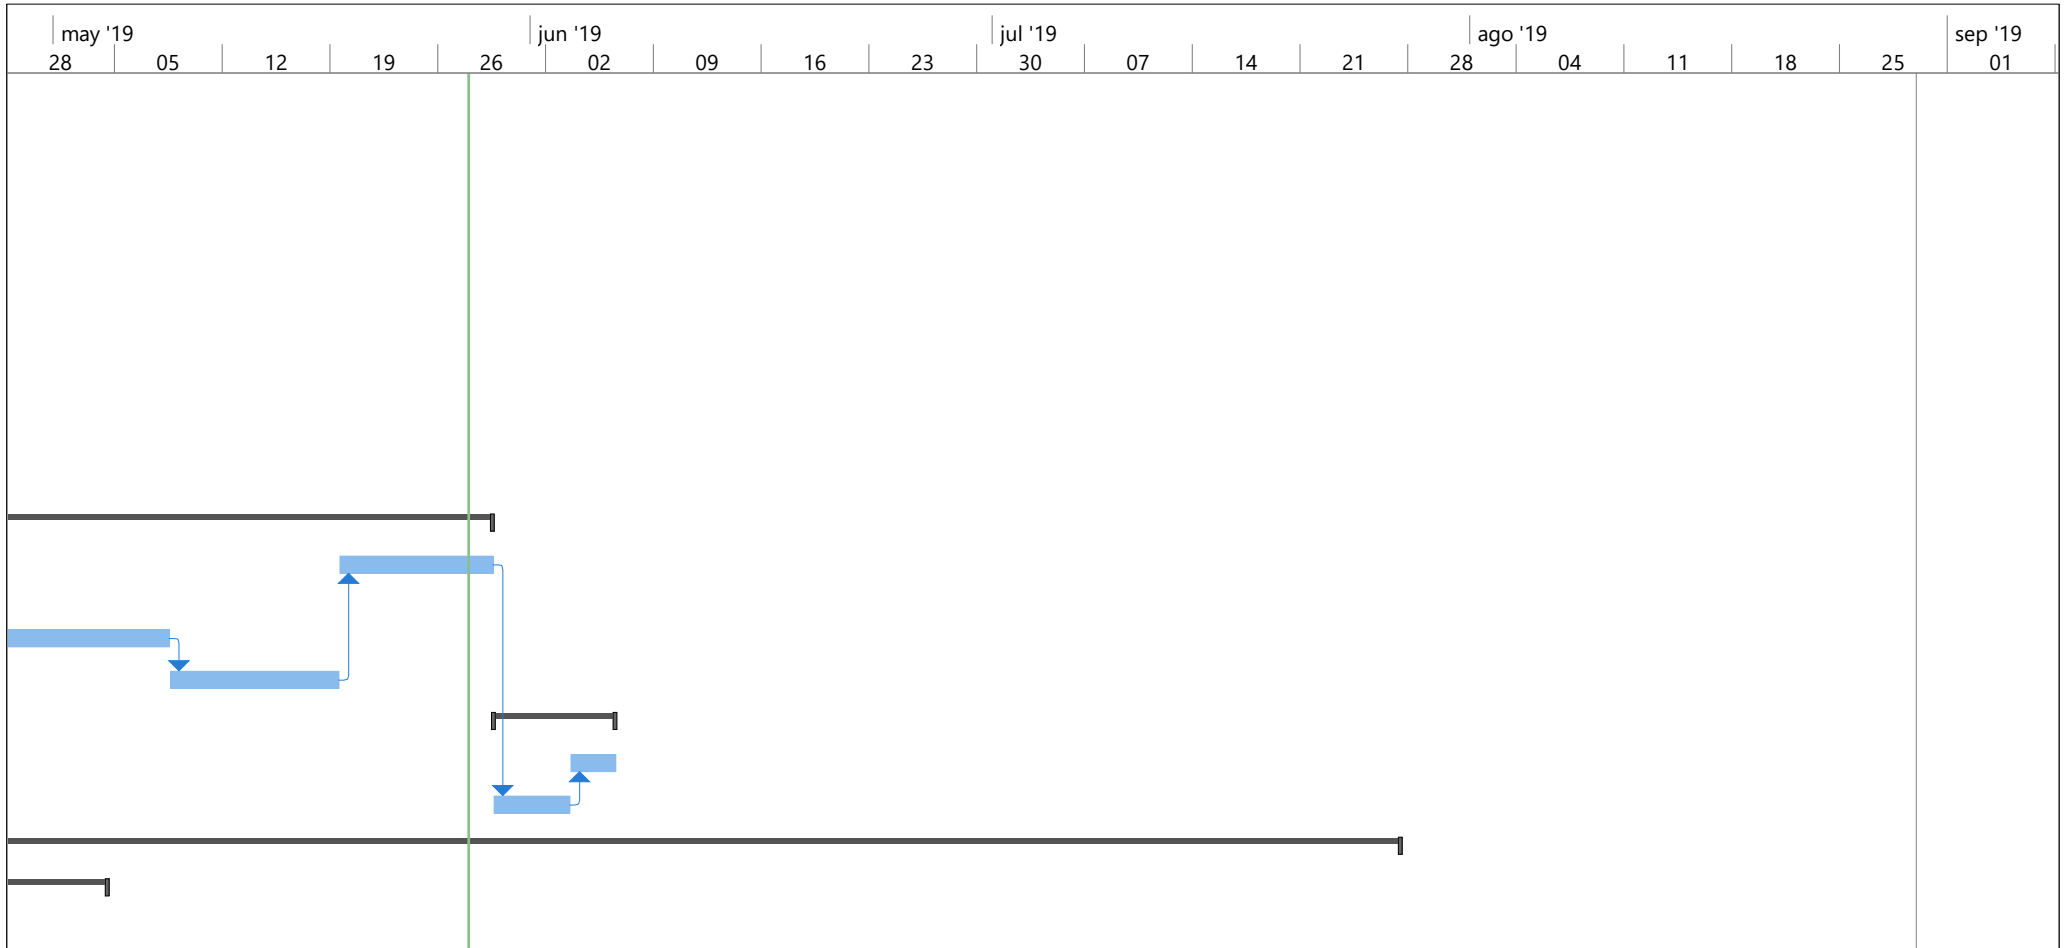


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

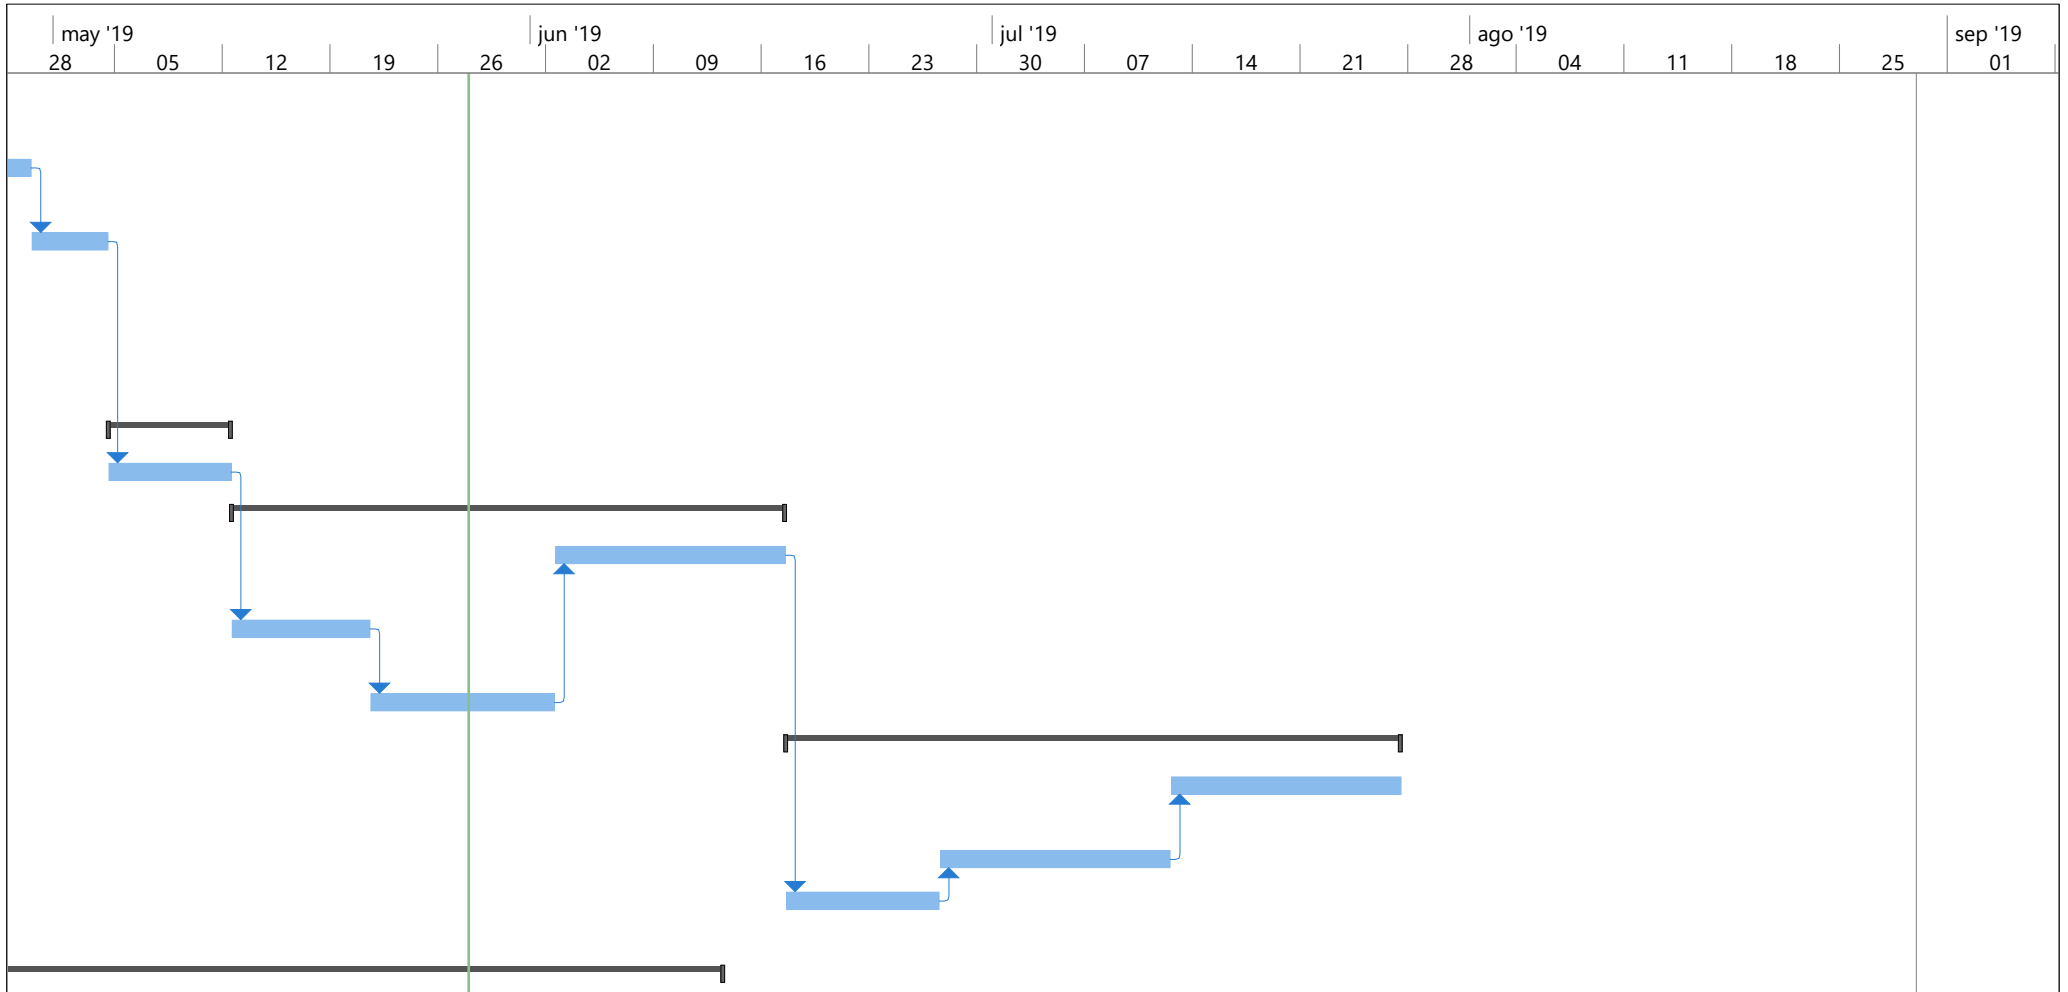


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

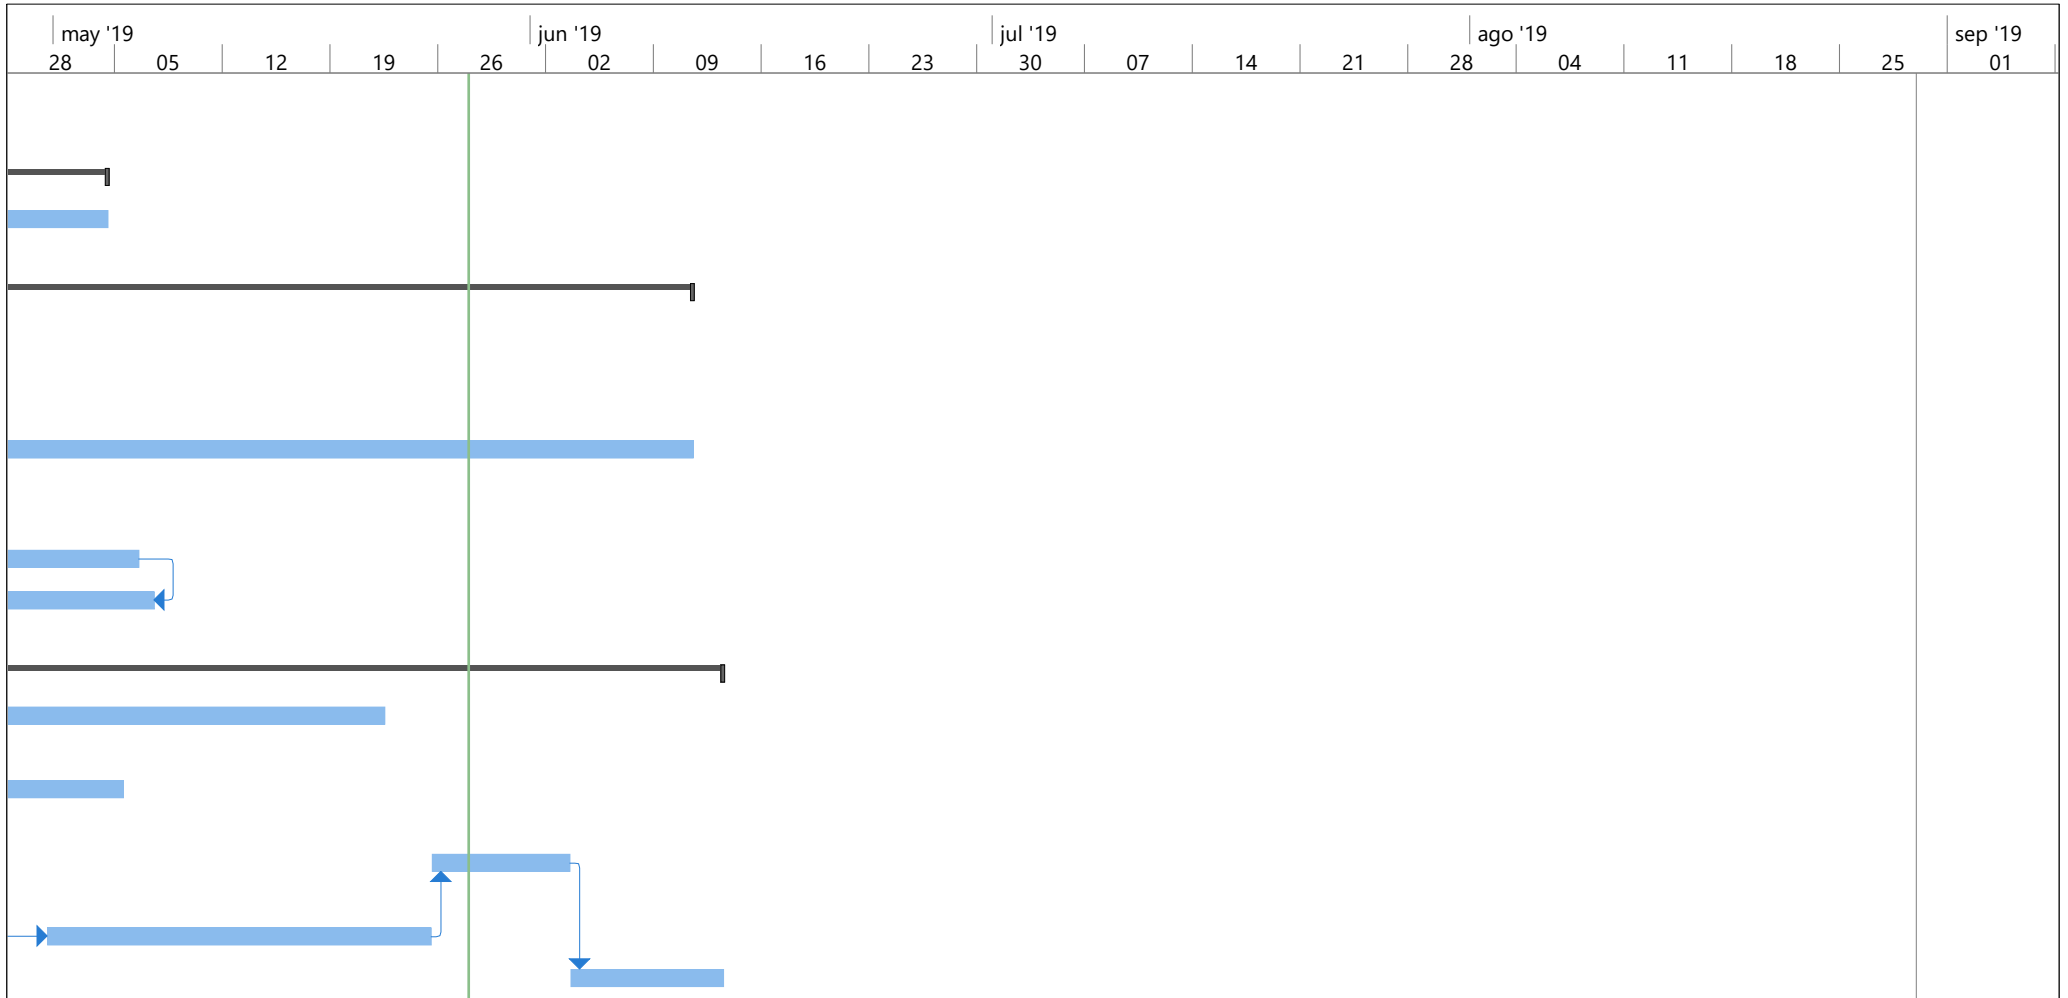


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

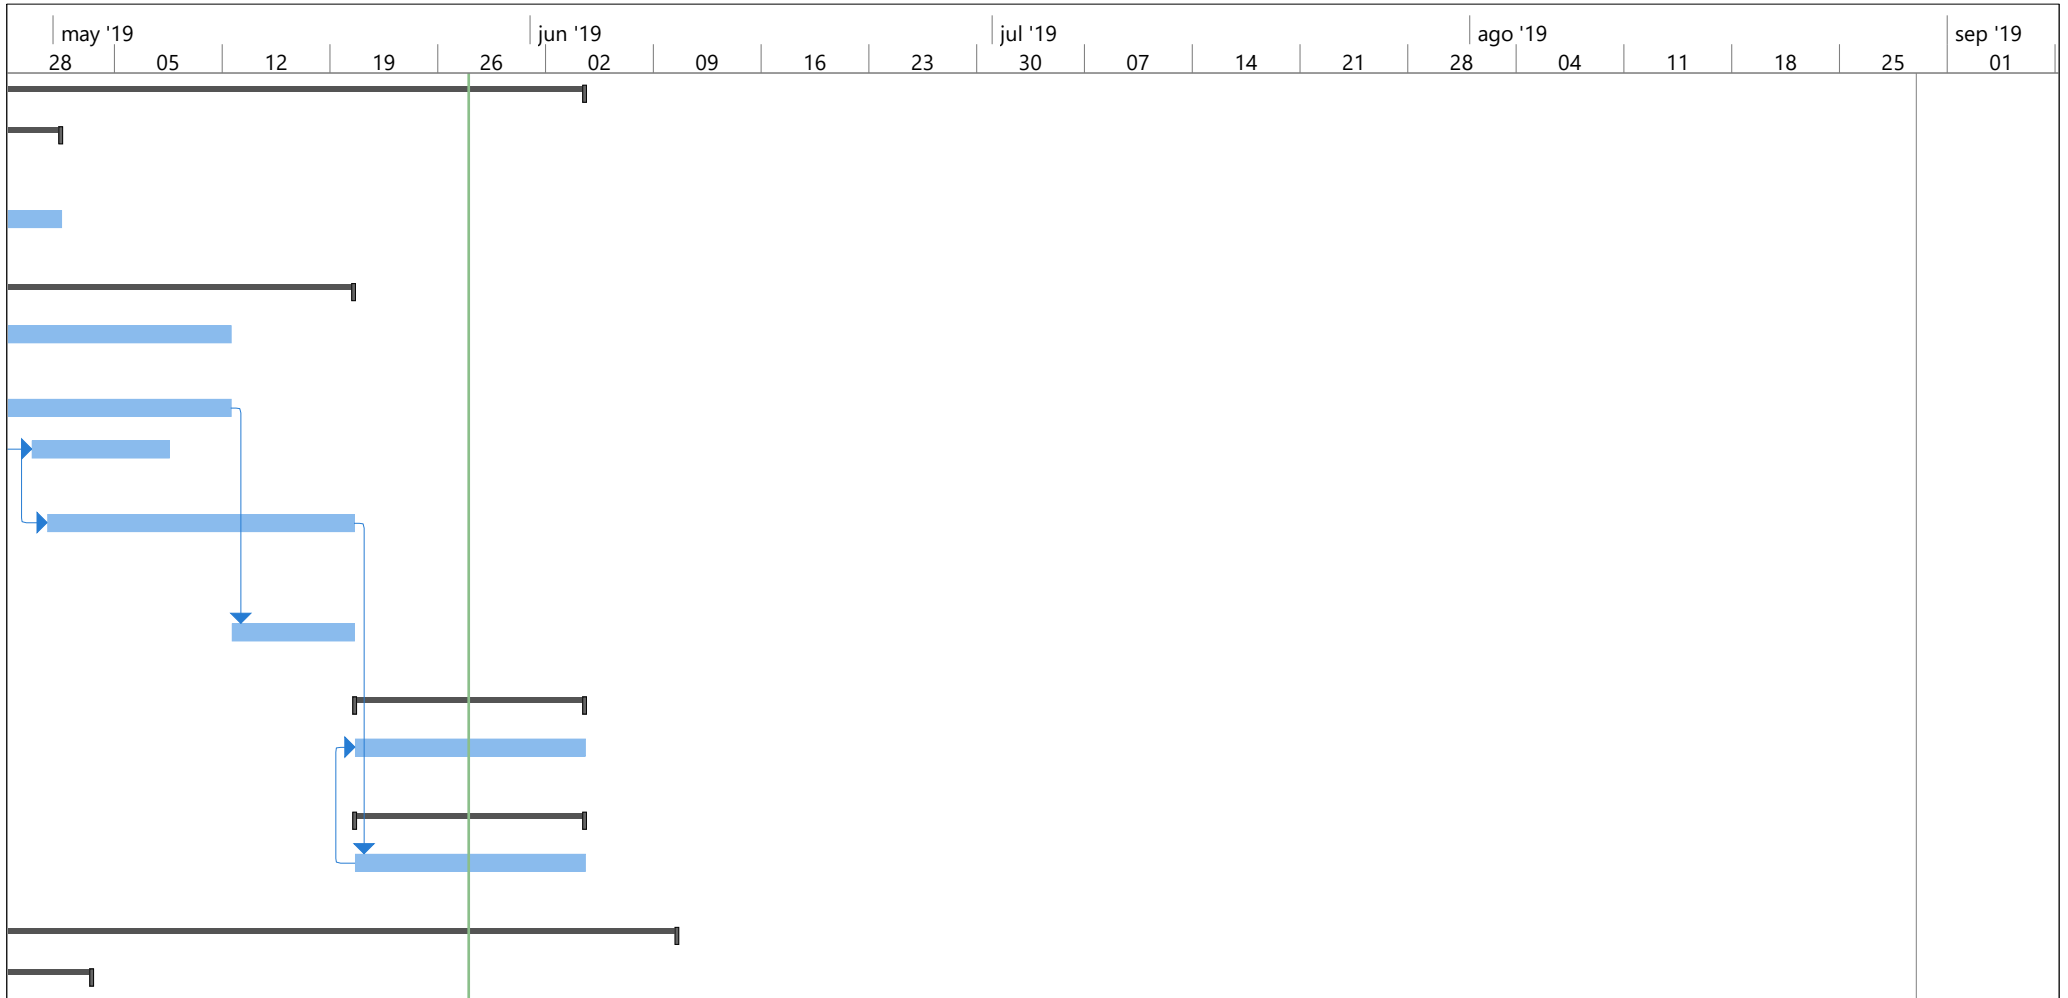


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

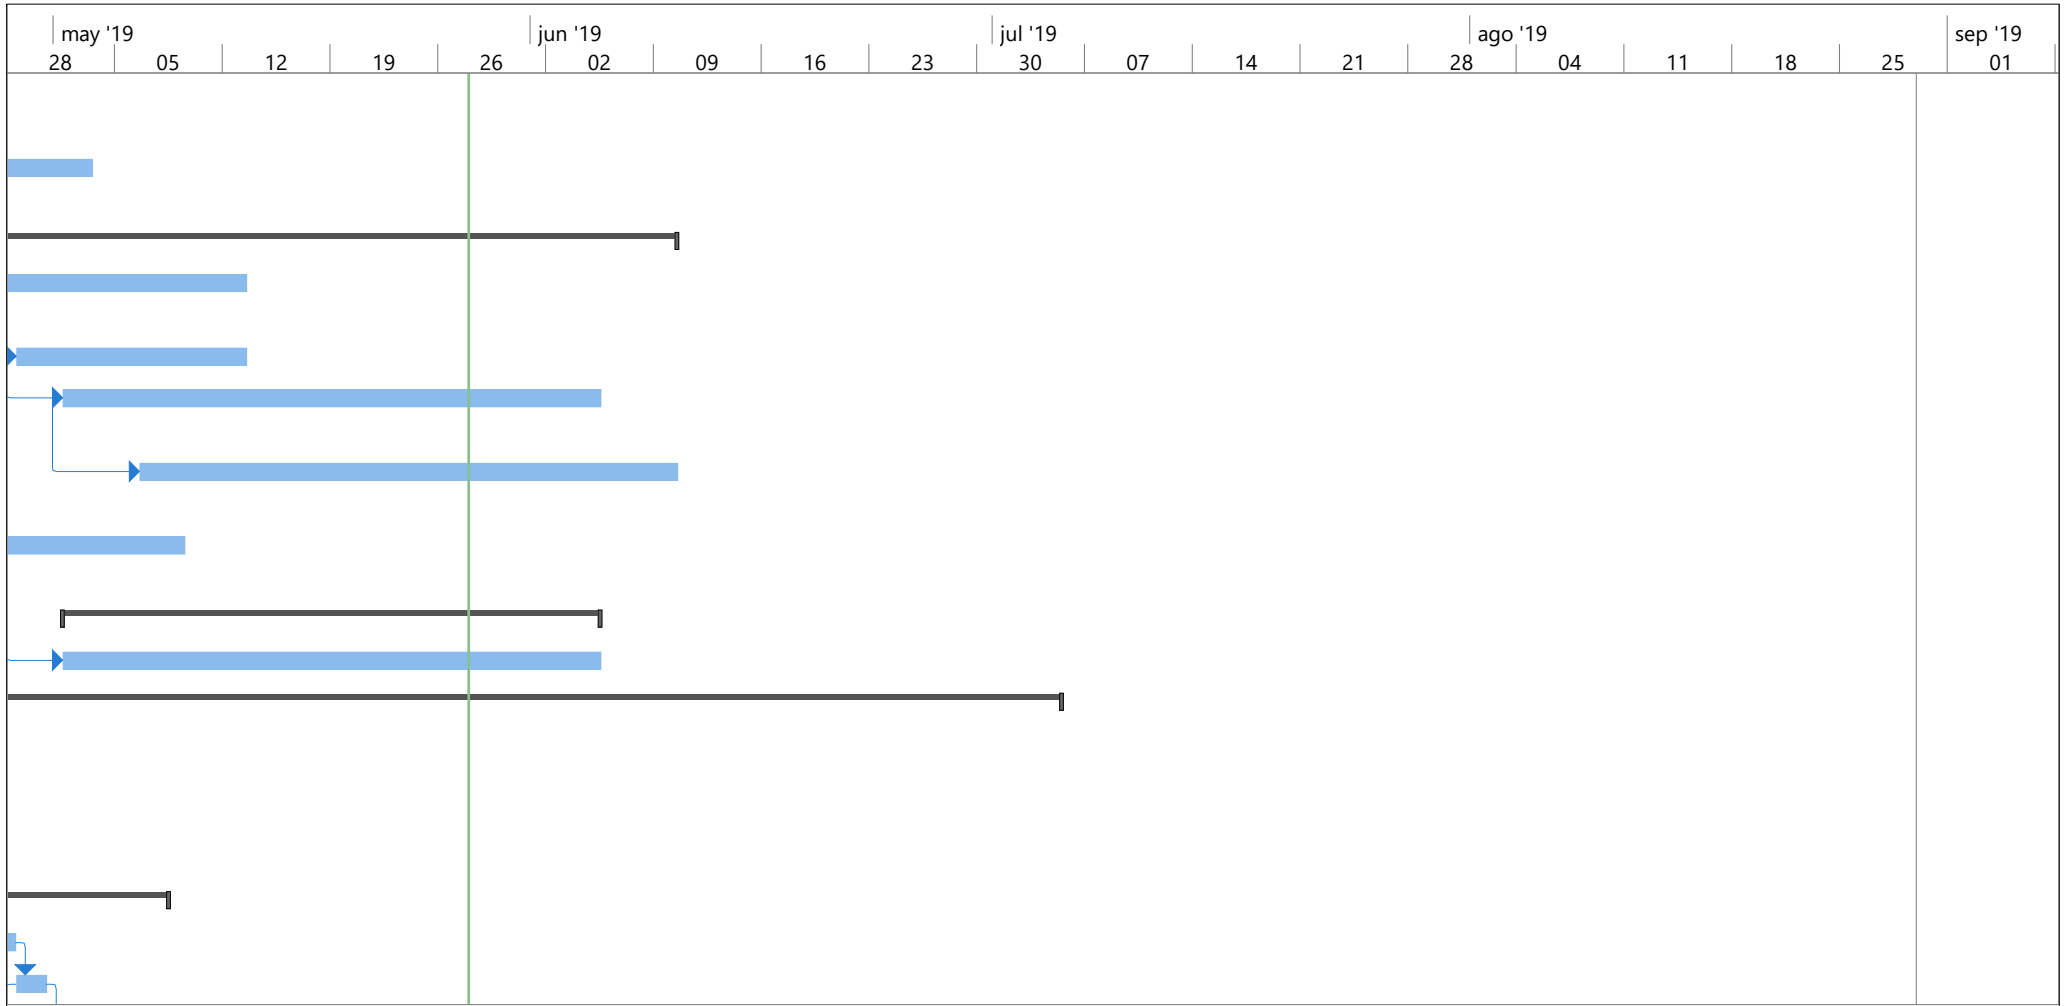

Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

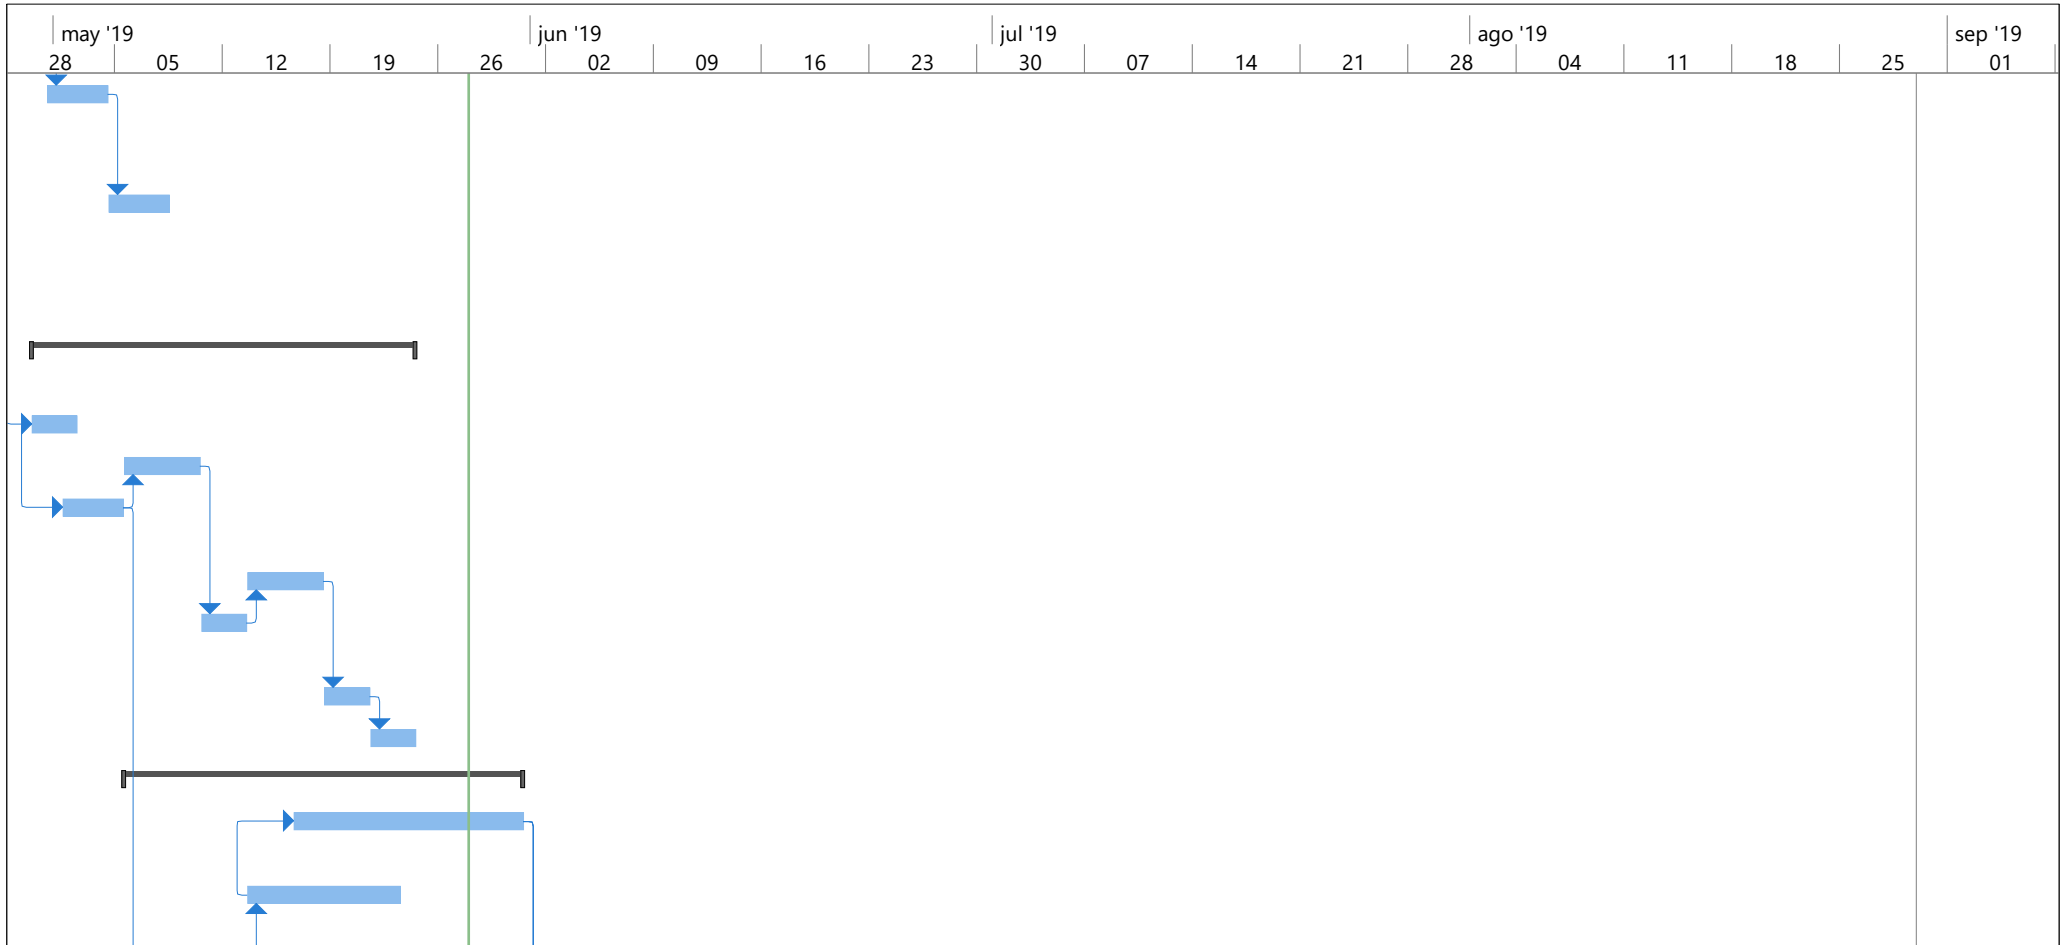


Proyecto: PTO CURA1.mpp Fecha: mar 28/05/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

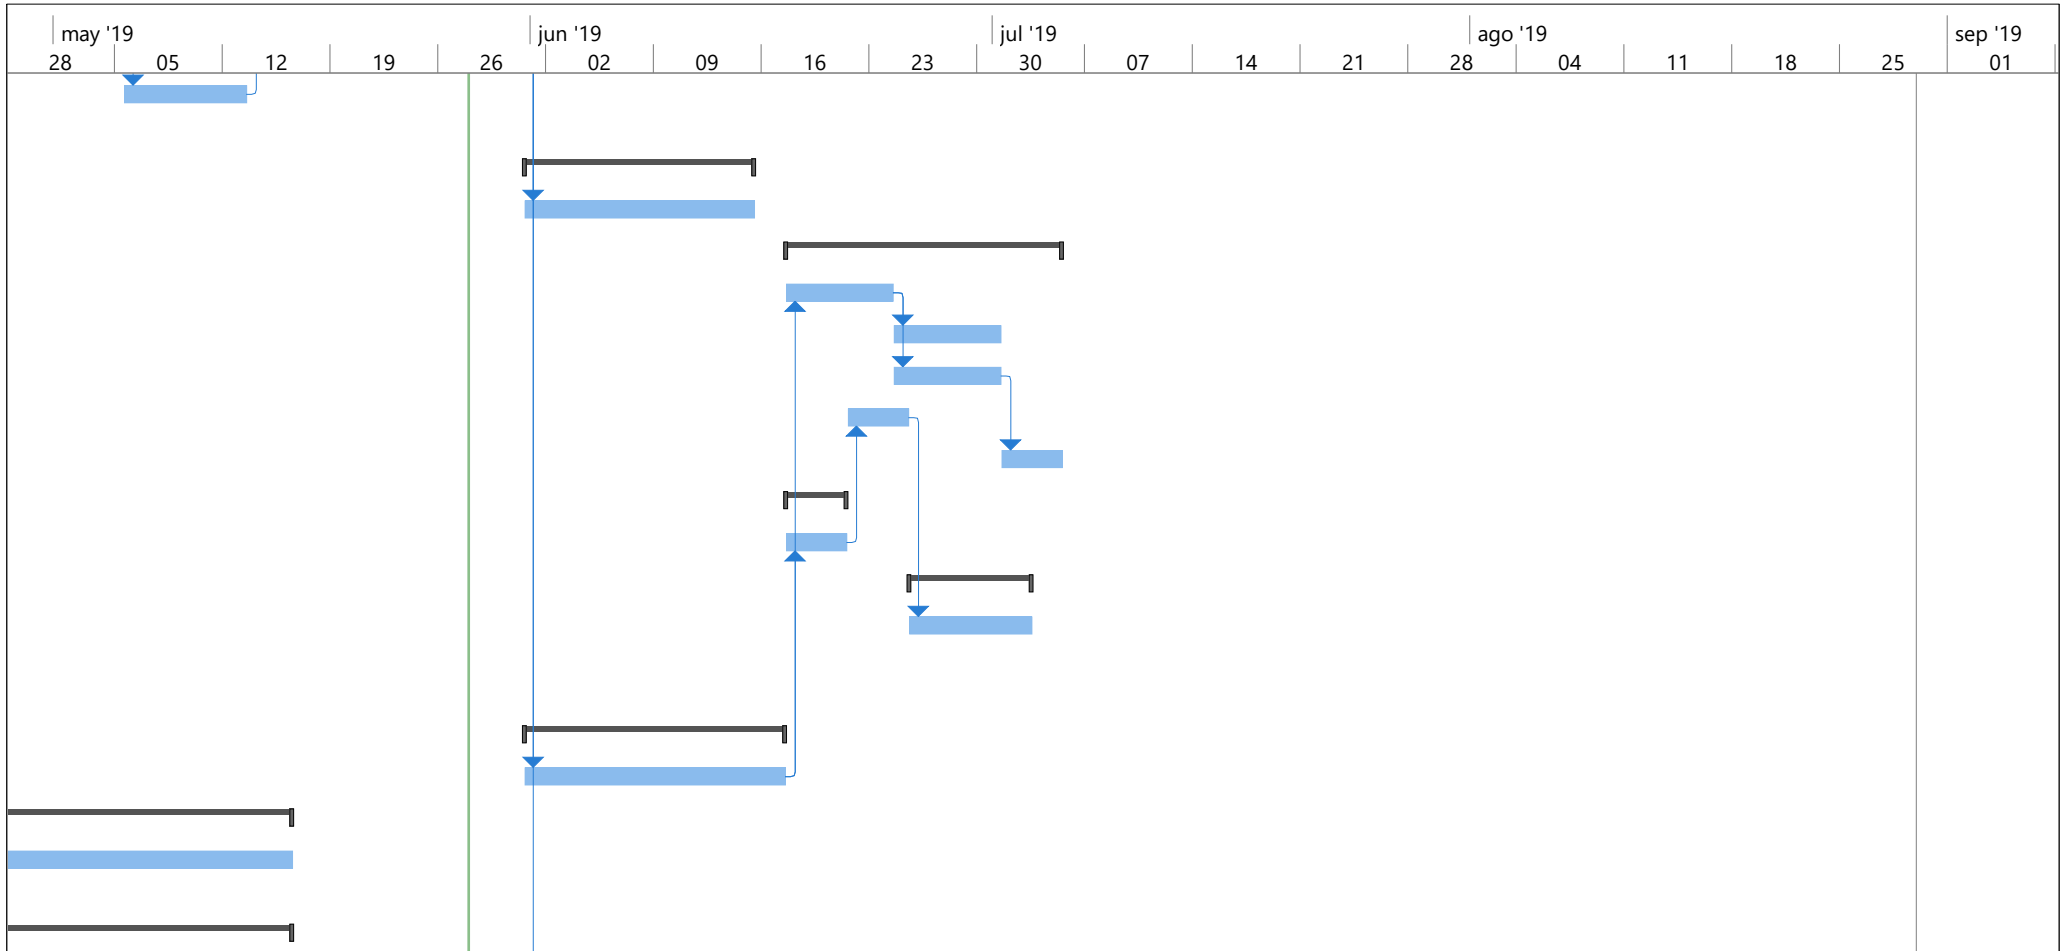


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

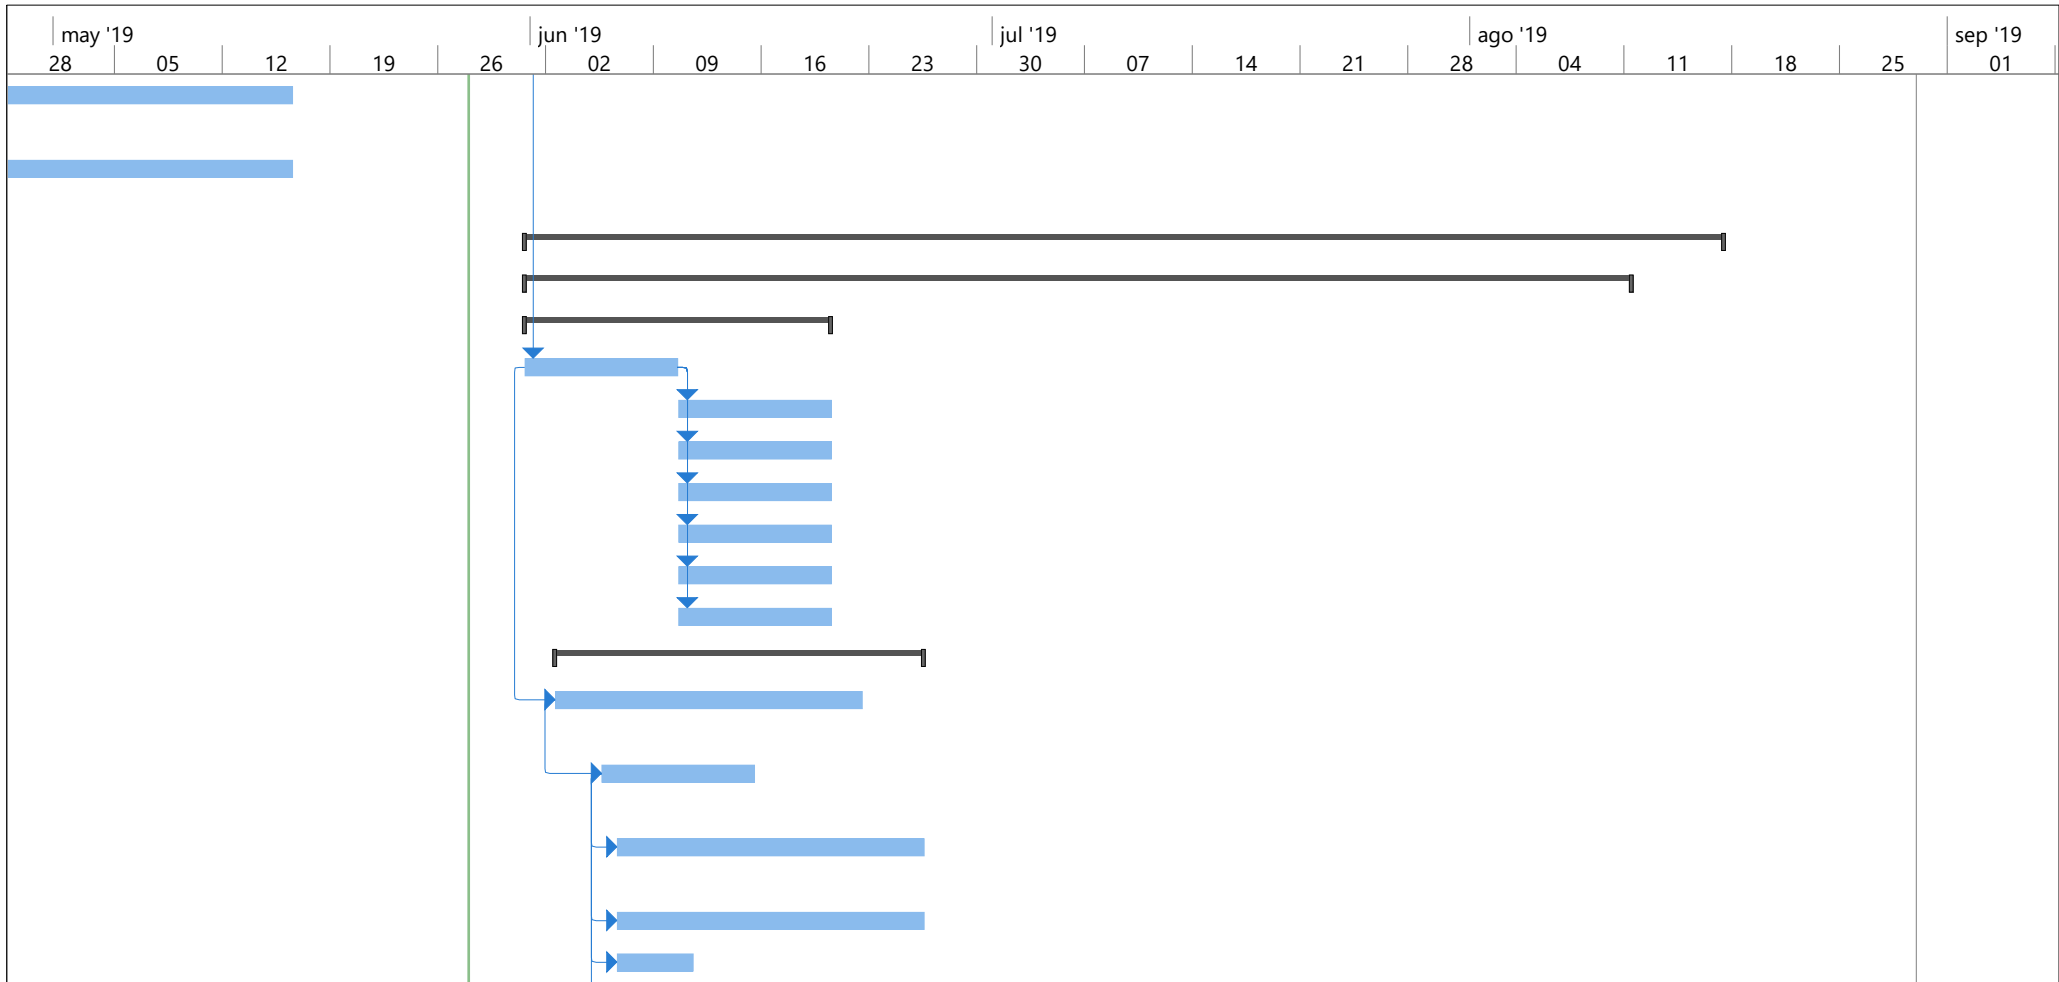


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

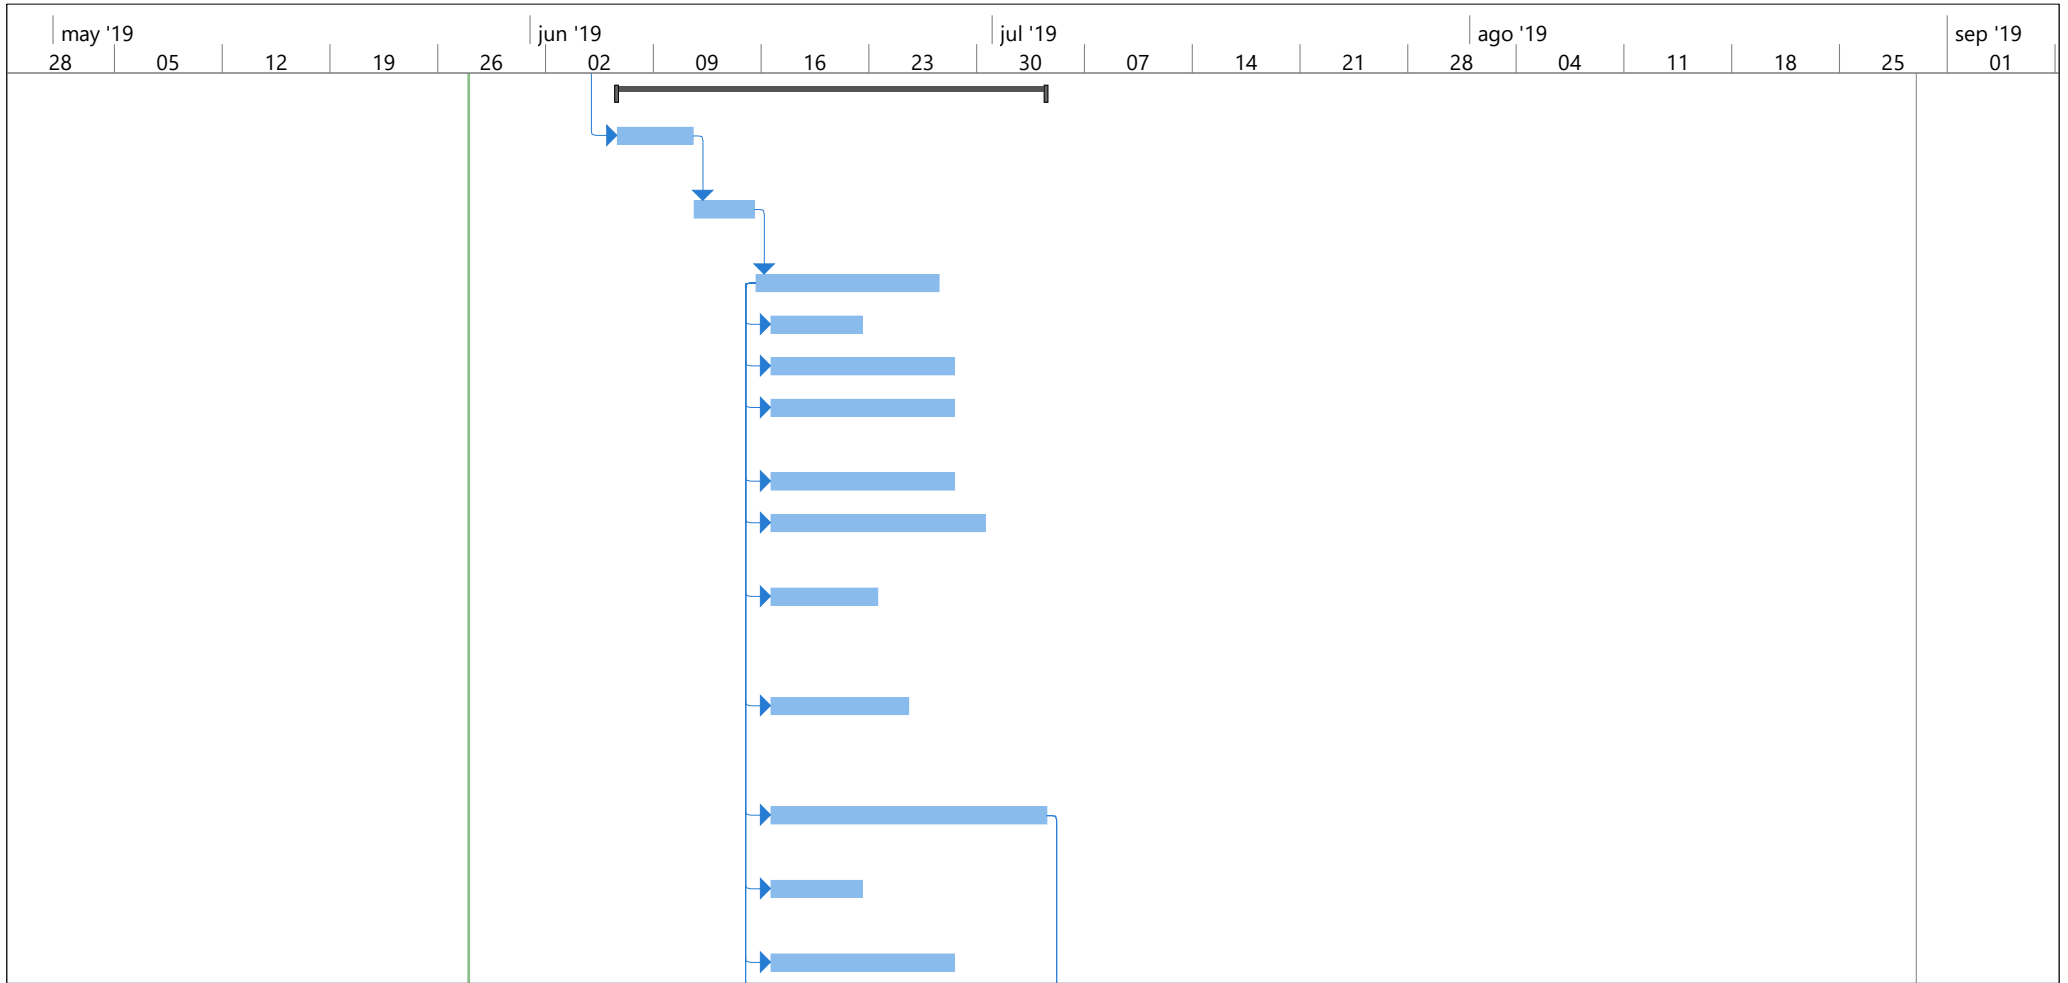


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

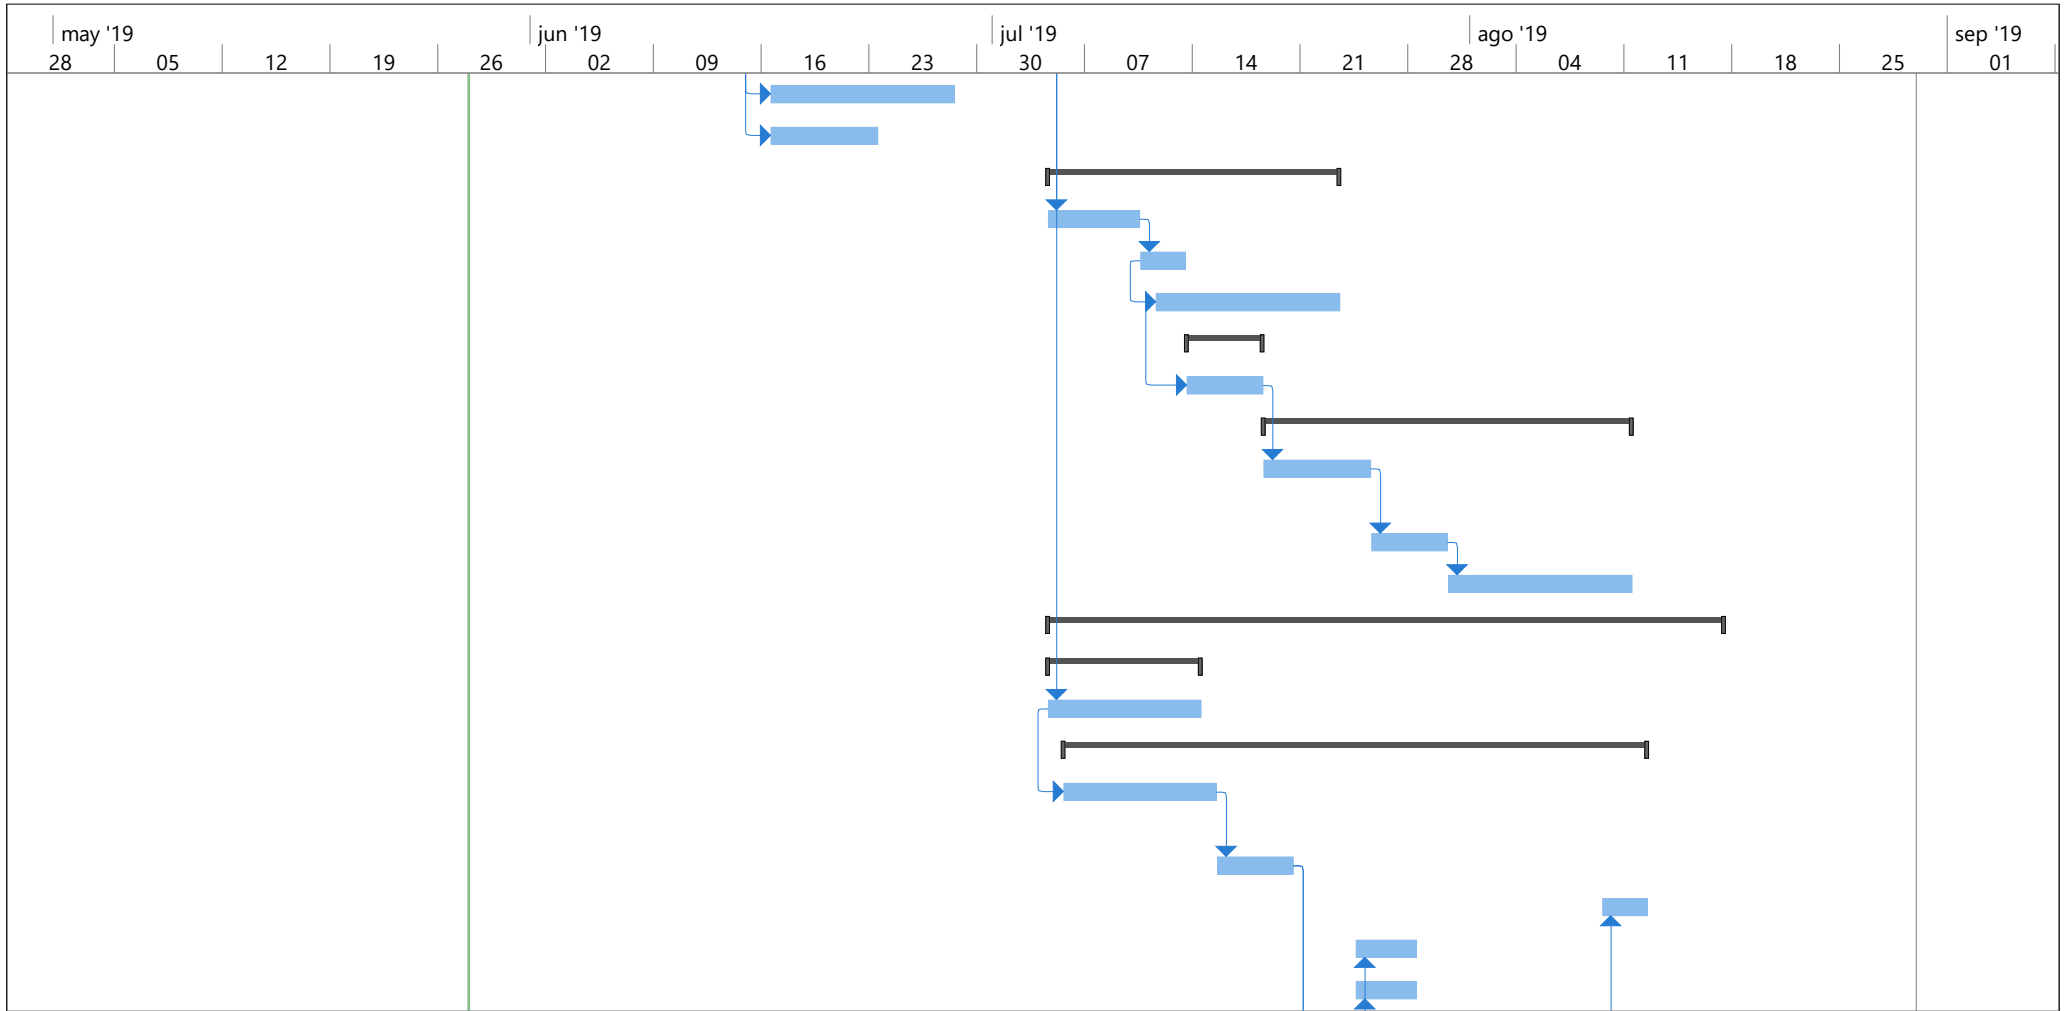


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

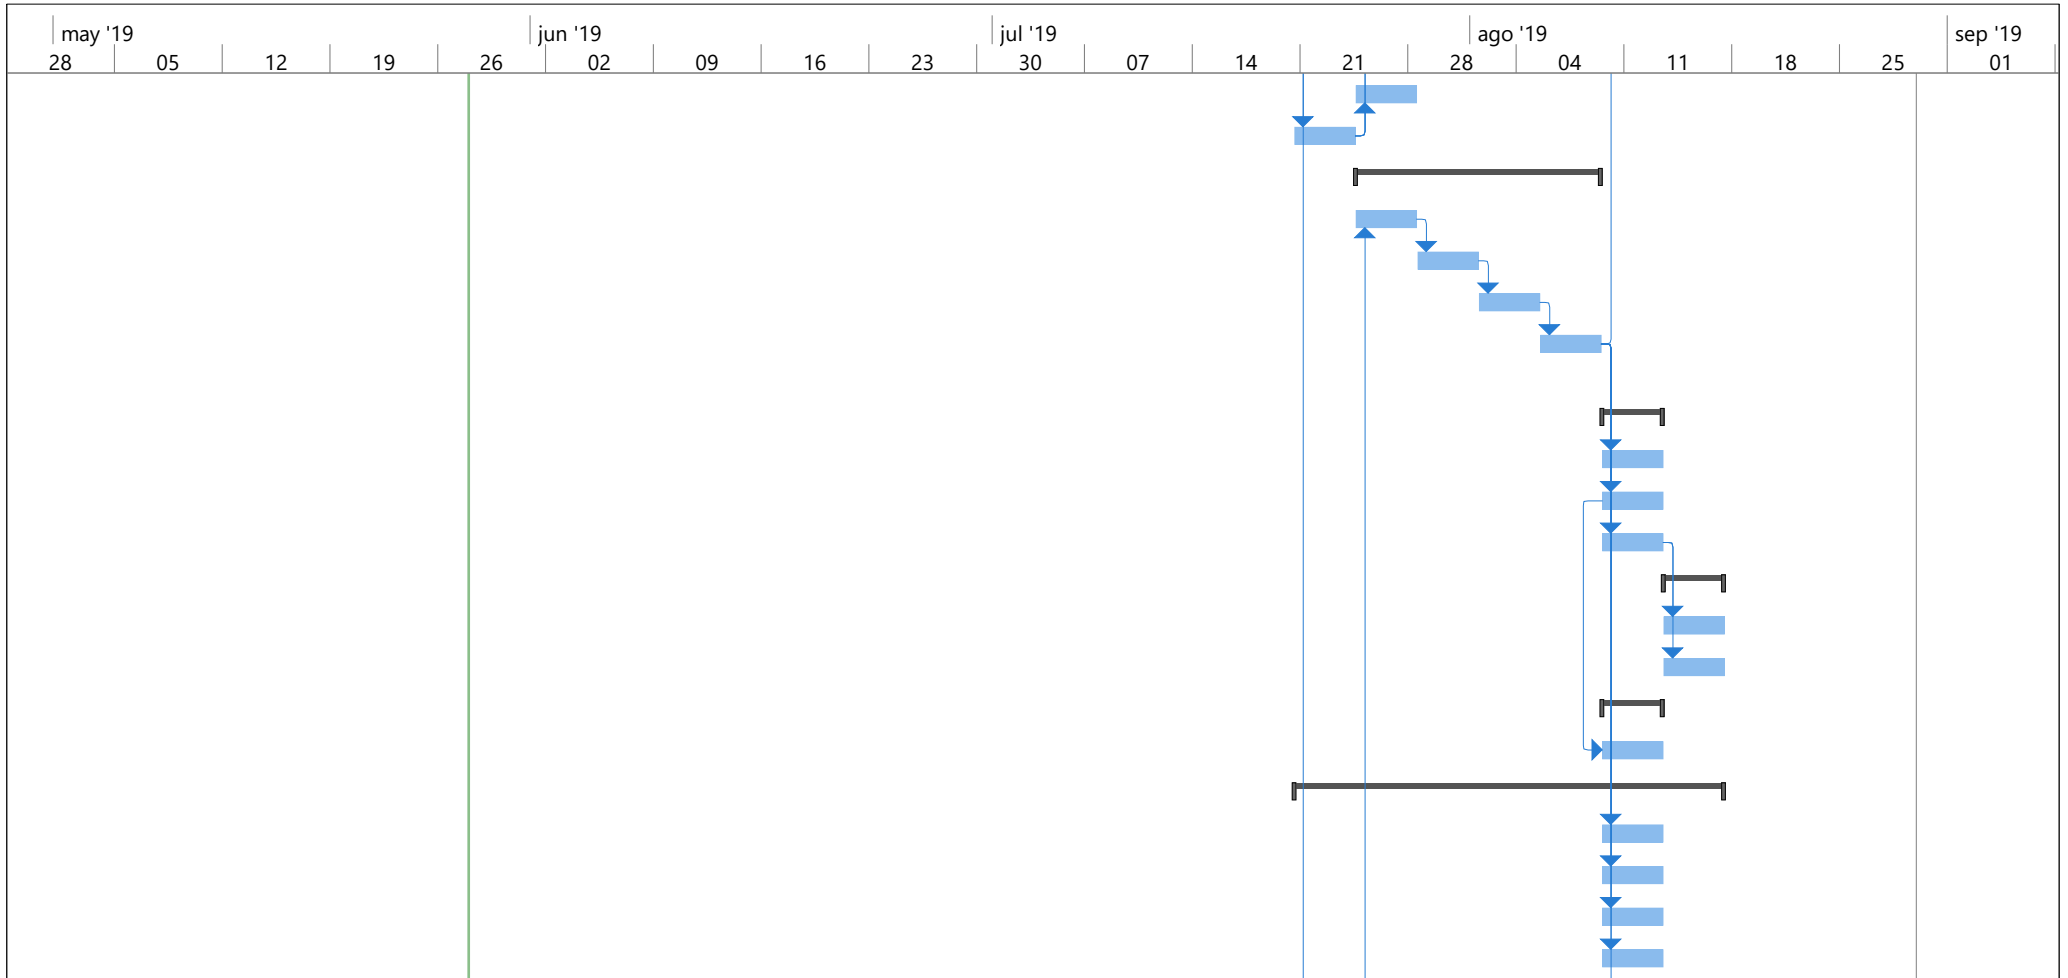


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

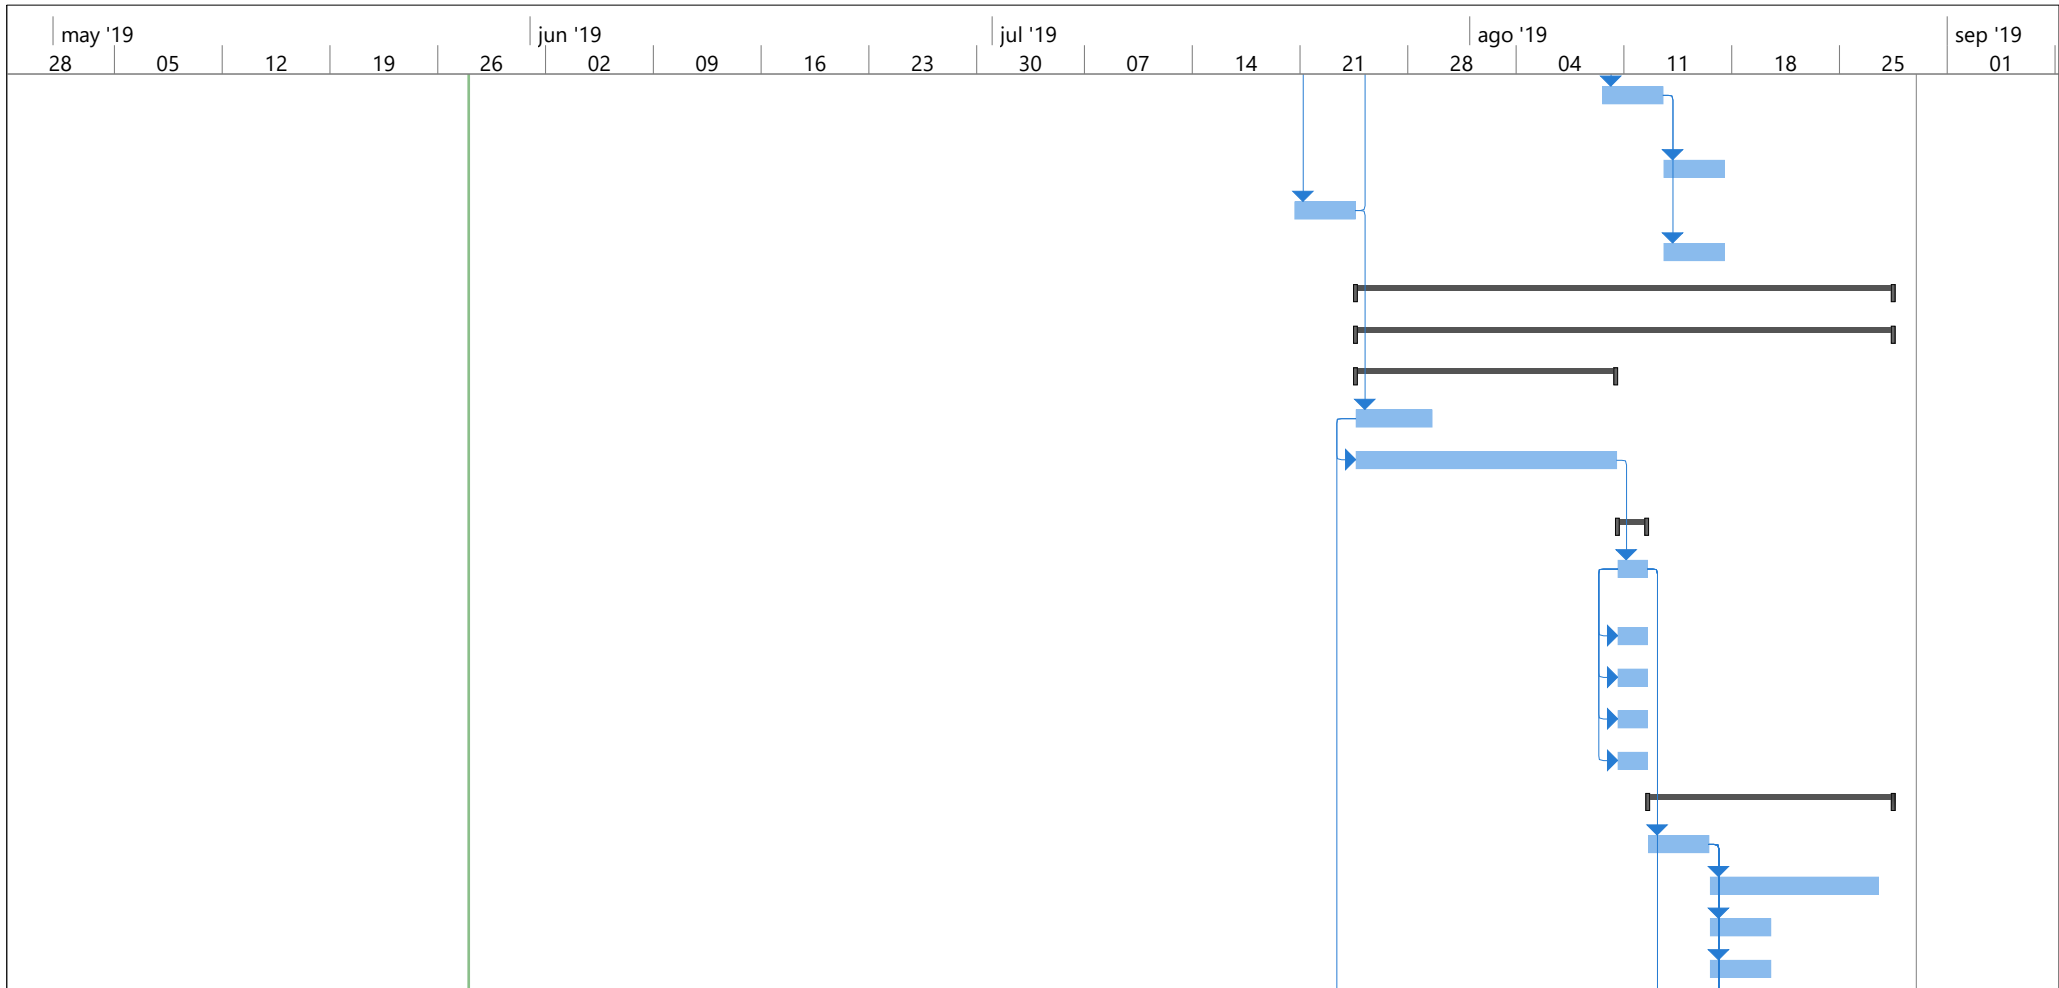


Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

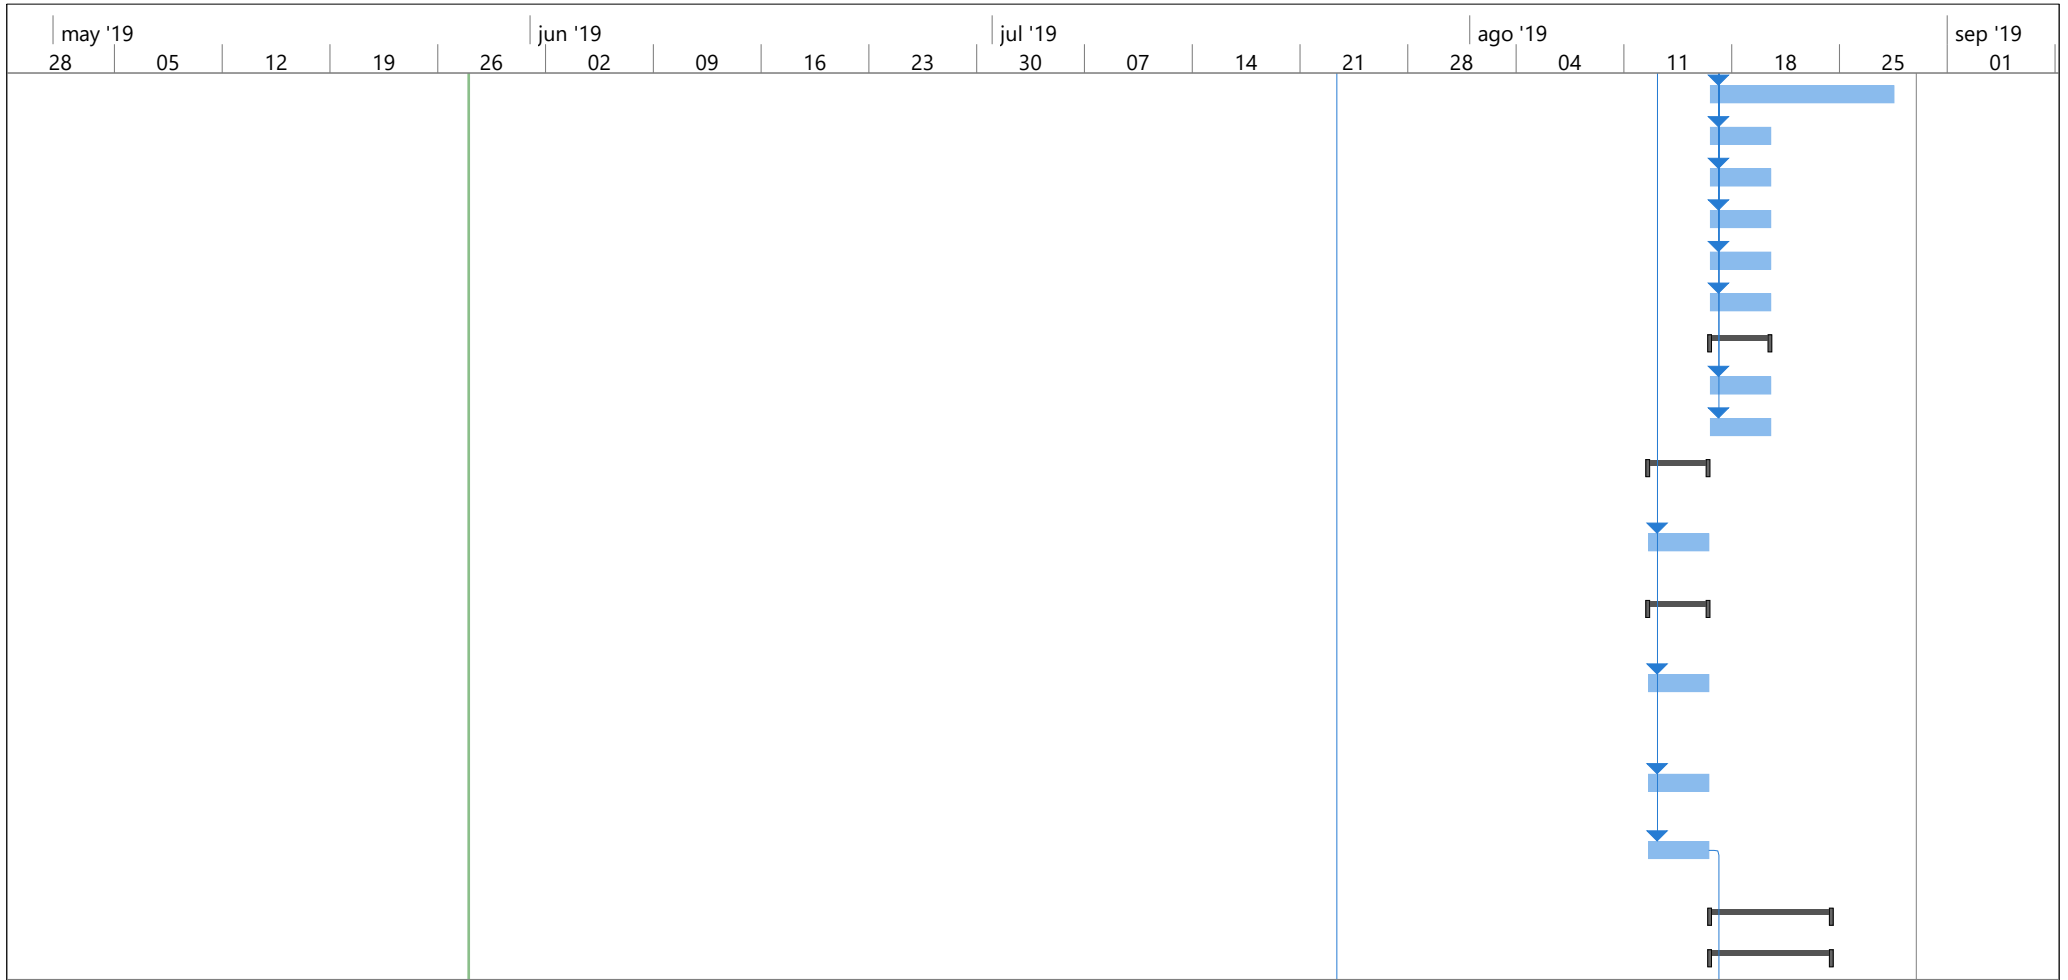

Proyecto: PTO CURA1.mpp Fecha: mar 28/05/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

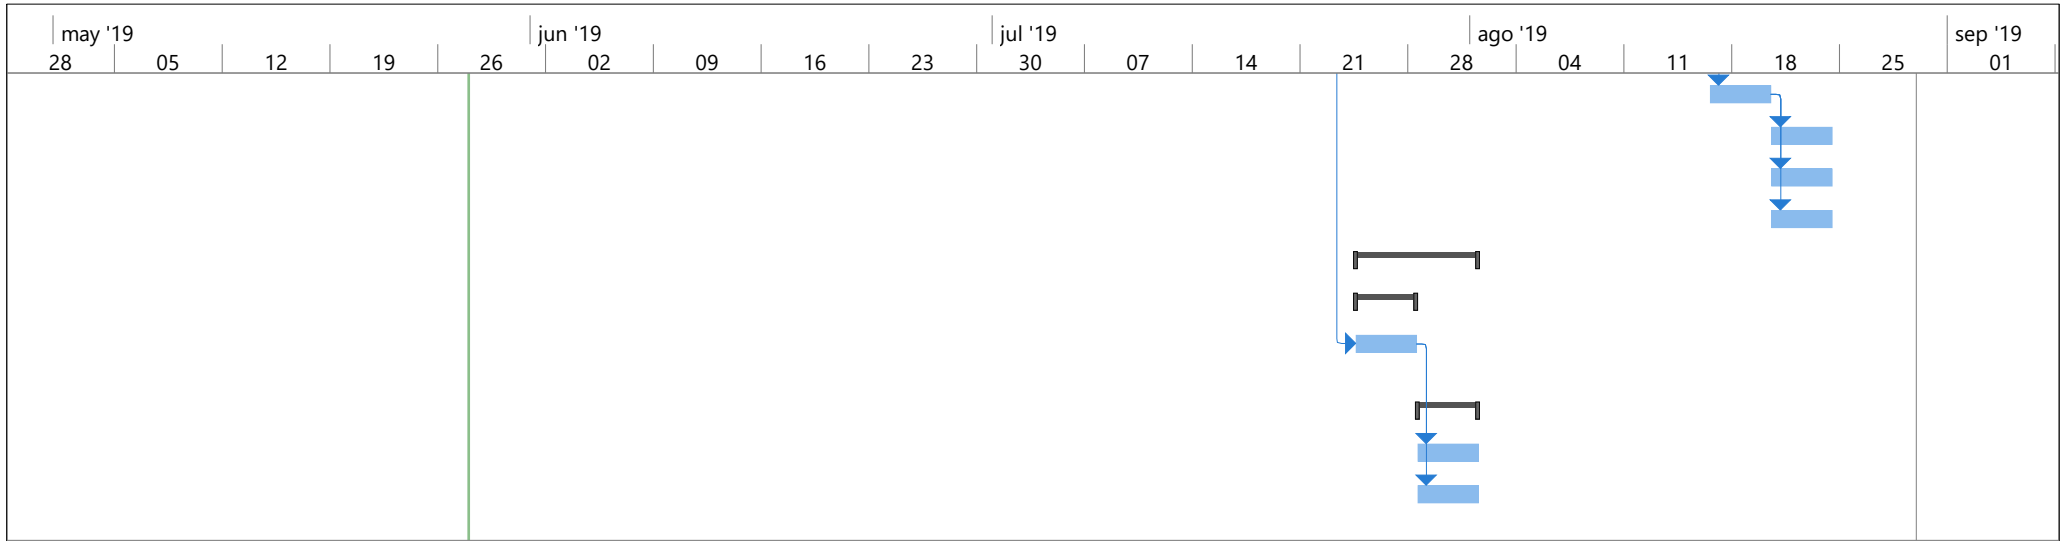

Proyecto: PTO CURA1.mpp
 Fecha: mar 28/05/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
