



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

14

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Tumbes,

30 MAR 2016

INFORME N° 002 -2016/GOB. REG.TUMBES-CRAE



SEÑOR : Ing. Enriquè Carrasco Palomino  
Sub Gerente de Recursos Naturales.

ASUNTO : INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

REF. : a) RGR N° 000740-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR  
b) Actividad por Emergencia "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Departamento de Tumbes"

Tenemos a bien dirigirnos a Usted, para expresar nuestro cordial saludo y en calidad de miembros del Comité de Recepción de la Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Departamento de Tumbes", designado mediante documento de la referencia a), alcanzamos adjunto al presente, el Informe Final de Liquidación, en cumplimiento al Art. 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, para su aprobación con acto resolutivo.

Adjunto los siguientes documentos:

- ❖ Acta de Recepción de Actividad por Emergencia.
- ❖ Copia Fedateada de Resolución Gerencial Regional de Designación del Comité de Recepción de Actividad por Emergencia.
- ❖ Copia Fedateada de Resolución Gerencial Regional de Fe de Erratas.
- ❖ Copias Fedateadas de Comprobantes de Pago.
- ❖ Asientos del Cuaderno de Obra.
- ❖ Copia Fedateada de Carta de Designación de Supervisor de Actividad por Emergencia.
- ❖ Copia de Contrato de Servicio N° 27-2015-GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA.
- ❖ Copia Fedateada de Acuerdo de Consejo Regional N° 116-2015/GRT-CR-CD.
- ❖ Copia Fedateada de Resolución Gerencial Regional de Aprobación del Expediente Técnico y Presupuesto Analítico.
- ❖ Copia Fedateada de Expediente Técnico.

Es cuanto informamos a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

Wilmer Aguirre Aguirre  
INGENIERO AGRICOLA  
Reg. CIP N° 43579

Enriquè Carrasco Palomino  
ING. AGRICOLA  
REG. V 195718

KENIO C. ROEM  
SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.  
Jorge Córdova Córdova  
GERENTE



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Departamento de Tumbes". (RGR N° 0040-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

VALOR REFERENCIAL :

Obra por contrata (Incluido IGV y Gastos Generales)	S/. 66,101.00
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	S/. 10,985.00
<b>Total</b>	<b>S/. 77,086.00</b>

Son: SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS Con 00/100 Nuevos Soles.

MONTO EJECUTADO :

Obra por contrata (Incluido IGV y Gastos Generales)	S/. 66,050.00
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	S/. 10,985.00
<b>Total</b>	<b>S/. 77,035.00</b>

Son: SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO Con 00/100 Nuevos Soles.

PLAZO DE EJECUCIÓN :

30 Días Calendarios.

UBICACIÓN :

Dpto. : Tumbes.  
 Provincia : Tumbes.  
 Distrito : Zorritos.  
 Sector : Quebrada Alcantarilla Norte - Acapulco.

CONTIENE :

- 1- Datos Generales.
- 2- Resumen Final.
- 3- Autorizado y Pagado.
- 4- Resumen Analítico Ejecutado.
- 5- Cuadro de Pagos Ejecutado por Especifica de Gasto.
- 6- Memoria Descriptiva.

*[Signature]*  
 Wilmer Alberto Rojas Aguirre  
 INGENIERO AGRONOMO  
 REG. N° 162712

*[Signature]*  
 Marco Antonio Sandoval Córdova  
 INC. KEXIO & ROEM  
 REG. N° 162712

KEXIO & ROEM  
 SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.  
 José O. Sandoval Córdova  
 GERENTE



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

1.- DATOS GENERALES

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar – Departamento de Tumbes".(RGR N° 0040-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

MODALIDAD : Por Contrata a Precios Unitarios.  
(CONTRATO DE SERVICIO N° 27-2015-GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA).

FTE. FTO. : 1 Recursos Ordinarios.

VALOR REFERENCIAL : S/. 77,086.00.

PLAZO DE EJECUCION : 30 Días Calendarios.

INICIO DE PROYECTO : 25 de Diciembre de 2015.

TERMINO DEL PROYECTO : 23 de Enero de 2016.

RESIDENTE DE LA EMPRESA : Ing. Luis Palacios Ruesta.

SUPERVISOR DE LA ENTIDAD : Ing. Marco Antonio Saldarriaga Mendoza.  
(CARTA N° 010-2015/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

*W. Rojas*  
Wilmerberto Rojas Agurto  
INGENIERO AGRICOLA  
REG. N° 12571

*Marco A. Saldarriaga*  
Marco Antonio Saldarriaga Mendoza  
ING. ECONOMO  
REG. N° 12571

KEXIO & ROEM  
SERVICIOS GENERALES S C R L.  
Jose O. Sandoval Córdova  
GERENTE

71

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
 GOBIERNO REGIONAL DE GRNNGMA  
 EFA J. M. S. S. S.  
 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE  
 ASUNTO: [ ]  
 TUMBES

FECHA: 17/03

FIRMA Y SELLO:

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

2.- RESUMEN FINAL

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Departamento de Tumbes". (RGR N° 0040-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

MODALIDAD : Por Contrata a Precios Unitarios.  
(CONTRATO DE SERVICIO N° 27-2015-GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA).

FTE. FTO. : 1 Recursos Ordinarios.

01.00 AUTORIZADO Y PAGADO

01.01 AUTORIZADO : S/. 77,086.00

01.02 PAGADO : S/. 77,035.00  
.....

SALDO A FAVOR : S/. 51.00

*[Signature]*  
Wilver Alberto Rojas Agurto  
INGENIERO AGRONOMO  
REG. N° 105718

*[Signature]*  
Hector Antonio Parviziño Mendosa  
ING. AGRONOMO  
REG. N° 105718

*[Signature]*  
KEXIO & ROEM  
SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.  
José O. Sandoval Córdova  
GERENTE



LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

3.- AUTORIZADO Y PAGADO

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Departamento de Tumbes". (RGR N° 0040-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

MODALIDAD : Por Contrata a Precios Unitarios.  
(CONTRATO DE SERVICIO N° 27-2015-GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA).

FTE. FTO. : 1 Recursos Ordinarios.

01.00 AUTORIZADO Y PAGADO

01.01 AUTORIZADO S/. 77,086.00

2.3.2.7.11.99	GASTOS DIVERSOS	
	Costos Directos	66,101.00
	Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	10,985.00
	TOTAL S/.	77,086.00

01.02 PAGADO S/. 77,035.00

2.3.2.7.11.99	GASTOS DIVERSOS	
	Costos Directos	66,050.00
	Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	10,985.00
	TOTAL S/.	77,035.00

*Handwritten signature and stamp*

SALDO ..... S/. 51.00

Wilver Alberto Rojas Aguirre  
INGENIERO AGRONOMO  
Reg. CIP N° 12350

*Handwritten signature*  
Marta Anabela Salazar de Mendez  
ING. AGRONOMA  
REG. N° 168710

KEXIO & ROEM  
SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.  
José O. Sandoval Córdova  
GERENTE



09

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

4.- RESUMEN ANALITICO EJECUTADO

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Departamento de Tumbes". (RGR N° 0040-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

MODALIDAD : Por Contrata a Precios Unitarios.  
(CONTRATO DE SERVICIO N° 27-2015-  
GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA).

FTE. FTO. : 1 Recursos Ordinarios.

ESPECIFICA DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	SALDO S/.
2.3.2.7.11.99	GASTOS DIVERSOS			
	Costos Directos	66,101.00	66,050.00	51.00
	Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	10,985.00	10,985.00	00.00
	TOTAL	77,086.00	77,035.00	51.00

Walter Alberto Rojas Agurto  
INGENIERO AGRÓNOMO  
REG. N° 126713

María Antonia Sandoval  
ING. AGRÓNOMA  
REG. N° 126713

KEXIO S. ROEM  
SERVICIOS GENERALES S. R. L.  
José O. Sandoval Cordova  
GERENTE



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

5 - CUADRO DE GASTOS EJECUTADO POR ESPECÍFICA DE GASTO

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar -  
 Departamento De Tumbes", RGR N° 0040-2014/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GRI,  
 ESPECÍFICA DE GASTO 2.3.2.7.11.99: Gastos Diversos/Costos Directos

CORRELATIVA	STAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE SERVICIO/OTROS		COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	IMPORTE GIRADO S/.
		N°	FECHA	N°	FECHA			
0198	0010643	07373	----	9156	10.02.16	BANCO DE LA NACION/ KEXIO & ROEM SERVICIOS GENERALES S.C.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 10% DE LA FACTURA N° 0001-0000820, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAUCE DE LA QUEBRADA ALCANTARILLA DEL CENTRO POBLADO DE ACAPULCO DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONT. VILLAR DPTO TUMBES.	6,605.00
0198	0010643	07373	----	9158	10.02.16	KEXIO & ROEM SERVICIOS GENERALES S.C.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 7973 DE LA FACTURA N° 0001-000820, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAUCE DE LA QUEBRADA ALCANTARILLA DEL CENTRO POBLADO DE ACAPULCO DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONT. VILLAR DPTO TUMBES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO N° 027-2015/GOB.REG.TUMBES-668-ORA-OLSA.	52,840.00
0198	0010680	07377	----	9201	29.02.16	INTERMIX S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DEVOLUCION DEL 10% DE FONDO DE GARANTIA DE FEEL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO N° 050- 2016/GR-668-ORSA, DE LA FACTURA N° 0001-000820, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAUCE DE LA QUEBRADA ALCANTARILLA DEL CENTRO POBLADO DE ACAPULCO DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONT. VILLAR DPTO TUMBES	6,605.00
TOTAL S/.								66,050.00

*[Signature]*  
 VICERRECTOR GENERAL AGUSTO  
 RUC: 20101000000  
 Reg. CIP N° 0. 559

*[Signature]*  
 JEFE DE OFICINA GENERAL AGUSTO  
 RUC: 20101000000  
 Reg. CIP N° 0. 10111

KEXIO & ROEM  
 SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.  
 JORGE O. SANDOVAL CORDOVA  
 GERENTE



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

5.- CUADRO DE GASTOS EJECUTADO POR ESPECÍFICA DE GASTO

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Departamento De Tumbes", (RCR N° 0040-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GRI).

ESPECIFICA DE GASTO 2.3.2.7.11.99: Gastos Diversos/ Gastos de Elaboración de Expediente Técnico

CORRELATIVA	SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE SERVICIO/OTROS		COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	IMPORTE GIRADO S/.
		N°	FECHA	N°	FECHA			
0198	0010643	07377	----	9160	100216	KEXIO & ROEM SERVICIOS GENERALES S.C.R.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S N° 7377 DE LA FACTURA N° 0001-000819 POR EL SERVICIO DE ESPECIALIZACION EN AGRONOMIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO DE CAUCE DE LA QUEBRADA ALCANTARILLA NORTE DEL CENTRO POBLADO DE ACAPULCO DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE TUMBES SEGUN CARTA N° 003-2015/KAR SG SORL.	9.886.50
0198	0010663	07377	----	9159	100216	BANCO DE LA NACION/ KEXIO & ROEM SERVICIOS GENERALES S.C.R.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DEDUCCION DEL 10% DE LA FACTURA N° 0001-000819 DE LA O/S N° 07377 POR EL SERVICIO DE ESPECIALIZACION EN AGRONOMIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO DE CAUCE DE LA QUEBRADA ALCANTARILLA NORTE DEL CENTRO POBLADO DE ACAPULCO DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONT. VILLAR DPTO TUMBES SEGUN CARTA N° 003-2015/KAR SG SORL.	1.098.50
<b>TOTAL S/.</b>								<b>10.985.00</b>

VERIFICACION EN EL AREA DE ARCHIVO  
 DIRECTOR GENERAL DE ARCHIVO  
 N° 0198/2016

MANEJO ADMINISTRATIVO  
 INMEDIATA  
 REG. N° 104719

KEXIO & ROEM  
 SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.  
 JOSÉ O. SANCHEZ CORDOVA  
 GERENTE

40





06

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

6.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Departamento de Tumbes".(RGR N° 0040-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Esta actividad se ha elaborado ante la necesidad que tienen los moradores y Pescadores del Sector de Acapulco, los cuales se ven afectados por la quebrada del sector de Alcantarilla Norte, ubicada a lo largo de las viviendas asentadas a ambas márgenes de dicha quebrada de este sector y que en la actualidad se encuentra colmatada por malezas y sedimentos que son acarreados de las partes altas, además existe un alto nivel de tala. Todos estos problemas de origen antrópico destruyen la cobertura vegetal y la superficie queda expuesta a la erosión causada por las constantes precipitaciones. Así mismo cada vez que está quebrada se activa por efectos de la lluvia, se desborda, causando aislando de algunos pobladores, e inundando las viviendas causando daño a la infraestructura de la población del sector.

Con la presencia de El Fenómeno el Niño, anunciado, para este año por el EFEN, con INFORME TECNICO SENAMHI-ENFEN N° 017-2015, los daños serían de mucha importancia puesto que, el desborde de la quebrada trae consigo una serie de problemas sanitarios directa e indirectamente. Como es la presencia del estancamiento de las aguas origina la proliferación de vectores de enfermedades metaxénicas como el Dengue, la Malaria y la Chikungunya, poniendo en riesgo a la población vulnerable de este sector.

6.2 OBJETIVO

Mantenimiento del cauce de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, a través de la descolmatación y conformación de talud.

6.3 METAS

Mantenimiento y conformación de talud de 360.44 m longitudinales, a través de la descolmatación con retroexcavadora, en la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco.

6.4 PRESUPUESTO GASTADO

Obra por contrata (Incluido IGV y Gastos generales)	S/. 66,050.00
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	S/. 10,985.00
Total	S/. 77,035.00

Son: (Setenta Y Siete Mil Treinta Y Cinco Con 00/100 Nuevos Soles).

*[Handwritten signature]*  
WILMA...  
INGENIERO AMBIENTAL

*[Handwritten signature]*  
Marta...  
INGENIERO

KEXIO & ROEM  
SERVICIOS GENERALES S.C.A.L.  
José O. Sandoval Córdova  
GERENTE



05

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

6.5 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Por Contrata a Precios Unitarios.

6.6 PLAZO DE EJECUCIÓN

Treinta (30) días calendarios.


6.7 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA


La actividad se desarrollará en el ámbito de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, del Distrito de Contralmirante Villar y consiste en el desarrollo físico de las metas descritas líneas arriba teniendo en consideración los objetivos estratégicos contemplados en la respectiva actividad, para ello se tendrán en cuenta una serie de acciones programadas y de esta manera darle el mantenimiento respectivo del cauce de dicha Quebrada, para prevenir los daños por inundación.

Asimismo debemos describir de una manera sucinta que la actividad consiste en realizar el mantenimiento a través de la descolmatación de dicha quebrada, donde se utilizara maquinaria pesada como excavadora de oruga.

En ese sentido la ejecución del proyecto se desarrollará de la siguiente manera:

- Trazo y Replanteo: Consiste en trazar el lugar donde se ejecutara la descolmatación y conformación de talud, se tendrá en cuenta la longitud y el ancho de intervención según manda metrados. Para lo cual se tizara con yeso.
- Descolmatación y Conformación de Talud: Esta actividad se realizara con la utilización de una excavadora con oruga ubicándose en una margen de la quebrada, y extrayendo el material del cauce de la quebrada y colocándolo en ambas márgenes al mismo tiempo que se conformara el talud con el mismo material extraído.

  
Wilmer Alberto Rojas Agurto  
INGENIERO AGRÓNOMO  
REG. CIP N.º 15574

  
Marco Antonio Carriliga Mendonza  
ING. AGRÓNOMO  
REG. N.º 188718

  
KEXIO & ROEM  
SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.  
José O. Sandoval Córdova  
GERENTE




04


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

6.8 AVANCE FÍSICO DE LA ACTIVIDAD

PART.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			AVANCE POR PARTIDA	
		UNID.	METRADO	%	METRADO	%
01	OBRAS PROVISIONALES			100.00		100.00
01.01	Suministro y Colocación de Identificación de Obra	Unid.	1.00	100.00	1.00	100.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES			100.00		100.00
02.01	Trazo, Nivelación y Replanteo	MI	360.44	100.00	360.44	50.00
02.02	Movilización y Desmovilización de Equipos	Global	1.00	100.00	1.00	50.00
03	MOVIMIENTOS DE OBRA			100.00		100.00
03.01	Descolmatación y Conformación de Talud con Excavadora	M3	5,748.80	100.00	5,748.80	100.00
TOTAL AVANCE %						100.00

  
Wilmer Alberto Rojas Agurto  
INGENIERO AGRÓNOMO  
REG. N° 101712

  
Marco Antonio Soterriga Manchao  
ING. AGRÓNOMO  
REG. N° 101712



  
KEXIO & ROEM  
SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.  
José O. Sandoval Córdova  
GERENTE





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE


6.9 FOTOS.

Trabajos realizados en la Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Alcantarilla Norte del Centro poblado de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Departamento de Tumbes"

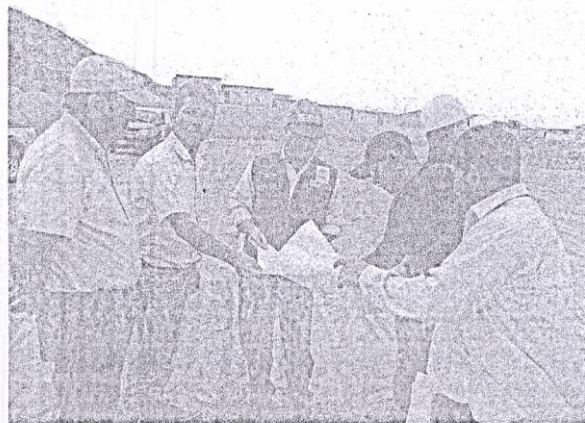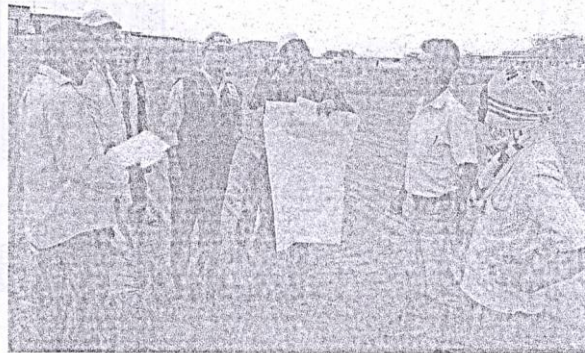

  
Wilmer Alberto Rojas Aguirre  
INGENIERO AGRÓNOMO  
REG. Nº 108713

  
Marco Antonio Ambríz Mendota  
ING. AGRÓNOMO  
REG. Nº 108713

  
KEXIO & ROEM  
SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.  
José O. Sandoval Córdova  
GERENTE

**A N E X O N° 01**

**CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS**

OBRA: "MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA ALCANTARILLA NORTE DEL CENTRO POBLADO DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR- DEPARTAMENTO DE TUMBES"  
 CONTRATISTA: KEXIO Y ROEM SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.  
 CONTRATO N°: 27-2015-GOB.REG-TUMBES-GOR-ORA-OLSA

FECHA	C/P N°	CONCEPTO	VALORIZACIONES			IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	MONTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		MULTAS Y OTROS	TOTAL AMOR-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	REINT.	IGV. VAL.					EFFECTIVO	MATERIAL			EFFECTIVO	EFFECTIVO
10/02/2016	9159	EXP TECNI	9,308.32		167.57	0.00	0.00	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	930.93	167.57	
10/02/2016	9160	EXP TECNI			1,508.11	0.00	0.00	10,817.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378.39	1,508.11	
10/02/2016	9156	SERVICIO	55,974.58		1,007.54	0.00	0.00	1,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.46	1,007.54	
10/02/2016	9158	SERVICIO			8,060.34	0.00	0.00	64,034.92	0.00	0.00	0.00	0.00	44,779.66	8,060.34	
	9201	GARANTIA			1,007.54	0.00	0.00	1,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.46	1,007.54	
		<b>T O T A L</b>	<b>65,283.90</b>	<b>0.00</b>	<b>11,751.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,283.90</b>	<b>11,751.10</b>	

C. PRINCIPAL 65,283.90  
 REINTEGRO 0.00  
 I.G.V. 11,751.10  
**MONTO PARCIAL 77,035.00**  
 AUTORIZ. Y PAGADO 0.00  
 I.G.V. 0.00  
**COSTO TOTAL OBRA 77,035.00**

EFFECTIVO 65,283.90  
 AMORTIZAC. Y DSCIOS 0.00  
 I.G.V. 11,751.10  
**MONTO PARCIAL 77,035.00**  
 AUTORIZ. Y PAGADO 0.00  
 I.G.V. 0.00  
**COSTO TOTAL OBRA 77,035.00**

*[Signature]*  
 WALTER GIBER...  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 REG. CP # 63559

*[Signature]*  
 Marea...  
 Gerente Administrativo  
 REG. CP # 63559

KEXIO & ROEM  
 SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.  
 José O. Sandoval Córdova  
 GERENTE

02



**A N E X O N° 02**

**LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA**

OBRA "MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA ALCANTARILLA NORTE DEL CENTI POBLADO DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANT VILLAR-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

CONTRATISTA KEXIO Y ROEM SERVICIOS GENERALES S.C.R.L  
 CONTRATO N°27-2015-GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA

<b>1,00 AUTORIZADO Y PAGADO</b>		
<b>1,01 AUTORIZADO</b>		
M.B.V. CONTRATO PRINCIPAL	55.974,58	65.283,90
ELABORACION EXP. TEC	9.309,32	
<b>1,02 PAGADO</b>		
M.B.V. CONTRATO PRINCIPAL	55.974,58	65.283,90
ELABORACION EXP. TEC	9.309,32	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>0,00</b>
<b>2,00 IGV</b>		
2,01 AUTORIZADO	11.751,10	
2,02 PAGADO	11.751,10	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>0,00</b>
<b>3,00 ADELANTOS OTORGADOS</b>		
<b>3,01 OTORGADO</b>		
EN EFECTIVO		0,00
MATERIALES	0,00	
<b>3,02 AMORTIZADO</b>		
EN EFECTIVO		0,00
MATERIALES	0,00	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>0,00</b>

**RESUMEN**

1,00 AUTORIZADO Y PAGADO	0,00
2,00 IGV	0,00
3,00 ADELANTOS	0,00
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>0,00</b>

**SON: CERO CON 00/100 SOLES**

*[Signature]*  
 INGENIERO AGRONOMO  
 REG. N° 63550

*[Signature]*  
 Marco Antonio Sandoval Córdova  
 INGENIERO  
 REG. N° 18978

*[Signature]*  
 KEXIO & ROEM  
 SERVICIOS GENERALES  
 José D. Sandoval Córdova  
 GERENTE
