

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Tumbes, 01 FEB 2016

CARGO 72

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
RECIPIENTE
Fecha: 01 FEB 2016
Hora: 4:00 p.
Nº Reg: 60
Firma: J. 023/16

INFORME N° 002-2016/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-WARA-S

SEÑOR : Ing. Manuel Leiva Castillo
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

ASUNTO : ALCANZO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

REF. : a) CARTA N° 009-2015/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR
b) Actividad Por Emergencia: Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Chacritas en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en calidad de Supervisor, designado con documento de la referencia a), alcanzo adjunto al presente el Informe Final de Supervisión de la Actividad por Emergencia denominada: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Chacritas en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes", cumpliéndose con lo programado en el expediente técnico.

Adjunto los siguientes documentos:

- Asientos del Cuaderno de Obra.
- Acta de Entrega de Terreno.
- Carta de Designación de Supervisor.
- Copia Fedateada de Acuerdo de Consejo Regional N°116-2015/GRT-CR-CD.
- Resolución Gerencial Regional de Aprobación de Expediente Técnico y Presupuesto Analítico de la Actividad por Emergencia.
- Copia Fedateada de Expediente Técnico.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
ING. WILMER RAMIRO AGUIRTO
JEFE DE MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA CHACRITAS
DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES

CARGO 71

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD POR EMERGENCIA: "MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA CHACRITAS EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Fecha:	01 FEB 2015
Hora:	9:00
N° Bss:	
Firma:	

I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Esta actividad se ha elaborado ante la necesidad que tienen los moradores y agricultores del Sector Chacritas, en el Centro Poblado de Higuern, que se encuentra ubicado en la margen izquierda de la Quebrada Chacritas, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes, en donde viven 56 familias, siendo sus actividades productivas más importantes la agricultura y la ganadería de pastoreo.

Con la presencia del fenómeno el niño anunciado por el SENAMHI, existe mayor riesgo de desastre puesto que en las partes altas y a pocos metros se encuentran instaladas empresas extractoras de minería no metálica, que extraen básicamente roca, removiendo el fondo de los cauces y destrozando la cobertura vegetal propia de esa zona, todo ese materia removido sería transportado hacia las partes bajas donde se encuentran los campos de cultivo.

La ejecución de una actividad de descolmatación, es urgente para evitar desastres, que pudieran ocasionar pérdidas de importancia económica y al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de la expansión de la frontera agrícola, puesto que en esta zona se vienen instalando cultivos alternativos con una alta rentabilidad, que se adaptan muy bien a esta zonas, como es el caso del limón y el banano, que usan como fuente los acuíferos del agua subterránea a esta cuenca, con la instalación de pozos anillados y la colmatación del cauce deteriora su infraestructura de captación

1.2 OBJETIVO

Mantenimiento del cauce de la Quebrada Chacritas a través de la descolmatación y la conformación del talud.

1.3 METAS

Mantenimiento de 1,863.96 metros longitudinales y 17875.20 m³ a través de la descolmatación del cauce de la Quebrada de la Chacritas.

1.4 PRESUPUESTO

Obra por contrata (Incluido IGV y Gastos generales)	S/ 198,511.00
Gastos de Supervisión	S/ 5,845.00
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	S/ 6,000.00

El valor referencial de la Actividad es de S/ 210,356.00
(Doscientos Diez Mil Treientos Cincuenta y Seis Con 00/100 Nuevos Soles).

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 AGURTO

70

C A R G O

1.5 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución será por Contrata, a Precio Unitario.

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN

Treinta (30) días calendario.

1.7 RESIDENTE


ING. CIP John De La Cruz López.

1.8 INICIO DE EJECUCIÓN

25 de Diciembre de 2015.

1.9 TERMINO DE EJECUCIÓN

19 de Enero de 2016.



II. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

La actividad se desarrollará en el ámbito de la Quebrada Chacritas en el sector del mismo nombre, Centro Poblado de Higuero, del Distrito de Pampas de Hospital y consiste en el desarrollo físico de las metas descritas líneas arriba teniendo en consideración los objetivos estratégicos contemplados en la respectiva actividad, para ello se tendrán en cuenta una serie de acciones programadas y de esta manera darle el mantenimiento respectivo del cauce de dicha Quebrada, para prevenir los daños por inundación.

Asimismo debemos describir de una manera sucinta que para la ejecución de la actividad se consiste en realizar el mantenimiento de dicha quebrada, donde se utilizara maquinaria pesada como excavadora de oruga.

En ese sentido la ejecución del proyecto se desarrollará de la siguiente manera:

- Trazo y replanteo: Consiste en trazar el lugar donde se ejecutara la descolmatación y conformación de talud, se tendrá en cuenta la longitud y el ancho de intervención según metrados.
- Descolmatación y conformación de talud: Esta actividad se realizara con la utilización de una excavadora con oruga ubicándose en una margen de la quebrada, y extrayendo el material del cauce de la quebrada y colocándolo en ambas márgenes al mismo tiempo que se conformara el talud con el mismo material extraído, así mismo la longitud de intervención será de 1,863.96 m, el ancho será de 12^m de promedio, la profundidad de corte será de 0.799 m en promedio y con un volumen de 17,875.20 m³.



69

C A R G O

III. AVANCE FISICO (25/12/15 al 19/01/16)

PART.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			AVANCE POR PARTIDA	
		UNID.	CANT.	%	CANT.	%
01.00	OBRAS PROVISIONALES			100.00		100.00
1.01	Suministro y Colocación de Cartel de Identificación de Obra.	Unid	1.00	100.00	1.00	100.00
02.00	TRABAJOS PRELIMINARES			100.00		100.00
2.01	Trazo, Nivelación y Replanteo	MI	1,863.96	50.00	1,863.96	50.00
2.02	Movilización y Desmovilización de Equipos	Glb	1.00	50.00	1.00	50.00
03.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS			100.00		100.00
3.01	Descolmatación y Conformación de Talud con Excavadora.	M3	17,875.20	100.00	17,875.20	100.00

IV. AVANCE FINANCIERO (25/12/15 al 19/01/16)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADOS	PREC.UNIT	PREC.PARCIAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES				780.84
01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (5.60 x 3.40 M)	Und.	1.00	780.84	780.84
02.00	TRABAJOS PRELIMINARES				4274.0312
02.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	ML	1,863.96	1.22	2274.0312
02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00
03.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				135,136.51
03.01	DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE TALUD CON EXCAVADORA 330 HP	M3	17,875.20	7.56	135,136.51
COSTO DIRECTO					140,191.38
GASTOS GENERALES 10%					14,019.14
UTILIDADES 10%					14,019.14
SUB TOTAL					168,229.66
IGV 18%					30,281.34
GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE					198,511.00
TOTAL S/.					210,356.00
SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES					

RECIBO 01 19/01/2016
 HORA 9:00
 N° 103

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 GERENCIA REGIONAL DE RECONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE
 ING. WILMER ALVARO ROJAS AGARTO
 SUPERVISOR
 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CAUSE DE LA CUERRADA CHACAYAL
 EN EL DISTRITO DE PAMPACON, PROVINCIA Y DPTO. DE TUMBES

68

C A R G O

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Cumplimiento de las metas físicas, de acuerdo a lo programado en el Expediente Técnico de la Actividad Por Emergencia y el Contrato de Servicio N° 29-2015-GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA

5.2 Recomendar el inicio del proceso de recepción, para luego culminar con la presentación del Informe Final de Liquidación.

Fecha: 01 FEB 2017
Hora: 10:00
N° Reg.:
Firma:


VI. FOTOS.

Trabajos realizados en la actividad por Emergencia: Mantenimiento del Cauce de la Quebrada Chacritas, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes.




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
ING. WILMER ROJAS ACOSTA
SUPERVISOR
ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA CHACRITAS
EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES

CARGO

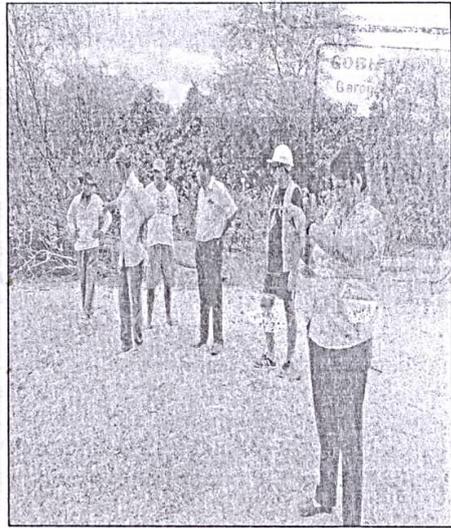

FEB 2016
9.00 p

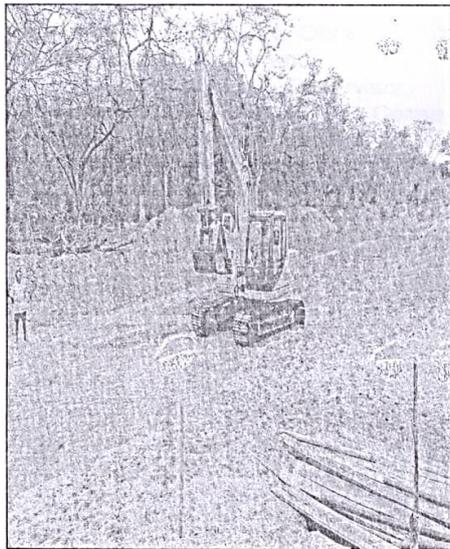

GOBIERNO REGIONAL LIMA
CORPORACIÓN REGIONAL DE SERVICIOS URBANOS Y GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

ING. WILMER JUAN ROJAS MARTO
SUPERVISOR

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CAUPE DE LA CIEBRADA DE NAUTITAS,
EN EL DISTRITO DE PARIHUESES, PROVINCIA Y DPTO. DE TILCOTES
