


EXPEDIENTE TÉCNICO

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°093 EFRAÍN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA-PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

CROGRAMACION DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT

DIAGRAMA GANTT MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 003 EFRAIN ARCAZA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES

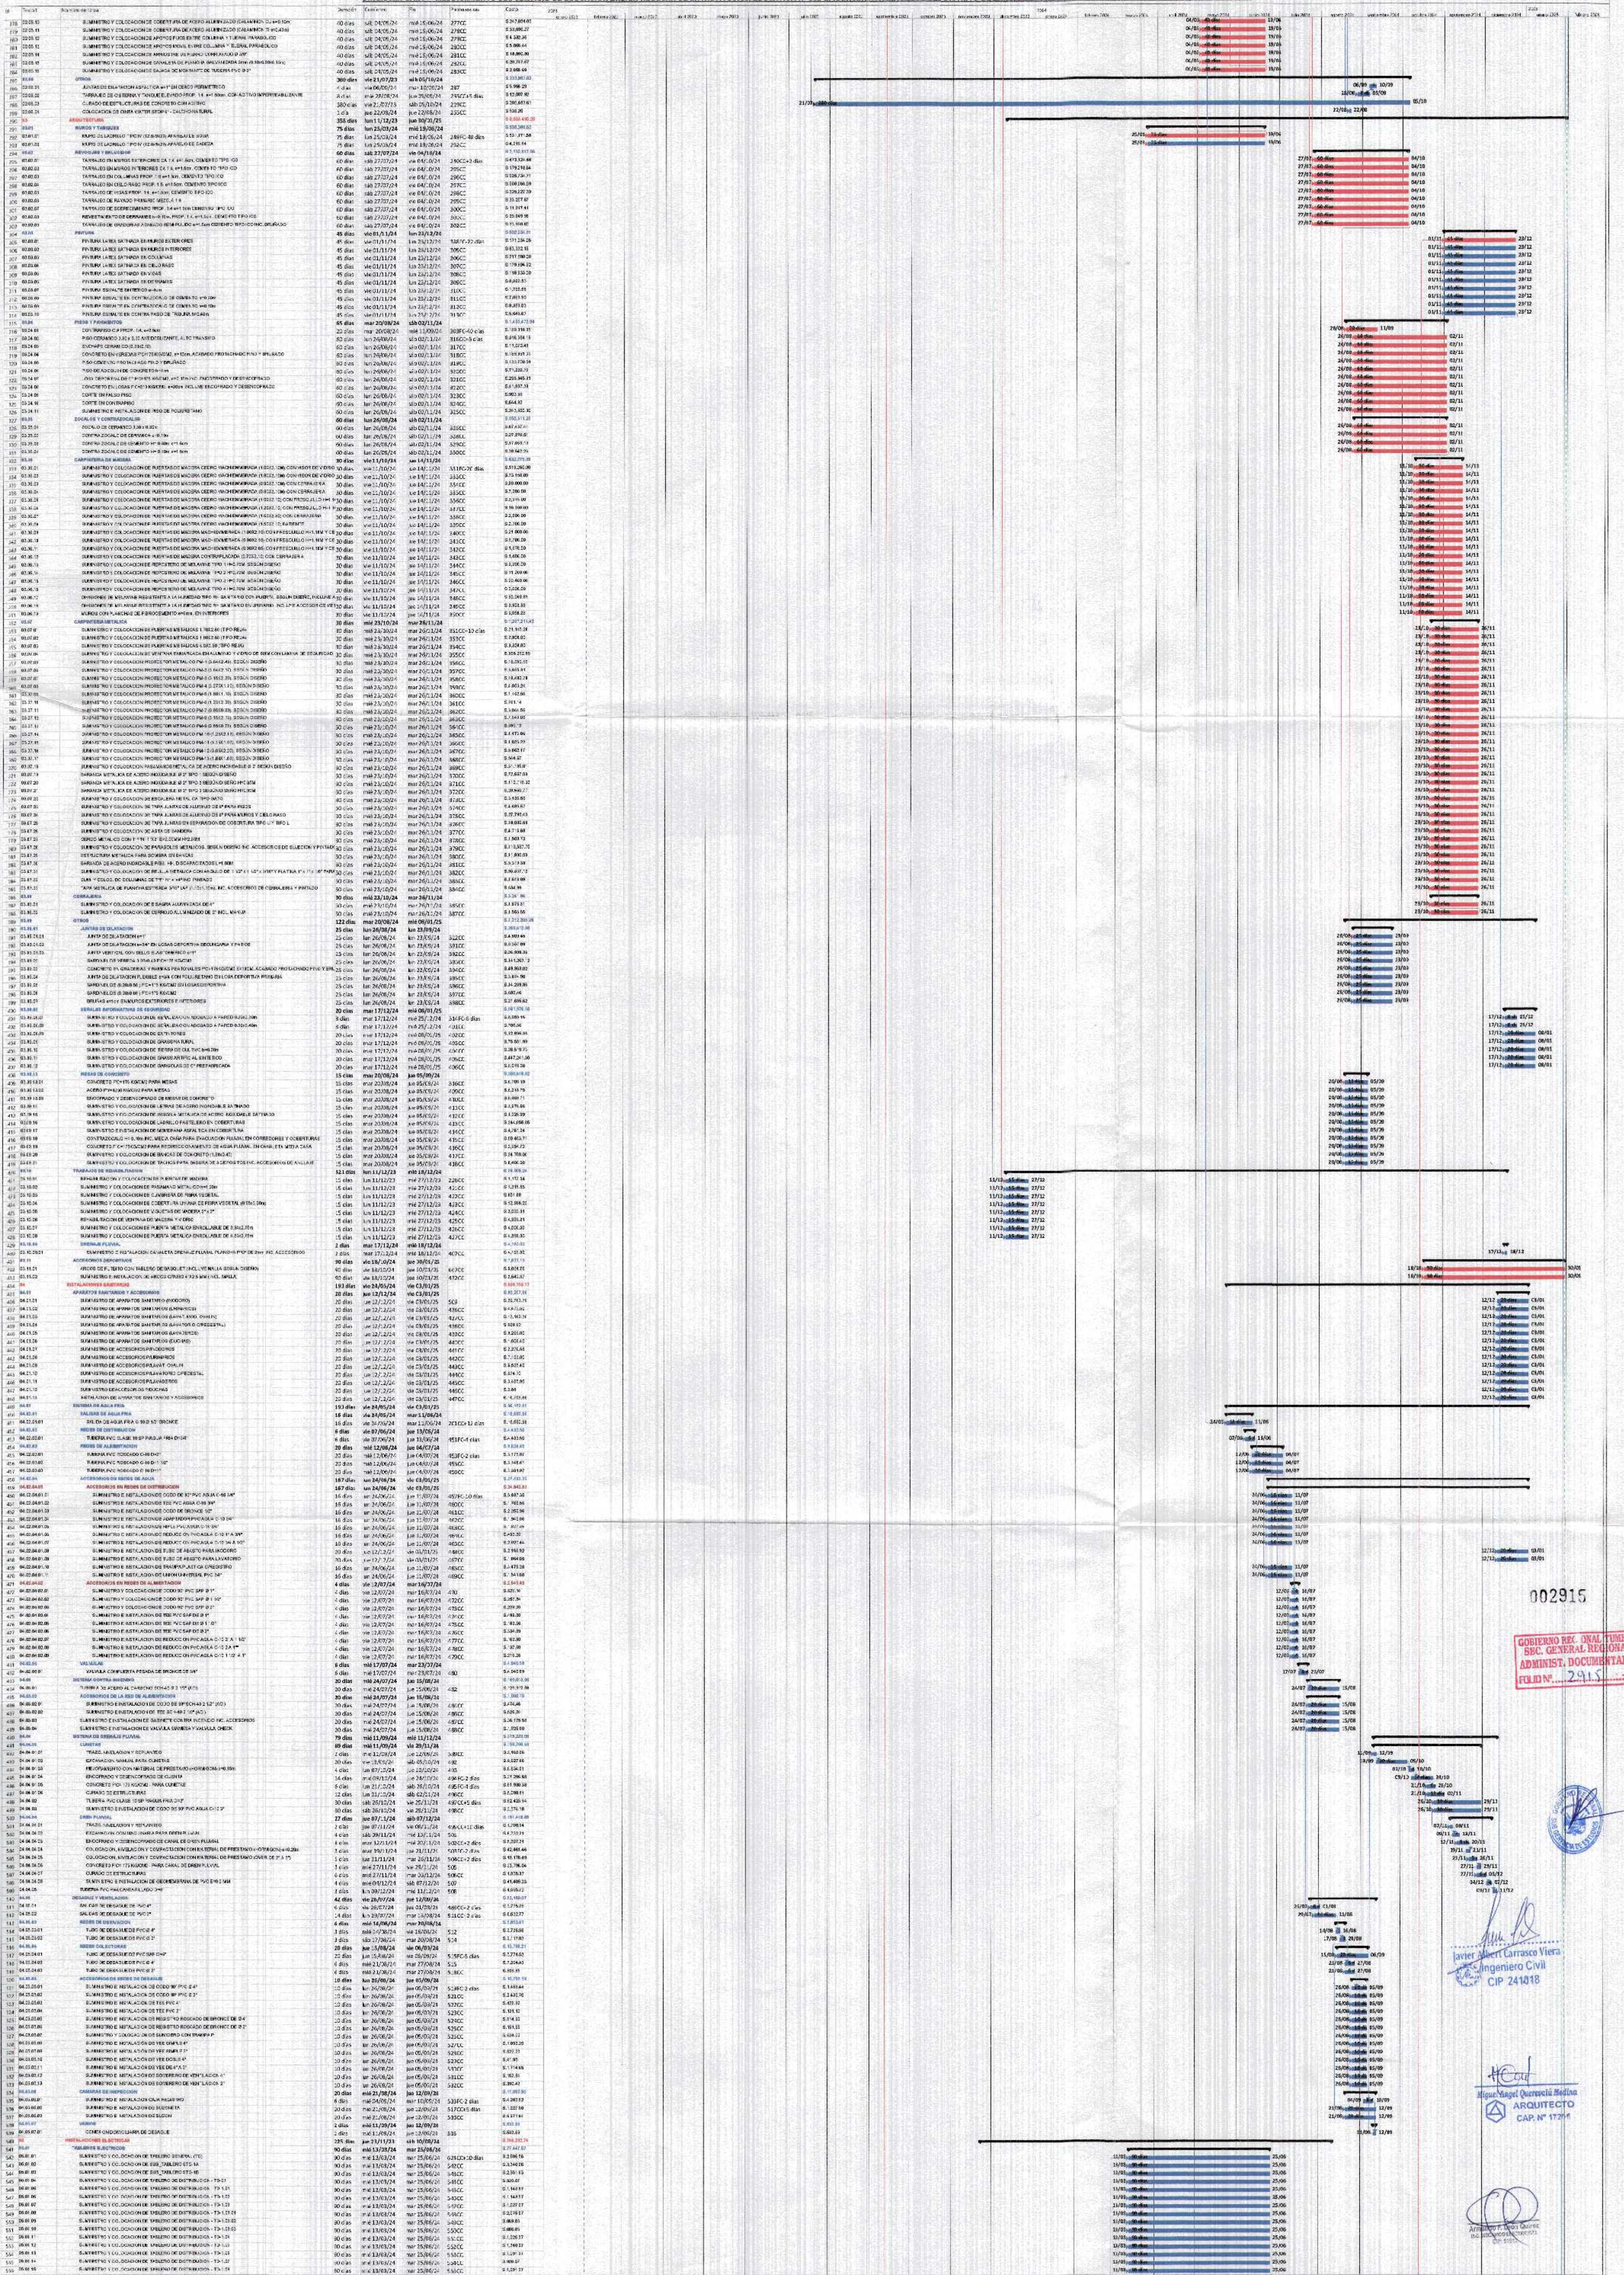

002915
GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SECRETARIA GENERAL REGIONAL
ADMINISTR. DOCUMENTARIA
FOLIO N° 2915

Javier Albert Carrasco Viera
Ingeniero Civil
CIP 241018

H. Escal
Hugo Miguel Querecillo Medina
ARQUITECTO
CAP. N° 17214

ARQUITECTO
CAP. N° 17214

DIAGRAMA Gantt "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 003 ESPRAN ARCAVEA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

NO	DESCRIPCION DE LA TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACION	PROGRESO
137	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
138	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
139	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
140	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
141	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
142	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
143	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
144	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
145	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
146	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
147	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
148	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
149	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
150	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
151	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
152	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
153	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
154	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
155	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
156	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
157	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
158	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
159	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
160	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
161	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
162	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
163	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
164	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
165	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
166	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
167	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
168	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
169	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
170	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
171	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
172	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
173	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
174	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
175	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
176	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
177	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
178	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
179	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
180	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
181	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
182	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
183	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
184	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
185	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
186	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
187	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
188	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
189	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
190	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
191	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
192	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
193	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
194	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
195	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
196	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
197	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
198	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
199	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%
200	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	13/01/2021	13/01/2021	1	100%

Ing. Alberto Carrasco Viera
Ingeniero Civil
CIP 241018

Arquitecto
CAP. N° 17208

Arquitecto
CAP. N° 17208
