DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°003 JORGE GUIMAC BONIFAZ PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°003 JORGE GUIMAC BONIFAZ PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"	150 días	mié 01/05/19	vie 27/09/19		S/1,994,053.72
2		INICIO DEL PROYECTO	0 días	mié 01/05/19	mié 01/05/19		S/0.00
3		ESTRUCTURAS	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19		S/830,922.64
4	01	OBRAS PROVISIONALES	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19		S/20,739.94
5	01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 5.60 x 3.40m	1 día	mié 01/05/19	mié 01/05/19	2	S/814.10
6	01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	2 días	mié 01/05/19	jue 02/05/19	5CC	S/2,436.00
7	01.03	SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	2CC	S/650.00
8	01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	7CC	S/2,500.00
9	01.05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19		S/14,339.84
10	01.05.01	EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	8CC	S/2,600.00
11	01.05.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	10CC	S/9,250.00
12	01.05.03	SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	11CC	S/889.84
13	01.05.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	12CC	S/1,600.00
14	02	TRABAJOS PRELIMINARES	130 días	mié 01/05/19	sáb 07/09/19		S/123,764.59
15	02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	120 días	sáb 11/05/19	sáb 07/09/19	23CC	S/906.18
16	02.02	LIMPIEZA INICIAL DE OBRA	4 días	dom 12/05/19	mié 15/05/19	15CC+1 día	S/1,207.86
17	02.03	ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES	2 días	mié 01/05/19	jue 02/05/19	13CC	S/467.44
18	02.04	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO	6 días	mié 01/05/19	lun 06/05/19	17CC	S/29,044.77
19	02.05	DEMOLICION DE ZAPATA	10 días	mié 01/05/19	vie 10/05/19	18CC	S/34,525.75
20	02.06	DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO	6 días	lun 06/05/19	sáb 11/05/19	19FC-5 días	S/1,384.50
21	02.07	DEMOLICION DE MUROS	6 días	lun 06/05/19	sáb 11/05/19	20CC	S/5,785.09
22	02.08	DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES	4 días	jue 09/05/19	dom 12/05/19	21FC-3 días	S/195.27
23	02.09	DESMONTAJE DE PUERTAS	2 días	sáb 11/05/19	dom 12/05/19	22FC-2 días	S/212.87
24	02.10	DESMONTAJE DE VENTANAS	3 días	sáb 11/05/19	lun 13/05/19	23CC	S/798.92
25	02.11	DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA	6 días	lun 06/05/19	sáb 11/05/19	21CC	S/1,746.62
26	02.12	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A D=2.5KM. DE LA OBRA	3 días	mar 14/05/19	jue 16/05/19	24	S/11,484.22
27	02.13	ELIMINACION DE MATERIAL POR ACARREO (DEMOLICION)	3 días	mar 14/05/19	jue 16/05/19	26CC	S/36,005.10
28	03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	99 días	lun 13/05/19	lun 19/08/19		S/64,936.20
29	03.01	EXCAVACION SIMPLE PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTO CORRIDO	15 días	lun 13/05/19	lun 27/05/19	16CC+1 día	S/22,756.49
30	03.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO	4 días	vie 16/08/19	lun 19/08/19	38CC	S/2,702.56
31	03.03	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION CAPA DE AFIRMADO e=0.15r	8 días	sáb 27/07/19	sáb 03/08/19	32CC+2 días	S/6,113.40
32	03.04	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION CAPA DE HORMIGON	8 días	jue 25/07/19	jue 01/08/19	78CC	S/11,561.94
33	03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A D=2.5KM. DE LA OBRA	4 días	dom 26/05/19	mié 29/05/19	29FC-2 días	S/7,707.32
34	03.06	ELIMINACION DE MATERIAL POR ACARREO	4 días	dom 26/05/19	mié 29/05/19	33CC	S/14,094.49
35	04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	103 días	lun 13/05/19	vie 23/08/19		S/66,407.50
36	04.01	SOLADO PROP. 1:10 e=0.10m	8 días	sáb 18/05/19	sáb 25/05/19	40CC	S/6,212.14
37	04.02	CIMIENTO CORRIDO PROP. C:H 1:10 + 30% P.G.	8 días	lun 13/05/19	lun 20/05/19	41CC	S/23,329.26
38	04.03	FALSO PISO e=0.10m	6 días	vie 16/08/19	mié 21/08/19	102CC	S/8,452.44
39	04.04	CONTRAPISO e=0.05m	6 días	dom 18/08/19	vie 23/08/19	38CC+2 días	S/10,894.68
40	04.05	SUB CIMIENTO DE CONCRETO PROP. 1:10 + 30% PG	3 días	sáb 18/05/19	lun 20/05/19	37FC-3 días	S/11,101.33
41	04.06	OVER 60% + HORMIGON GRUESO 40% e=0.20m	3 días	lun 13/05/19	mié 15/05/19	29CC	S/2,835.97
42	04.07	SOBRECIMIENTO	3 días	mié 26/06/19	vie 28/06/19		S/3,581.68
43	04.07.01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO	1 día	vie 28/06/19	vie 28/06/19	44	S/1,448.65
44	04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	2 días	mié 26/06/19	jue 27/06/19	50CC	S/2,133.03
45	05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	67 días	lun 20/05/19	jue 25/07/19		S/523,829.47
46	05.01	ZAPATAS	14 días	lun 20/05/19	dom 02/06/19		S/47,706.40
47	05.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PARA ZAPATAS	8 días	dom 26/05/19	dom 02/06/19	48FC-6 días	S/42,355.95
48	05.01.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA ZAPATAS	12 días	lun 20/05/19	vie 31/05/19	36CC+2 días	S/5,350.45
49	05.02	SOBRECIMIENTO ARMADO	11 días	mié 19/06/19	sáb 29/06/19		S/51,176.33
50	05.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	4 días	mié 26/06/19	sáb 29/06/19	51FC-2 días	S/16,341.06
51	05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO ARMADO	8 días	jue 20/06/19	jue 27/06/19	52FC-4 días	S/20,792.86
52	05.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA VIGAS DE CIMENTACION	5 días	mié 19/06/19	dom	58CC+2 días	S/14,042.41
53	05.03	VIGA DE CIMENTACION	12 días	mar 28/05/19	sáb 08/06/19		S/35,870.41
54	05.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PARA VIGA DE CIMENTACION	4 días	mié 05/06/19	sáb 08/06/19	55FC-2 días	S/12,168.28
55	05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION	8 días	jue 30/05/19	jue 06/06/19	56CC+2 días	S/3,050.59
56	05.03.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA VIGA DE CIMENTA	8 días	mar 28/05/19	mar 04/06/19	47FC-6 días	S/20,651.54
57	05.04	COLUMNAS	24 días	mié 05/06/19	vie 28/06/19		S/145,887.87
58	05.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PARA COLUMNAS	12 días	lun 17/06/19	vie 28/06/19	59FC-10 días	S/32,339.90
59	05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	20 días	vie 07/06/19	mié 26/06/19	60CC+2 días	S/51,208.04
60	05.04.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA COLUMNAS	20 días	mié 05/06/19	lun 24/06/19	54CC	S/62,339.93
61	05.05	VIGAS	22 días	mar 18/06/19	mar 09/07/19		S/98,236.75
62	05.05.01	CONCRETO F'C= 210KG/CM2 - PARA VIGAS	8 días	mar 02/07/19	mar 09/07/19	63FC-5 días	S/26,405.66
63	05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	15 días	sáb 22/06/19	sáb 06/07/19	64CC+4 días	S/20,695.04
64	05.05.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA VIGAS	18 días	mar 18/06/19	vie 05/07/19	58CC+1 día	S/51,136.05
65	05.06	LOSA ALIGERADA	21 días	jue 04/07/19	mié 24/07/19		S/129,064.27
66	05.06.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PARA LOSA ALIGERADA	6 días	vie 19/07/19	mié 24/07/19	68FC-4 días	S/26,147.40
67	05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	12 días	jue 04/07/19	lun 15/07/19	62CC+2 días	S/49,215.06
68	05.06.03	LADRILLO PARA TECHO DE H=0.20 M	12 días	jue 11/07/19	lun 22/07/19	69FC-10 días	S/20,095.92
69	05.06.04	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA LOSAS ALIGERAD	15 días	sáb 06/07/19	sáb 20/07/19	67CC+2 días	S/33,605.89
70	05.07	ESCALERA	5 días	vie 19/07/19	mar 23/07/19		S/7,165.07
71	05.07.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PARA LOSA ALIGERADA	1 día	mar 23/07/19	mar 23/07/19	73	S/2,841.81
72	05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA	2 días	vie 19/07/19	sáb 20/07/19	66CC	S/1,444.17
73	05.07.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA ESCALERA	3 días	sáb 20/07/19	lun 22/07/19	72CC+1 día	S/2,879.09
74	05.08	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	3 días	mar 23/07/19	jue 25/07/19		S/8,722.37
75	05.08.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	1 día	jue 25/07/19	jue 25/07/19	76	S/2,596.05
76	05.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	2 días	mar 23/07/19	mié 24/07/19	77CC	S/2,060.54
77	05.08.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	2 días	mar 23/07/19	mié 24/07/19	71CC	S/2,921.23
78	05.08.04	MUROS REFORZADOS DE CISTERNA CONCRETO F'C=210 KG/CM2	1 día	jue 25/07/19	jue 25/07/19	76	S/1,144.55
79	06	CARPINTERIA METALICA	5 días	mié 31/07/19	dom 04/08/19		S/11,977.15
80	06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA GALVANIZADA DE Ø 2" h=70cm	2 días	mié 31/07/19	jue 01/08/19	99CC	S/1,741.82
81	06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES METALICOS GALVANIZADOS DE Ø 2" y Ø 3"	4 días	mié 31/07/19	sáb 03/08/19	80CC	S/1,115.76
82	06.03	ESCALERA TIPO GATO CON PROTECCION A TANQUE ELEVADO	2 días	mié 31/07/19	jue 01/08/19	81CC	S/560.00
83	06.04	REJA DE TUBOS CUADRADOS METALICOS (CERCO PERIMETRICO FRONTAL)	3 días	vie 02/08/19	dom 04/08/19	82CC+2 días	S/3,555.32
84	06.05	REJILLA METALICA EN CUNETA DE EVACUACION PLUVIAL	3 días	vie 02/08/19	dom 04/08/19	83CC	S/5,004.25
85	07	OTRAS OBRAS	65 días	mié 05/06/19	jue 08/08/19		S/19,267.79
86	07.01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 (FROTACHADO)	2 días	dom 04/08/19	lun 05/08/19	87CC+1 día	S/6,652.70
87	07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	2 días	sáb 03/08/19	dom 04/08/19	88CC+1 día	S/1,069.78
88	07.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	2 días	vie 02/08/19	sáb 03/08/19	84CC	S/1,594.95
89	07.04	SARDINEL 0.20x0.30 F'C=175 KG/CM2	2 días	mar 06/08/19	mié 07/08/19	86	S/360.71
90	07.05	CALAMINON CURVO INCL. CORREAS METALICAS DE 3"x2"	3 días	mar 06/08/19	jue 08/08/19	89CC	S/2,746.33
91	07.06	JUNTAS ASFALTICAS e=1"	3 días	mar 06/08/19	jue 08/08/19	90CC	S/249.99
92	07.07	CURADO DE ESTRUCTURAS	60 días	mié 05/06/19	sáb 03/08/19	54CC	S/6,593.33
93		ARQUITECTURA	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19		S/832,236.75
94	01	PABELLONES	53 días	sáb 27/07/19	mar 17/09/19		S/535,524.10
95	01.01	MUROS Y TABIQUERIAS	14 días	sáb 27/07/19	vie 09/08/19		S/81,512.17
96	01.01.01	MURO DE LADRILLO KING KONG 18 HUECOS MAQUINADO APAREJO DE CAB	5 días	sáb 27/07/19	mié 31/07/19	31CC	S/18,732.65
97	01.01.02	MURO DE LADRILLO KING KONG 18 HUECOS MAQUINADO APAREJO DE SOG	12 días	lun 29/07/19	vie 09/08/19	96CC+2 días	S/62,779.52
98	01.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS	21 días	mié 31/07/19	mar 20/08/19		S/130,724.87
99	01.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON CEMENTO MS	15 días	mié 31/07/19	mié 14/08/19	97CC+2 días	S/55,162.28
100	01.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS PROP. 1:4, e=1.5cm CEMENTO TIPO I	15 días	vie 02/08/19	vie 16/08/19	99CC+2 días	S/17,070.78
101	01.02.03	TARRAJEO EN VIGAS PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO I	15 días	dom 04/08/19	dom 18/08/19	100CC+2 días	S/14,672.51
102	01.02.04	REVESTIMIENTO DE DERRAMES e=0.15cm PROP. 1:2	5 días	vie 16/08/19	mar 20/08/19	103FC-4 días	S/6,944.85
103	01.02.05	TARRAJEO DE CIELO RASO PROP. 1:4, e=1.5cm CEMENTO TIPO I	10 días	sáb 10/08/19	lun 19/08/19	101CC+6 días	S/36,874.45
104	01.03	PISOS Y PAVIMENTOS	16 días	mar 20/08/19	mié 04/09/19		S/52,061.34
105	01.03.01	PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO DE 0.40x0.40	15 días	mar 20/08/19	mar 03/09/19	39CC+2 días	S/47,611.03
106	01.03.02	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.30x0.30	5 días	sáb 31/08/19	mié 04/09/19	105FC-4 días	S/4,450.31
107	01.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	5 días	lun 02/09/19	vie 06/09/19		S/42,199.49
108	01.04.01	ZOCALO DE CERAMICO DE 0.30 x 0.20 m	5 días	lun 02/09/19	vie 06/09/19	106CC+2 días	S/29,052.25
109	01.04.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO h=0.10m	5 días	lun 02/09/19	vie 06/09/19	108CC	S/12,038.09
110	01.04.03	ENCHAPADO DE PORCELANATO DE 0.60 x 0.60m EN MESAS DE CONCRETO	5 días	lun 02/09/19	vie 06/09/19	109CC	S/1,109.15
111	01.05	CARPINTERIA DE MADERA	4 días	mié 11/09/19	sáb 14/09/19		S/38,594.30
112	01.05.01	PUERTA TIPO TABLERO C/MARCOS DE MADERA INCL. PERSIANAS - LAQUEA	4 días	mié 11/09/19	sáb 14/09/19	131CC	S/31,844.30
113	01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES BAJOS DE MELAMINE, INCLUYE BISAGRAS, JALADORES METALICOS	4 días	mié 11/09/19	sáb 14/09/19	112CC	S/3,900.00
114	01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET DE MELAMINE CON PUERTAS Y CAJONES, INCL. BISAGRAS, JALADORES METALICOS Y RIELES	4 días	mié 11/09/19	sáb 14/09/19	113CC	S/2,850.00
115	01.06	CARPINTERIA METALICA	5 días	vie 13/09/19	mar 17/09/19		S/25,269.92
116	01.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIVISION METALICA INCLUYE PERFILES Y ACCESORIOS	3 días	vie 13/09/19	dom	114CC+2 días	S/2,369.92
117	01.06.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA INCLUYE BISAGRAS Y CERROJO DE 2" DE 0.60x1.55m	3 días	dom	mar 17/09/19	116FC-1 día	S/2,715.12
118	01.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL DE ACERO DE 4" x 4" x 1/4"	3 días	dom 15/09/19	mar 17/09/19	117CC	S/20,184.88
119	01.07	VIDRIOS, CRISTALES O SIMILARES	4 días	lun 09/09/19	jue 12/09/19		S/57,138.01
120	01.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO CON LAMINA DE SEGURIDAD DE 6mm	4 días	lun 09/09/19	jue 12/09/19	140CC	S/57,138.01
121	01.08	CERRAJERIA	3 días	lun 09/09/19	mié 11/09/19		S/2,608.20
122	01.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE 02 GOLPES, PESADA FABRICACION NACIONAL/PUERTAS EXTERNAS	3 días	lun 09/09/19	mié 11/09/19	120CC	S/1,488.10
123	01.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PERILLA, PESADA FABRICACION NACIONAL/PUERTAS INTERNAS	3 días	lun 09/09/19	mié 11/09/19	122CC	S/381.20
124	01.08.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA DE 4" EN PUERTAS	3 días	lun 09/09/19	mié 11/09/19	123CC	S/738.90
125	01.09	PINTURA	11 días	mar 03/09/19	vie 13/09/19		S/46,194.08
126	01.09.01	PINTURA SATINADA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	8 días	mar 03/09/19	mar 10/09/19	110CC+1 día	S/25,439.64
127	01.09.02	PINTURA SATINADA EN COLUMNAS Y PLACAS	8 días	mar 03/09/19	mar 10/09/19	126CC	S/5,358.38
128	01.09.03	PINTURA SATINADA EN VIGAS	8 días	jue 05/09/19	jue 12/09/19	127CC+2 días	S/3,501.83
129	01.09.04	PINTURA SATINADA EN DERRAMES PUERTAS Y VENTANAS	8 días	jue 05/09/19	jue 12/09/19	128CC	S/1,654.69
130	01.09.05	PINTURA SATINADA EN CIELO RASO	8 días	jue 05/09/19	jue 12/09/19	129CC	S/9,395.34
131	01.09.06	RESQUETEADO Y PINTADO DE PROTECTORES METALICOS CON ESMALTE Y BASE ANTICORROSIVO	3 días	mié 11/09/19	vie 13/09/19	130FC-2 días	S/844.20
132	01.10	OBRAS VARIAS	7 días	jue 05/09/19	mié 11/09/19		S/59,221.72
133	01.10.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO BISELADO DE 4mm INCLUYE MARCO POSTERIOR DE ALUMINIO	3 días	jue 05/09/19	sáb 07/09/19	130CC	S/2,198.65
134	01.10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERAS DE ALUMINIO 2" PARA ESCALERAS	3 días	jue 05/09/19	sáb 07/09/19	133CC	S/624.34
135	01.10.03	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	3 días	jue 05/09/19	sáb 07/09/19	134CC	S/40,214.36
136	01.10.04	PINTADO DE LETRAS	3 días	sáb 07/09/19	lun 09/09/19	135CC+2 días	S/322.03
137	01.10.05	JUNTA DE DILATACION CON PLATINA DE 4" x 3/16"	3 días	dom 08/09/19	mar 10/09/19	136CC+1 día	S/203.27
138	01.10.06	COLOCACION E INSTALACION DE COBERTURA OPACA DE POLICABONATO	3 días	dom 08/09/19	mar 10/09/19	137CC	S/5,773.44
139	01.10.07	SUMINISTRO E INSTALA DE PLANCHA ALUMINIZADA DE TI e=0.40mm, INCL. CORREAS METALICAS TIPO C CON TIRAFONES	3 días	lun 09/09/19	mié 11/09/19	138CC+1 día	S/6,612.52
140	01.10.08	BRUÑA DE 1cm EN MURO	3 días	lun 09/09/19	mié 11/09/19	139CC	S/3,273.11
141	02	AREA DE CIRCULACION	35 días	sáb 27/07/19	vie 30/08/19		S/281,372.65
142	02.01	TRABAJOS PRELIMINARES	5 días	sáb 27/07/19	mié 31/07/19		S/3,373.82
143	02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	5 días	sáb 27/07/19	mié 31/07/19	96CC	S/3,373.82
144	02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	15 días	sáb 27/07/19	sáb 10/08/19		S/111,726.81
145	02.02.01	EXCAVACION DE TERRENO NATURAL EN FORMA MANUAL	8 días	sáb 27/07/19	sáb 03/08/19	143CC	S/31,066.51
146	02.02.02	COLOCACION DE CAMA DE ARENA GRUESA	4 días	vie 02/08/19	lun 05/08/19	145FC-2 días	S/461.51
147	02.02.03	COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE HORMIGON GRUESO, e=0.20m C/PLANCHA VIBRATORIA	5 días	dom	jue 08/08/19	146CC+2 días	S/24,977.86
148	02.02.04	COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE HORMIGON SELECCIONADO, e=0.20m C/PLANCHA VIBRATORIA	5 días	lun 05/08/19	vie 09/08/19	147CC+1 día	S/24,161.79
149	02.02.05	COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO SELECCIONADO, e=0.15m C/PLANCHA VIBRATORIA	5 días	mar 06/08/19	sáb 10/08/19	148CC+1 día	S/18,672.98
150	02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A D=2.5KM. DE LA OBRA	2 días	dom 04/08/19	lun 05/08/19	145	S/12,386.16
151	02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	11 días	mar 06/08/19	vie 16/08/19		S/111,089.74
152	02.03.01	RAMPA CONCRETO F'C=175 KG/CM, FROTACHADO 1:2 Y BRUÑADO, e=0.10m (INCL. 1.5cm DE PASTA)	3 días	mar 06/08/19	jue 08/08/19	149CC	S/423.30
153	02.03.02	CONCRETO EN VEREDA F'C=175 KG/CM2 FROTACHADO 1:2 Y BRUÑADO e=0.10m INCL. ENCOFRADO	8 días	mié 07/08/19	mié 14/08/19	152CC+1 día	S/17,929.30
154	02.03.03	CONCRETO EN LOSA F'C= 175 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO e=0.15m C/PLANCHA VIBRATORIA	4 días	lun 12/08/19	jue 15/08/19	153FC-3 días	S/71,579.48
155	02.03.04	SARDINEL DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DE 0.20x0.30 CEMENTO TIPO MS	5 días	lun 12/08/19	vie 16/08/19	154FC-4 días	S/13,060.94
156	02.03.05	SARDINEL DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DE 0.20x0.40 CEMENTO TIPO MS	5 días	lun 12/08/19	vie 16/08/19	155CC	S/2,225.42
157	02.03.06	SARDINEL DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DE 0.20x0.60 CEMENTO TIPO MS	5 días	lun 12/08/19	vie 16/08/19	156CC	S/2,469.12
158	02.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	5 días	lun 12/08/19	vie 16/08/19	157CC	S/3,402.18
159	02.04	REVOQUES Y ENLUCIDOS	8 días	mar 13/08/19	mar 20/08/19		S/5,808.60
160	02.04.01	TARRAJEO DE SARDINELES DE CONCRETO PROP. 1:4, e=1.5cm - CEMENTO TIPO MS	8 días	mar 13/08/19	mar 20/08/19	158CC+1 día	S/5,808.60
161	02.05	PISOS	5 días	sáb 17/08/19	mié 21/08/19		S/11,505.81
162	02.05.01	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.30x0.30 EXTERIORES	5 días	sáb 17/08/19	mié 21/08/19	160FC-4 días	S/5,060.74
163	02.05.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 4.0 x 0.10 x 0.2	5 días	sáb 17/08/19	mié 21/08/19	162CC	S/6,445.07
164	02.06	OTROS	10 días	dom 18/08/19	mar 27/08/19		S/27,387.58
165	02.06.01	JUNTA ASFALTICA e=1"	3 días	dom 18/08/19	mar 20/08/19	163CC+1 día	S/5,561.60
166	02.06.02	PICADO Y RESANE DE TARRAJEO DAÑADO	3 días	dom 18/08/19	mar 20/08/19	165CC	S/150.41
167	02.06.03	SEMBRADO DE GRASS	3 días	dom 18/08/19	mar 20/08/19	166CC	S/2,870.59
168	02.06.04	SEMBRADO DE ARBOL FICUS h=1.5m	3 días	dom 18/08/19	mar 20/08/19	167CC	S/426.08
169	02.06.05	COLOCACION Y NIVELACION DE TIERRA DE CHACRA	3 días	lun 19/08/19	mié 21/08/19	168CC+1 día	S/3,472.86
170	02.06.06	PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO	3 días	mié 21/08/19	vie 23/08/19	169CC+2 días	S/7,616.63
171	02.06.07	PIZARRA ACRILICA/MARCO DE ALUMINIO 1.10x1.30m	3 días	jue 22/08/19	sáb 24/08/19	170CC+1 día	S/2,240.00
172	02.06.08	CERCO DE SEGURIDAD INCLUYE PARANTE DE BAMBU Ø 6" Y MALLA RACHELL h=2.50m	3 días	vie 23/08/19	dom	171CC+1 día	S/1,165.50
173	02.06.09	CURADO TIPO ARROCERAS EN LOSAS Y VEREDAS	3 días	dom 25/08/19	mar 27/08/19	172CC+2 días	S/3,883.91
174	02.07	MOBILIARIO EXTERNO	6 días	dom 25/08/19	vie 30/08/19		S/10,480.29
175	02.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO METALICO (3 PERSONAS) PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS	3 días	dom	mar 27/08/19	173CC	S/1,650.00
176	02.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO METALICO DE SUBE Y BAJA (6 PERSONAS) PARA NIÑOS DE 6 A 5 AÑOS	3 días	lun 26/08/19	mié 28/08/19	175CC+1 día	S/2,250.00
177	02.07.03	SUMINSTRO E INSTALACION DE JUEGO METALICO DE RESBALADORA PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS	3 días	mar 27/08/19	jue 29/08/19	176CC+1 día	S/1,850.00
178	02.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA FUTBOL Y BASQUET, INCLUYE MALLA Y TABLERO PINTADO	3 días	mié 28/08/19	vie 30/08/19	177CC+1 día	S/3,873.50
179	02.07.05	SUMNISTRO E INSTALACION DE PARANTES METALICOS PARA VOLEY, INCLUYE MALLA	3 días	mié 28/08/19	vie 30/08/19	178CC	S/856.79
180	03	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19		S/15,340.00
181	03.01	PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	10CC	S/4,640.00
182	03.02	PROGRAMA DE MANEJO DE AFLUENTE	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	181CC	S/6,000.00
183	03.03	PROGRAMA DE MINIMIZACION DE MATERIAL PARTICULADO	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	182CC	S/3,000.00
184	03.04	PROGRAMA DE SEÑALIZACION	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	183CC	S/500.00
185	03.05	PROGRAMA DE ABANDONO	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	184CC	S/600.00
186	03.06	PROGRAMA DE SEÑALEPTICA AMBIENTAL	140 días	mié 01/05/19	mar 17/09/19	185CC	S/600.00
187	01	SANITARIAS	115 días	mié 05/06/19	vie 27/09/19		S/26,299.96
188	01.01	RED DE AGUA POTABLE	15 días	mié 05/06/19	mié 19/06/19		S/5,310.94
189	01.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"	5 días	mié 05/06/19	dom 09/06/19	54CC	S/559.98
190	01.01.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE Ø 3/4" PVC SAP	5 días	lun 10/06/19	vie 14/06/19	189	S/257.22
191	01.01.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE Ø 1/2" PVC SAP	5 días	sáb 15/06/19	mié 19/06/19	190	S/2,445.37
192	01.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP Ø 3/4", C-10	5 días	sáb 15/06/19	mié 19/06/19	191CC	S/74.52
193	01.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP Ø 1/2", C-10	5 días	sáb 15/06/19	mié 19/06/19	192CC	S/708.01
194	01.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SAP Ø 3/4" A 3/4", C-10	5 días	sáb 15/06/19	mié 19/06/19	193CC	S/27.44
195	01.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SAP Ø 1/2" A 1/2", C-10	5 días	sáb 15/06/19	mié 19/06/19	194CC	S/379.50
196	01.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE Ø 1/2"	3 días	sáb 15/06/19	lun 17/06/19	195CC	S/804.57
197	01.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA RIEGO	3 días	sáb 15/06/19	lun 17/06/19	196CC	S/54.33
198	01.02	RED DE DESAGUE	18 días	lun 17/06/19	jue 04/07/19		S/5,275.73
199	01.02.01	SALIDA P/DESAGUE DE 4"	5 días	lun 17/06/19	vie 21/06/19	197CC+2 días	S/339.66
200	01.02.02	SALIDA P/DESAGUE DE 2"	5 días	mié 19/06/19	dom 23/06/19	199CC+2 días	S/285.60
201	01.02.03	SALIDA P/VENTILACION DE 2"	5 días	vie 21/06/19	mar 25/06/19	200CC+2 días	S/543.01
202	01.02.04	RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA DESAGUE DE 4"	5 días	dom 23/06/19	jue 27/06/19	201CC+2 días	S/352.21
203	01.02.05	RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA DESAGUE DE 2"	5 días	mar 25/06/19	sáb 29/06/19	202CC+2 días	S/86.20
204	01.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SAP Ø 4" X 45°	5 días	mar 25/06/19	sáb 29/06/19	203CC	S/271.17
205	01.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SAP Ø 2" X 45º	5 días	mar 25/06/19	sáb 29/06/19	204CC	S/90.84
206	01.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SAP Ø 4" x 4"	5 días	mar 25/06/19	sáb 29/06/19	205CC	S/568.80
207	01.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DOBLE PVC SAP Ø 4" x 4"	5 días	mar 25/06/19	sáb 29/06/19	206CC	S/43.35
208	01.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø 4" A 2"	5 días	mar 25/06/19	sáb 29/06/19	207CC	S/148.70
209	01.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø 2" x 2"	5 días	mar 25/06/19	sáb 29/06/19	208CC	S/75.68
210	01.02.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAP DE 4" A 2"	5 días	mar 25/06/19	sáb 29/06/19	209CC	S/11.91
211	01.02.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	5 días	mar 25/06/19	sáb 29/06/19	210CC	S/216.00
212	01.02.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO DE CROMADO 2"	5 días	mar 25/06/19	sáb 29/06/19	211CC	S/224.82
213	01.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	5 días	mar 25/06/19	sáb 29/06/19	212CC	S/236.08
214	01.02.16	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" CON TAPA	5 días	dom 30/06/19	jue 04/07/19	213	S/1,781.70
215	01.03	APARATOS SANITARIOS	13 días	dom 15/09/19	vie 27/09/19		S/15,713.29
216	01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TIPO BABY	3 días	dom 15/09/19	mar 17/09/19	118CC	S/2,531.27
217	01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO	3 días	lun 16/09/19	mié 18/09/19	216CC+1 día	S/3,040.07
218	01.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN LOSA BLANCA P/NIÑOS	3 días	lun 16/09/19	mié 18/09/19	217CC	S/3,282.87
219	01.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN LOSA BLANCA P/ADULTOS	3 días	mar 17/09/19	jue 19/09/19	218CC+1 día	S/579.33
220	01.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA	3 días	mié 18/09/19	vie 20/09/19	219CC+1 día	S/496.88
221	01.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO PARA APOYO DE DISCAPACITADOS	3 días	jue 19/09/19	sáb 21/09/19	220CC+1 día	S/331.88
222	01.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 01 PO	3 días	jue 19/09/19	sáb 21/09/19	221CC	S/321.24
223	01.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCA	3 días	jue 19/09/19	sáb 21/09/19	222CC	S/442.62
224	01.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE LOSA BLANCA	3 días	dom 22/09/19	mar 24/09/19	223	S/41.14
225	01.03.10	SUMIISTRO E INSTALACION DE TOALLERO	2 días	mié 25/09/19	jue 26/09/19	224	S/45.96
226	01.03.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	2 días	jue 26/09/19	vie 27/09/19	225FC-1 día	S/1,291.43
227	01.03.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO DE 1100 LT	2 días	jue 26/09/19	vie 27/09/19	226CC	S/3,308.60
228	01	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EXTERIORES	55 días	sáb 27/07/19	jue 19/09/19		S/119,574.74
229	01.01	TABLEROS ELECTRICOS	9 días	sáb 27/07/19	dom 04/08/19		S/13,864.24
230	01.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL (TG)	3 días	sáb 27/07/19	lun 29/07/19	96CC	S/1,985.04
231	01.01.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (ST)	3 días	dom 28/07/19	mar 30/07/19	230CC+1 día	S/6,222.00
232	01.01.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (TC)	3 días	lun 29/07/19	mié 31/07/19	231CC+1 día	S/1,292.00
233	01.01.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUZON DE CONCRETO	5 días	mié 31/07/19	dom 04/08/19	232CC+2 días	S/4,365.20
234	01.02	INSTALACION DE CONDUCTORES	8 días	lun 05/08/19	lun 12/08/19		S/18,983.38
235	01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH DE 3-1x25 + 16mm2 DESDE MEDIDOR AL TABLERO GENERAL (TG)	6 días	lun 05/08/19	sáb 10/08/19	233	S/2,938.02
236	01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH DE 3x16 mm2+1x10mm2 DESDE TABLERO GENERAL (TG) a ST	6 días	mar 06/08/19	dom	235CC+1 día	S/15,377.84
237	01.02.03	SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRANEO DE CONDUCTOR N2XOH DE 3x06 mm2 PARA C-1 PATIO FORMACION Y CAMPO DEPORTIVO	6 días	mié 07/08/19	lun 12/08/19	236CC+1 día	S/667.52
238	01.03	INSTALACION DE INTERIOR	14 días	vie 09/08/19	jue 22/08/19		S/36,015.58
239	01.03.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO	5 días	vie 09/08/19	mar 13/08/19	237CC+2 días	S/416.64
240	01.03.02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTO	5 días	dom 11/08/19	jue 15/08/19	239CC+2 días	S/294.51
241	01.03.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CUATRO PUNTO	5 días	mar 13/08/19	sáb 17/08/19	240CC+2 días	S/1,822.56
242	01.03.04	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA SEIS PUNTO	5 días	jue 15/08/19	lun 19/08/19	241CC+2 días	S/641.84
243	01.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PANEL LED 40W, ADOSADA AL TECH	3 días	mar 20/08/19	jue 22/08/19	242	S/9,229.90
244	01.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO CIRCULAR LED DE 18W	3 días	mar 20/08/19	jue 22/08/19	243CC	S/1,487.22
245	01.03.07	SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES DE PARED	3 días	mar 20/08/19	jue 22/08/19	244CC	S/2,177.45
246	01.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES DE PARED	3 días	mar 20/08/19	jue 22/08/19	245CC	S/6,200.46
247	01.03.09	SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE h=0.40m	3 días	mar 20/08/19	jue 22/08/19	246CC	S/12,266.57
248	01.03.10	SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE h=0.40m ESPECIAL	3 días	mar 20/08/19	jue 22/08/19	247CC	S/1,478.43
249	01.04	ILUMINACION EXTERIOR PATIO Y LOSA DEPORTIVA	7 días	vie 23/08/19	jue 29/08/19		S/12,884.26
250	01.04.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO DE PUESTA A TIERRA, INCL. EXCAVACION	3 días	vie 23/08/19	dom 25/08/19	248	S/4,140.50
251	01.04.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARTEFACTO BRAQUETE LED (FAROLA)	3 días	vie 23/08/19	dom 25/08/19	250CC	S/695.48
252	01.04.03	SUMINISTRO E IZAJE DE POSTES DE C.A.C. DE 9M	5 días	dom 25/08/19	jue 29/08/19	251CC+2 días	S/2,126.88
253	01.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 200 WATTS INCORPOI	4 días	lun 26/08/19	jue 29/08/19	252CC+1 día	S/5,385.60
254	01.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALMES PARA CONEX REFLECTOR	4 días	lun 26/08/19	jue 29/08/19	253CC	S/535.80
255	01.05	SISTEMA DE ILUMINACION CON PANEL SOLAR	8 días	mié 28/08/19	mié 04/09/19		S/14,567.55
256	01.05.01	SISTEMA DE PANEL SOLAR, INCL. PANEL BATERIA, CONTROLADOR, CABLEAD	8 días	mié 28/08/19	mié 04/09/19	254CC+2 días	S/10,953.95
257	01.05.02	PASTORAL DE TUBO DE F° G° de 2" INCL. DOBLE ABRAZADERA, INCL. 02 DALIDAS DE LUMINARIAS	8 días	mié 28/08/19	mié 04/09/19	256CC	S/575.00
258	01.05.03	CABLE NLT DE 2x4 mm2	8 días	mié 28/08/19	mié 04/09/19	257CC	S/144.00
259	01.05.04	CONECTOR TIPO CUÑA DE 06/2.5mm2	8 días	mié 28/08/19	mié 04/09/19	258CC	S/69.60
260	01.05.05	ARTEFACTO LED DE 50W	8 días	mié 28/08/19	mié 04/09/19	259CC	S/2,150.00
261	01.05.06	TUBO F°G° DE Ø 4" x 5m	8 días	mié 28/08/19	mié 04/09/19	260CC	S/675.00
262	01.06	OTROS	3 días	mié 04/09/19	vie 06/09/19		S/5,365.02
263	01.06.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS	3 días	mié 04/09/19	vie 06/09/19	261FC-1 día	S/3,264.22
264	01.06.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALTAVOZ EXTERIOR PATIO	3 días	mié 04/09/19	vie 06/09/19	263CC	S/1,537.90
265	01.06.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIMBRE	3 días	mié 04/09/19	vie 06/09/19	264CC	S/562.90
266	01.07	SUMINISTRO Y PRUEBAS DE RED ELECTRICA	6 días	sáb 07/09/19	jue 12/09/19		S/3,150.98
267	01.07.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA TRIFASICA	3 días	sáb 07/09/19	lun 09/09/19	265	S/2,520.11
268	01.07.02	PRUEBAS DE RED ELECTRICAS	3 días	mar 10/09/19	jue 12/09/19	267	S/630.87
269	01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DATA	4 días	mar 10/09/19	vie 13/09/19		S/12,567.83
270	01.08.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DATA INTERNET	4 días	mar 10/09/19	vie 13/09/19	268CC	S/12,567.83
271	01.09	TRANSPORTE DE MATERIALES	5 días	mar 10/09/19	sáb 14/09/19		S/2,000.00
272	01.09.01	TRANSPORTE DE MATERIALES, EXPED. REPLANTEO	5 días	mar 10/09/19	sáb 14/09/19	270CC	S/2,000.00
273	01.10	DESMONTAJE DE POSTES	5 días	dom 15/09/19	jue 19/09/19		S/175.90
274	01.10.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE DE CONCRETO	5 días	dom 15/09/19	jue 19/09/19	272	S/175.90
275		EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	15 días	mié 11/09/19	mié 25/09/19	131CC	S/185,019.63
276		FIN DEL PROYECTO	0 días	vie 27/09/19	vie 27/09/19	226;274;227;2	S/0.00

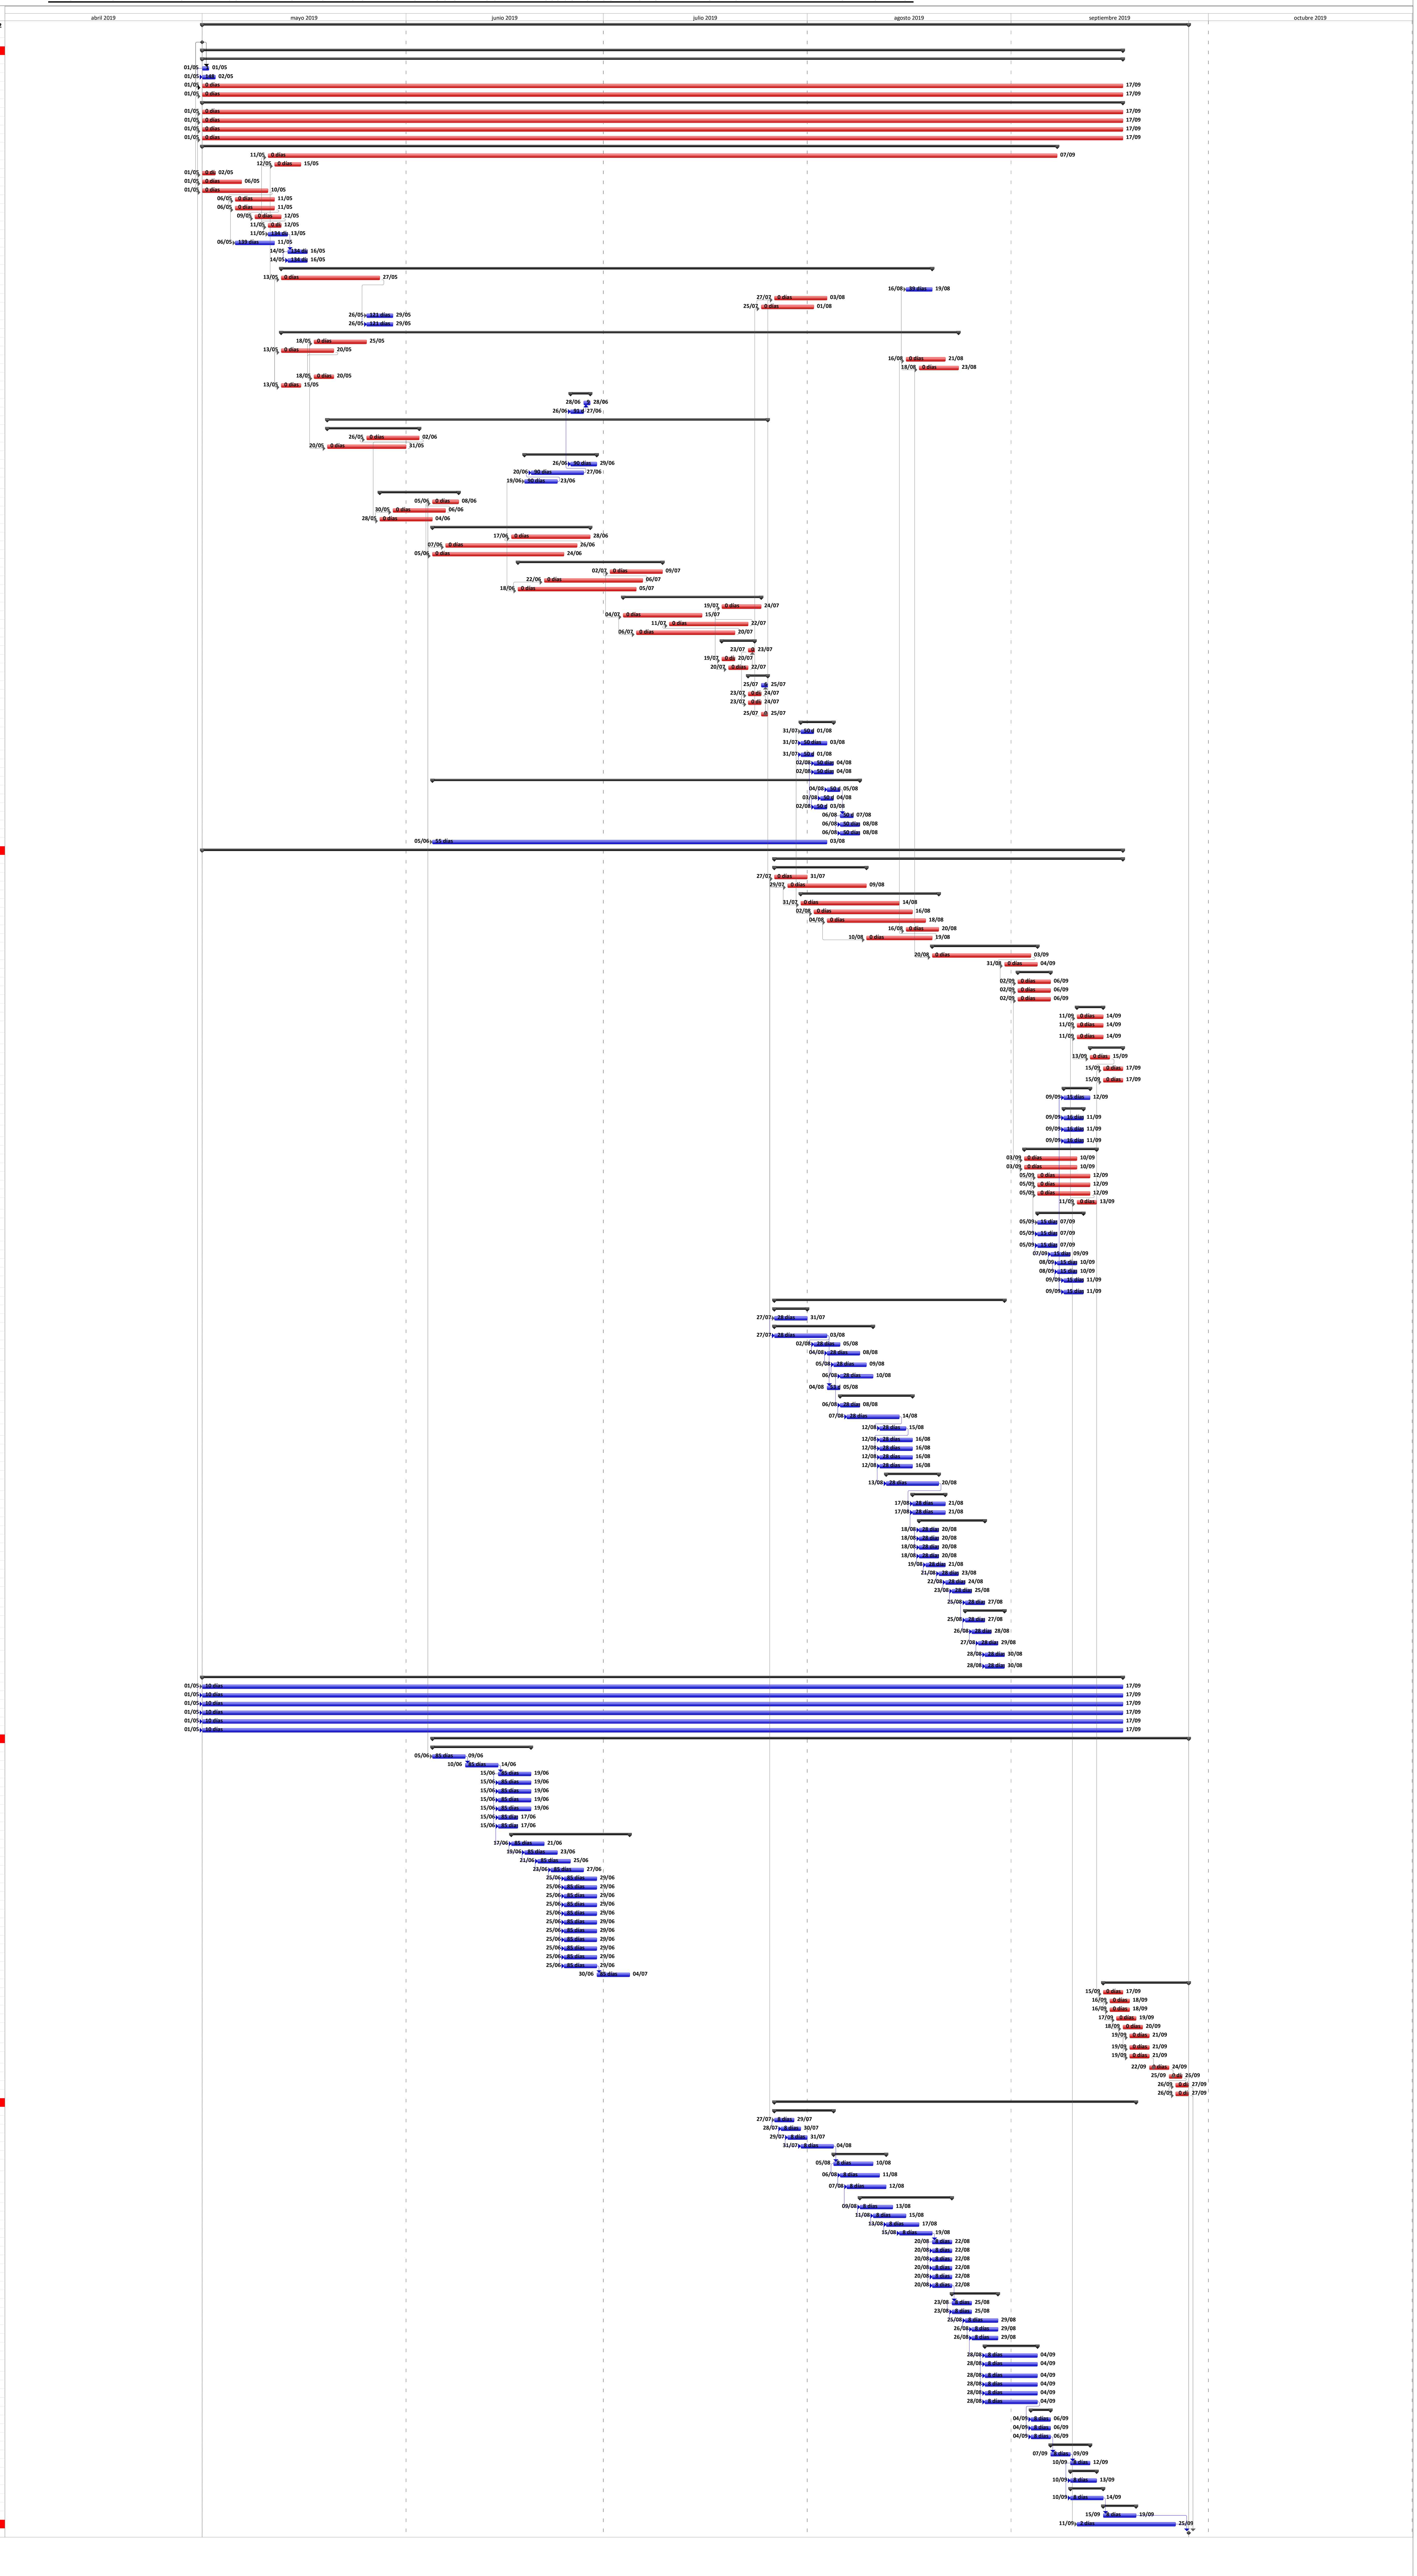

Proyecto: DIAGRAMA GANTT GUI

Tarea	División	Resumen	Agrupar por síntesis	Tarea crítica resumida	Progreso resumido	Hito externo	Hito inactivo	Tarea manual	Informe de resumen manual	Sólo el comienzo	Fecha límite	Progreso de tarea crítica	
Progreso de tarea	Hito	Resumen del proyecto	Tarea resumida	Hito resumido	Tareas externas	Tarea inactiva	Resumen inactivo	Sólo duración	Resumen manual	Sólo fin	Tarea crítica		
