
002852

Capítulo 11

DIAGRAMA GANTT

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"	730 días	mié 1/04/26	jue 30/03/28	
2		INICIO	0 días	mié 1/04/26	mié 1/04/26	
3	01	PLAN DE CONTIGENCIA	78 días	mié 1/04/26	mié 17/06/26	
4	01 01	INFRAESTRUCTURA	78 días	mié 1/04/26	mié 17/06/26	
5	01 01 01	TRABAJOS PRELIMINARES	11 días	mié 1/04/26	sáb 11/04/26	
6	01 01 01 01	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO	2 días	mié 1/04/26	jue 2/04/26	2CC
7	01 01 01 02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	3 días	mié 1/04/26	vie 3/04/26	6CC
8	01 01 01 03	LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIA	3 días	mié 1/04/26	vie 3/04/26	7CC
9	01 01 01 04	CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE CALAMINA GALVANIZADA h=3 00m	8 días	sáb 4/04/26	sáb 11/04/26	8
10	01 01 02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	18 días	mié 1/04/26	sáb 18/04/26	
11	01 01 02 01	PERFILADO DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	2 días	mié 1/04/26	jue 2/04/26	7CC
12	01 01 02 02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(HORMIGON) CON MAQUINARIA SOBRE AREA DE TRABAJO	4 días	mié 1/04/26	sáb 4/04/26	11CC
13	01 01 02 03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO - MANUAL	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26	12CC+2 días
14	01 01 02 04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA UÑAS Y DADOS. CIMIENTOS CORRIDOS	9 días	sáb 4/04/26	dom 12/04/26	13
15	01.01.02 05	PERFILADO DE TERRENO NATURAL MANUAL	3 días	vie 10/04/26	dom 12/04/26	14FC-3 días
16	01 01 02 06	COLOCACIÓN, NIVELACIÓN DE CAPA DE OVER DE 6" A 8" MANUAL E=0.30M	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	15
17	01 01.02.07	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO E= 0.20 M CON EQUIPO LIVIANO	1 día	mar 14/04/26	mar 14/04/26	16
18	01.01.02.08	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO E= 0.20 M CON MAQUINARIA	3 días	mié 15/04/26	vie 17/04/26	17
19	01.01.02.09	COLOCACION, COMPACTACIÓN Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO E= 0.10 M CON MAQUINARIA	2 días	jue 16/04/26	vie 17/04/26	18CC+1 día
20	01.01.02.10	COLOCACION DE TIERRA DE CHACRA EN AREAS VERDES E=0.20M	1 día	sáb 18/04/26	sáb 18/04/26	19
21	01 01 02 11	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	14
22	01 01 03	CONCRETO SIMPLE	62 días	vie 17/04/26	mié 17/06/26	
23	01.01.03.01	DADOS DE CONCRETO DE F´C= 175 Kg/cm2 0.40X0.40X0.80M - CEMENTO TIPO V	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	26CC
24	01.01.03.02	DADOS DE CONCRETO DE F´C=175Kg/cm2 0.60X0.60X0.80M - CEMENTO TIPO V	2 días	vie 17/04/26	sáb 18/04/26	23CC
25	01.01.03 03	UÑA EN BORDE DE PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO F´C= 175 Kg/cm2 . DE 0.20X0.10M	2 días	vie 17/04/26	sáb 18/04/26	24CC
26	01 01.03 04	LOSA DE CONCRETO e= 0.10 m F´C= 175 Kg/cm2, ACABADO FROTACHADO INC. BRUÑAS	8 días	vie 17/04/26	vie 24/04/26	19CC+1 día
27	01 01 03 05	SOLADO PROP. 1.8 e= 0.10 m	1 día	sáb 25/04/26	sáb 25/04/26	26
28	01 01 03 06	CIMIENTO CORRIDO PROP.1 10 C H +30% PG. CEMENTO TIPO V	1 día	dom 26/04/26	dom 26/04/26	27
29	01 01 04	CONCRETO ARMADO	7 días	lun 27/04/26	dom 3/05/26	
30	01 01 04 01	SOBRECIMIENTO ARMADO	4 días	lun 27/04/26	jue 30/04/26	
31	01 01 04 01 01	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	3 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26	33CC+1 día
32	01 01 04 01 02	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	3 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	28
33	01 01.04 01 03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO Y CIMIENTO CORRIDO	4 días	lun 27/04/26	jue 30/04/26	32CC
34	01 01 04 02	COLUMNAS	3 días	jue 30/04/26	sáb 2/05/26	
35	01 01 04 02 01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PARA COLUMNAS	1 día	jue 30/04/26	jue 30/04/26	37CC
36	01 01 04 02 02	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA COLUMNAS	2 días	jue 30/04/26	vie 1/05/26	31CC+2 días
37	01 01 04 02 03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	3 días	jue 30/04/26	sáb 2/05/26	36CC
38	01 01 04 03	VIGAS	3 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	
39	01 01 04 03 01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA VIGAS	1 día	sáb 2/05/26	sáb 2/05/26	40
40	01 01 04 03 02	ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA VIGAS	1 día	vie 1/05/26	vie 1/05/26	41CC
41	01 01 04 03 03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	3 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	35
42	01 01.05	CARPINTERIA METALICA	24 días	dom 19/04/26	mar 12/05/26	
43	01 01.05 01	COLOCACION DE TUBO DE SOPORTE CUADRADO DE 4"X2.50MM	8 días	dom 19/04/26	dom 26/04/26	33CC+2 días
44	01 01 05 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TIPO 01- LONG 9.53M	20 días	dom 19/04/26	vie 8/05/26	43FC-8 días
45	01 01 05 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TIPO 02- LONG 15.44M	4 días	dom 19/04/26	mié 22/04/26	44CC
46	01 01 05 04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TIPO 03- LONG 18.45M	12 días	dom 19/04/26	jue 30/04/26	45CC
47	01 01.05 05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TIPO 04- LONG 18.45M	4 días	dom 19/04/26	mié 22/04/26	46CC
48	01 01.05 06	COLOCACION CORREAS METALICAS DE TUBO RECTANGULAR DE 3"X2"X1.80MM	16 días	jue 23/04/26	vie 8/05/26	47
49	01 01.05 07	COLOCACIÓN DE COBERTURA DE PLANCHA DE FIBRA VEGETAL E=3MM COLOR ROJO	20 días	jue 23/04/26	mar 12/05/26	48CC
50	01.01.05.08	COLOCACION DE SOPORTE DE TUBO CIRCULAR DE Ø 6" X3.00MM H=6.00M	5 días	dom 19/04/26	jue 23/04/26	43CC
51	01 01.05 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA TRIANGULAR SEGUN DISEÑO	11 días	vie 24/04/26	lun 4/05/26	50
52	01 01 05 10	MALLA RACHEL DE 90% DE SOMBRA - INCLUYE ACCESORIOS Y ALAMBRE TENSOR	4 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26	51CC+5 días
53	01 01 05 11	COLOCACIÓN DE PORTON METALICO ACANALADO CON PLANCHA DE E= 1/20" DE 3.00X3.50M	3 días	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	55CC
54	01 01 06	MUROS Y TABIQUES, ZOCALOS	22 días	sáb 25/04/26	sáb 16/05/26	
55	01.01.06.01	SUMINISTRO Y COLOCAC. DE MURO DE SISTEMA DRYWALL CON PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM EXTERIOR Y 6MM INTERIOR	12 días	sáb 25/04/26	mié 6/05/26	49CC+2 días
56	01 01 06 02	COLOCACION DE ZOCALOS CON PANEL DE PARED PVC E=3MM TIPO MARMOL	17 días	jue 30/04/26	sáb 16/05/26	55CC+5 días
57	01 01 07	REVOQUES Y ENLUCIDOS	3 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26	
58	01 01 07 01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS C:A 1:4 E=1 5CM	3 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26	41
59	01 01 08	CARPINTERIA DE MADERA	14 días	vie 22/05/26	jue 4/06/26	
60	01 01 08 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CONTRAPLACADAS	14 días	vie 22/05/26	jue 4/06/26	70CC+15 días
61	01 01 08 02	COLOCACION DE LISTONES DE MADERA DE 2"X2" EN VANOS	11 días	vie 22/05/26	lun 1/06/26	60CC
62	01 01 09	CERRAJERIA	5 días	vie 22/05/26	mar 26/05/26	
63	01 01 09 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA TIPO TRES GOLPES	4 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	60CC
64	01 01 09 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA TIPO PERILLA DE ACERO INOXIDABLE	2 días	vie 22/05/26	sáb 23/05/26	63CC
65	01 01 09 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4"	5 días	vie 22/05/26	mar 26/05/26	64CC
66	01 01 10	CARPINTERIA DE ALUMINIO	12 días	mar 2/06/26	sáb 13/06/26	
67	01.01.10.01	VENTANA SISTEMA DIRECTO CON VIDRIO CRUDO INCOLORO+ LAMINA DE SEGURIDAD 6MM	12 días	mar 2/06/26	sáb 13/06/26	61
68	01 01.11	OTROS	60 días	dom 19/04/26	mié 17/06/26	
69	01 01.11 01	PINTURA LÁTEX MATE EN MUROS DE CERCO PERIMETRICO - 2 MANOS	4 días	jue 7/05/26	dom 10/05/26	70CC
70	01 01.11 02	PINTURA LÁTEX MATE EN MUROS DE FIBROCEMENTO EXTERIOR E INTERIOR - 2 MANOS	25 días	jue 7/05/26	dom 31/05/26	55
71	01 01.11 03	PINTADO DE BORDE DE SARDINEL CON PINTURA AMARILLA DE TRAFICO	5 días	dom 17/05/26	jue 21/05/26	70CC+10 días
72	01 01 11 04	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN E= 6MM	16 días	lun 27/04/26	mar 12/05/26	75
73	01 01.11 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LADRILLO PASTELERO DE 24X24X3CM EN CERCO PERIMETRICO	9 días	vie 1/05/26	sáb 9/05/26	35
74	01.01.11.06	JUNTA ASFALTICA DE E=1" EN CERCO PERIMETRICO	5 días	mié 6/05/26	dom 10/05/26	73CC+5 días
75	01 01.11 07	CURADO DE LOSA DE CONCRETO	2 días	sáb 25/04/26	dom 26/04/26	26
76	01.01.11 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL	2 días	dom 19/04/26	lun 20/04/26	20
77	01 01.11 09	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	3 días	lun 15/06/26	mié 17/06/26	158
78	01 02	INSTALACIONES SANITARIAS	57 días	dom 19/04/26	dom 14/06/26	
79	01 02 01	APARATOS SANITARIO Y ACCESORIOS	11 días	sáb 9/05/26	mar 19/05/26	
80	01 02 01 01	SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (INODORO)	1 día	sáb 9/05/26	sáb 9/05/26	70CC+2 días
81	01 02 01 02	SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (URINARIOS)	1 día	sáb 9/05/26	sáb 9/05/26	80CC
82	01 02 01 03	SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (LAVAT. CON PEDESTAL)	1 día	sáb 9/05/26	sáb 9/05/26	81CC
83	01 02 01 04	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	11 días	sáb 9/05/26	mar 19/05/26	82CC
84	01 02 02	SISTEMA DE AGUA FRIA	20 días	sáb 9/05/26	jue 28/05/26	
85	01.02.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA	4 días	sáb 9/05/26	mar 12/05/26	
86	01 02 02 01 01	SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2"	4 días	sáb 9/05/26	mar 12/05/26	83CC
87	01 02 02 01 02	SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1"	4 días	sáb 9/05/26	mar 12/05/26	86CC
88	01 02 02 02	REDES DE DISTRIBUCION	7 días	sáb 9/05/26	vie 15/05/26	
89	01 02 02 02 01	TUBERIA PVC CLASE 10 CR PIAGUA FRIA Ø=1/2"	7 días	sáb 9/05/26	vie 15/05/26	87CC
90	01 02 02 03	REDES DE ALIMENTACION	5 días	sáb 9/05/26	mié 13/05/26	
91	01 02 02 03 01	TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D= 1/2"	5 días	sáb 9/05/26	mié 13/05/26	89CC
92	01 02 02 03 02	TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=1"	3 días	sáb 9/05/26	lun 11/05/26	91CC
93	01 02 02 04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA	6 días	mar 12/05/26	dom 17/05/26	
94	01 02 02 04 01	ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION	3 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	
95	01 02 02 04 01 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1/2"	3 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	92
96	01 02 02 04 01 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC AGUA C-10 1/2"	3 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	95CC
97	01 02 02 04 01 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE BRONCE 1/2"	3 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	96CC
98	01 02 02 04 01 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL PVC 1/2"	3 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	97CC
99	01 02 02 04 02	ACCESORIOS EN REDES DE ALIMENTACION	3 días	vie 15/05/26	dom 17/05/26	
100	01 02 02 04 02 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1/2"	3 días	vie 15/05/26	dom 17/05/26	98
101	01 02 02 04 02 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1"	3 días	vie 15/05/26	dom 17/05/26	100CC
102	01 02 02 04 02 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC AGUA C-10 1/2"	3 días	vie 15/05/26	dom 17/05/26	101CC
103	01 02 02 04 02 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC AGUA C-10 1"	3 días	vie 15/05/26	dom 17/05/26	102CC
104	01 02 02 04 02 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC AGUA C-10 1" A 1/2"	3 días	vie 15/05/26	dom 17/05/26	103CC
105	01 02 02 04 02 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 1"	3 días	vie 15/05/26	dom 17/05/26	104CC
106	01 02 02 05	VALVULAS	3 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	
107	01 02 03 05 01	VÁLVULA COMPUERTA PESADA DE PVC DE 1/2"	3 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	104
108	01 02 02 05 02	VÁLVULA COMPUERTA PESADA DE PVC DE 1"	3 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	107CC
109	01 02 02 05 03	VALVULA CHECK HORIZONTAL DE PVC DE 1"	3 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	108CC
110	01 02 02 06	ALMACENAMIENTO	4 días	jue 21/05/26	dom 24/05/26	
111	01 02 02 06 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE 2500 LTS INCLUYE ACCESORIOS	4 días	jue 21/05/26	dom 24/05/26	109
112	01 02 02 06 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO 50 LTS INCLUYE ACCESORIOS	4 días	jue 21/05/26	dom 24/05/26	111CC
113	01 02 02 07	OTROS	4 días	lun 25/05/26	jue 28/05/26	
114	01.02.02 07 01	DERECHO DE EMPALME DE PUNTO DE AGUA	4 días	lun 25/05/26	jue 28/05/26	112
115	01 02 03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	45 días	dom 19/04/26	mar 2/06/26	
116	01 02 03 01	CUNETAS	18 días	dom 19/04/26	mié 6/05/26	
117	01 02 03 01 01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	1 día	dom 19/04/26	dom 19/04/26	18CC+4 días
118	01 02 03 01 02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETAS	7 días	lun 20/04/26	dom 26/04/26	117
119	01 02 03 01 03	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON) E= 0 15 M	1 día	jue 23/04/26	jue 23/04/26	118CC+3 días
120	01 02 03 01 04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	4 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	119
121	01 02 03 01 05	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2- PARA CUNETAS INC. ACABADO SEMIPULIDO	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	120
122	01 02 03 01 06	CURADO DE ESTRUCTURAS	1 día	mié 29/04/26	mié 29/04/26	121
123	01 02 03 01 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CUNETA, CONF. DE PERFIL DE FIERRO	3 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26	122FC+4 días
124	01 02 03 02	MONTANTE DE TECHOS	13 días	lun 18/05/26	sáb 30/05/26	
125	01 02 03 02 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16 (SEGUN DISEÑO)	10 días	lun 18/05/26	mié 27/05/26	102
126	01 02 03 02 02	RED COLECTORA (MONTANTE) DE DRENAJE PLUVIAL Ø 3"	3 días	jue 28/05/26	sáb 30/05/26	125
127	01 02 03 03	ACCESORIOS EN MONTANTES	3 días	dom 31/05/26	mar 2/06/26	
128	01 02 03 03 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° Ø 3"	3 días	dom 31/05/26	mar 2/06/26	126
129	01 02 03 03 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° Ø 3"	3 días	dom 31/05/26	mar 2/06/26	128CC
130	01.02 04	DESAGUE Y VENTILACION	15 días	dom 31/05/26	dom 14/06/26	
131	01 02 04 01	SALIDA DE DESAGUE DE PVC 4"	5 días	dom 31/05/26	jue 4/06/26	129CC
132	01 02 04 02	SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2"	4 días	dom 31/05/26	mié 3/06/26	131CC
133	01 02 04 03	REDES DE DERIVACION	3 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26	
134	01 02 04 03 01	RED DE DERIVACIÓN DE DESAGUE Ø 4"	3 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26	132
135	01 02 04 03 02	RED DE DERIVACIÓN DE DESAGUE Ø 2"	3 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26	134CC

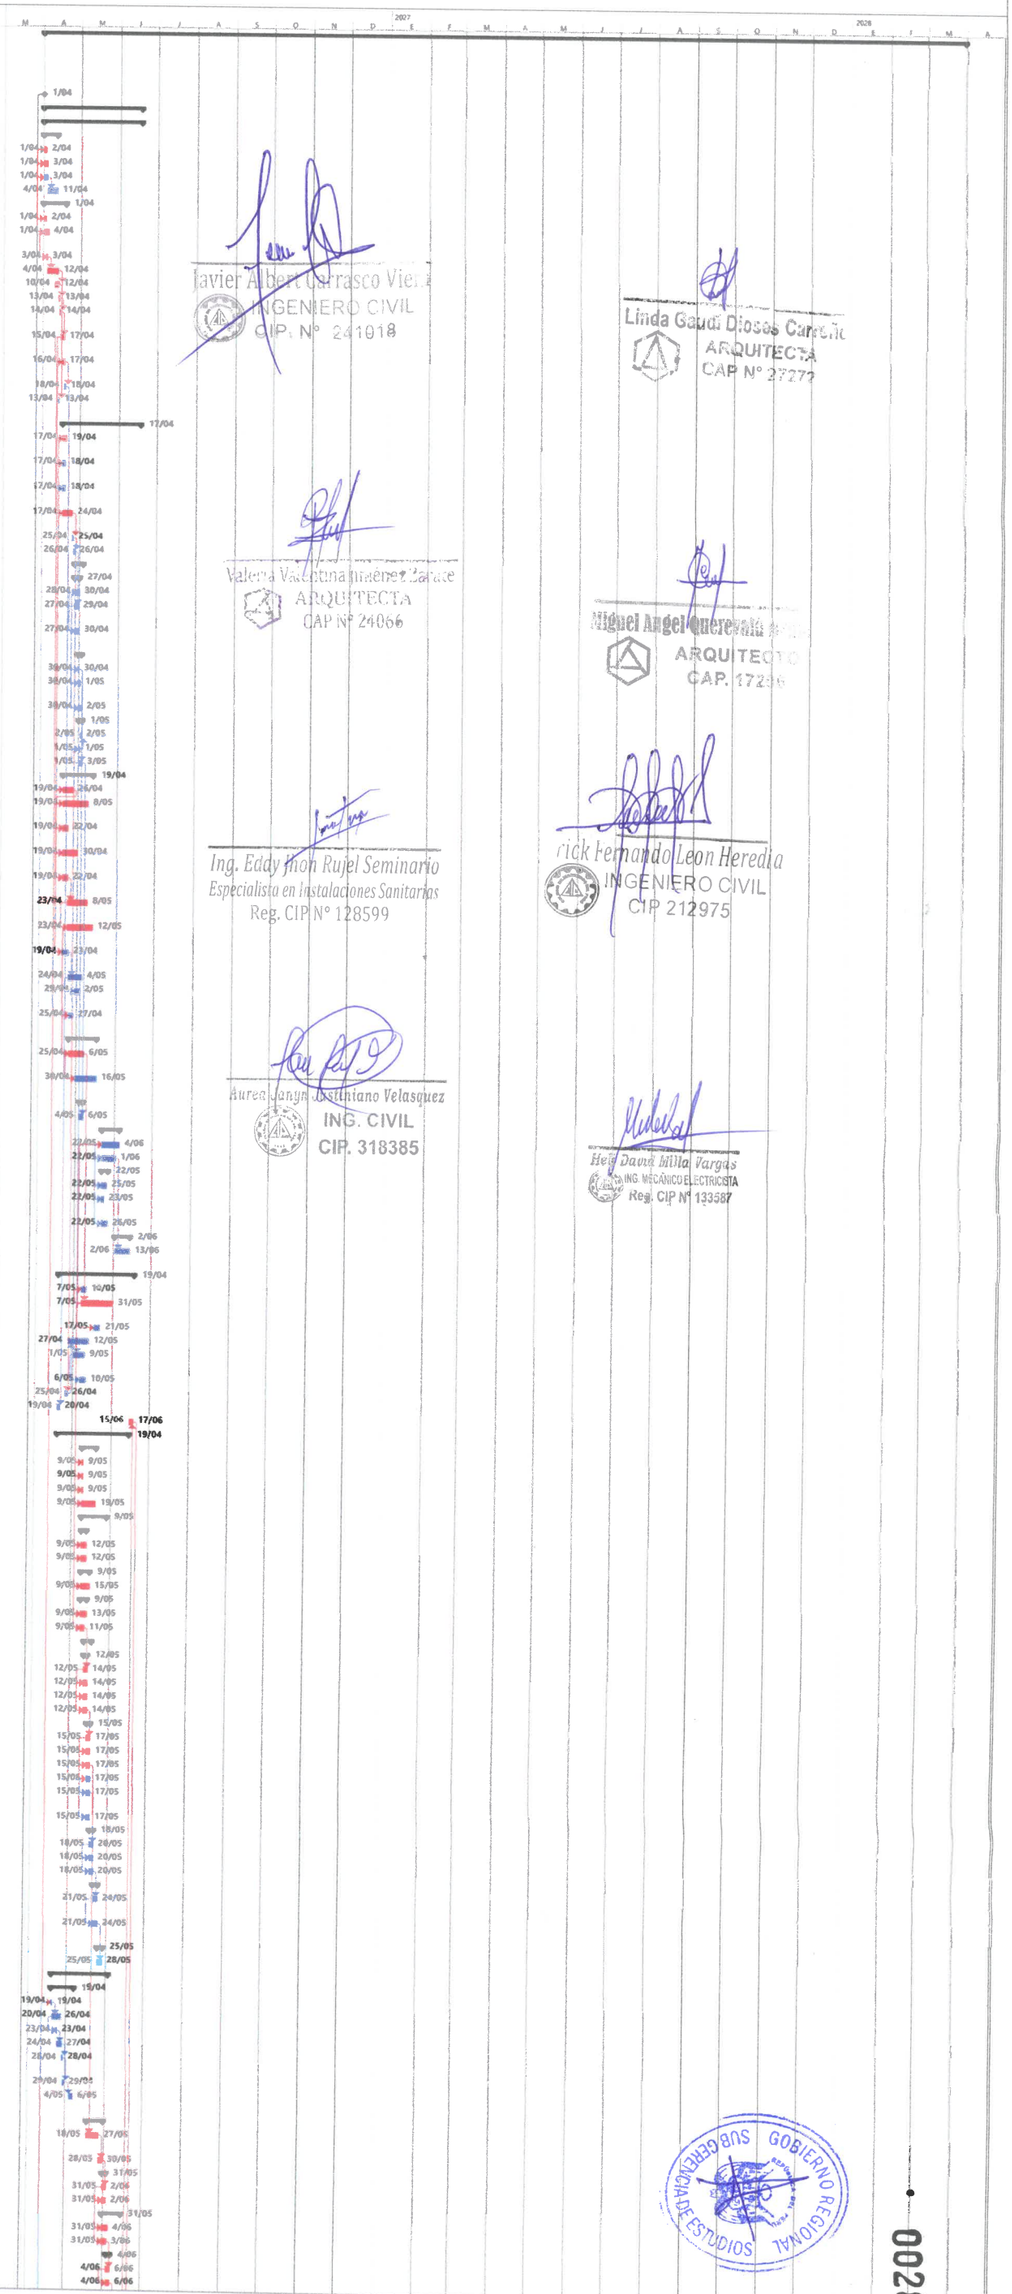

Javier Albert Carrasco Vieira
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 241018

Linda Gaudi Dioses Carreño
ARQUITECTA
CAP N° 27272

Valeria Valentina Jimenez Zarate
ARQUITECTA
CAP N° 24066

Miguel Angel Querevalu
ARQUITECTO
CAP. 17236

Ing. Eddy Jhon Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 128599

rick Fernando Leon Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Aurea Janyn Justiniano Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 318385

Heli David Villa Vargas
ING. MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 133587

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA SOLUCIONES


002851

Proyecto: Proyecto2
Fecha: jue 8/01/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Agrupar por sintesis · Tarea resumida · Tarea critica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Fecha límite · Tarea crítica · Progreso

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin	Predecesoras
136	01.02.04.04	REDES COLECTORAS	3 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	
137	01.02.04.04.01	RED COLECTORA DE DESAGUE Ø 6"	3 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	135
138	01.02.04.04.02	RED COLECTORA DE DESAGUE Ø 4"	3 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	137CC
139	01.02.04.04.03	RED DE DERIVACIÓN DE DESAGUE Ø 2"	3 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	138CC
140	01.02.04.05	ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE	2 días	mié 10/06/26	jue 11/06/26	
141	01.02.04.05.01	SUMINISTRO E INTALACION DE CODO DE 90° PVC SAP Ø DE 4"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	139
142	01.02.04.05.02	SUMINISTRO E INTALACION DE CODO DE 90° PVC SAP Ø DE 2"	2 días	mié 10/06/26	jue 11/06/26	141CC
143	01.02.04.05.03	SUMINISTRO E INTALACION DE CODO DE 45° PVC SAP Ø DE 2"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	142CC
144	01.02.04.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC SAP Ø DE 4"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	143CC
145	01.02.04.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP Ø DE 2"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	144CC
146	01.02.04.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA PVC SAP Ø DE 4" A 2"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	145CC
147	01.02.04.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø DE 4"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	146CC
148	01.02.04.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø DE 2"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	147CC
149	01.02.04.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø DE 4" A 2"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	148CC
150	01.02.04.05.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC SAP Ø DE 4" A 2"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	149CC
151	01.02.04.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAP Ø DE 2"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	150CC
152	01.02.04.05.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BRONCE Ø 4"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	151CC
153	01.02.04.05.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON TRAMPA P. Ø DE 2"	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	152CC
154	01.02.04.06	CAMARAS DE INSPECCION	2 días	jue 11/06/26	vie 12/06/26	
155	01.02.04.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 12" x 24"	2 días	jue 11/06/26	vie 12/06/26	153
156	01.02.04.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 18" x 24"	2 días	jue 11/06/26	vie 12/06/26	155CC
157	01.02.04.07	OTROS	2 días	sáb 13/06/26	dom 14/06/26	
158	01.02.04.07.01	DERECHO DE EMPALME DE PUNTO DE DESAGUE	2 días	sáb 13/06/26	dom 14/06/26	156
159	01.03	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EXTERIORES	22 días	vie 17/04/26	vie 8/05/26	
160	01.03.01	TABLEROS ELECTRICOS	6 días	vie 17/04/26	mié 22/04/26	
161	01.03.01.01	ACOMETIDA DE POSTE HACIA MEDIDOR	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	117CC-2 días
162	01.03.01.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL (TG)	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	161CC
163	01.03.01.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD1 (ADMINISTRAT.)	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	162CC
164	01.03.01.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD2	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	163CC
165	01.03.01.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD3	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	164CC
166	01.03.01.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD4	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	165CC
167	01.03.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-5	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	166CC
168	01.03.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-6	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	167CC
169	01.03.01.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-7	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	168CC
170	01.03.01.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-8	4 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26	169CC
171	01.03.01.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - T.E.S	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	170CC
172	01.03.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - AIP	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	171CC
173	01.03.01.13	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO DE PUESTA A TIERRA, INCL. EXCAVACION	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	172
174	01.03.02	CONDUCTORES ALIMENTADORES	12 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26	
175	01.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH DE 2-1x10 awg DESDE medidor a TG	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	172CC
176	01.03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N2XOH DE 2x06 mm2 (TG - TD)	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	175
177	01.03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N2XOH DE 2x06 mm2 (TG-AIP)	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	176CC
178	01.03.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N2XOH DE 2x04 mm2 (TG-TEB)	3 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	177
179	01.03.02.05	BUZON DE CONCRETO ARMADO INCLUYE TAPA	3 días	dom 26/04/26	mar 28/04/26	178
180	01.03.03	INSTALACIONES DE INTERIORES	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	
181	01.03.03.01	SALIDA DE TOMACORRIENTE H=0.40M	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	179CC+2 días
182	01.03.03.02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	181CC
183	01.03.03.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTOS	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	182CC
184	01.03.03.04	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CUATRO PUNTOS	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	183CC
185	01.03.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 24W	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	184CC
186	01.03.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18W	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	185CC
187	01.03.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAQUETE LED DE 30W	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	186CC
188	01.03.03.08	SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	187CC
189	01.03.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES DE PARED	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	188CC
190	01.03.03.10	SALIDA DE CENTRO DE LUZ CONMUTACION PASILLOS	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	189CC
191	01.03.03.11	SALIDA DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	190CC
192	01.03.03.12	SALIDA DE TIMBRE Y PULSADOR	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	191CC
193	01.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DATA	3 días	sáb 2/05/26	lun 4/05/26	
194	01.03.04.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DATA INTERNET (INCLUYE CONTRATO)	3 días	sáb 2/05/26	lun 4/05/26	192
195	01.03.05	ILUMINACION PATIO Y EXTERIOR	4 días	mar 5/05/26	vie 8/05/26	
196	01.03.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTROBOMBA 1.5 HP	2 días	mar 5/05/26	mié 6/05/26	194
197	01.03.05.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PASO	2 días	mar 5/05/26	mié 6/05/26	196CC
198	01.03.05.03	PRUEBAS ELECTRICAS	2 días	jue 7/05/26	vie 8/05/26	197
199	02	ESTRUCTURAS	730 días	mié 1/04/26	jue 30/03/28	
200	02.01	OBRAS PROVISIONALES	720 días	mié 1/04/26	lun 20/03/28	
201	02.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA DE 2.40X3.60M	3 días	mié 1/04/26	vie 3/04/26	2CC
202	02.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	1 día	mié 1/04/26	mié 1/04/26	201CC
203	02.01.03	CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE CALAMINA GALVANIZADA H=2.20M	8 días	jue 2/04/26	jue 9/04/26	202
204	02.01.04	ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS PARA TRABAJADORES	720 días	mié 1/04/26	lun 20/03/28	201CC
205	02.02	TRABAJOS PRELIMINARES	729 días	mié 1/04/26	mié 29/03/28	
206	02.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	300 días	jue 18/06/26	mar 13/04/27	77
207	02.02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	120 días	jue 18/06/26	jue 15/10/26	206CC
208	02.02.03	DEMOLICION Y DESMONTAJE EN EDIFICACION EXISTENTE	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	
209	02.02.03.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	207CC+2 días
210	02.02.03.02	DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	209CC
211	02.02.03.03	DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	210CC
212	02.02.03.04	DESMONTAJE DE VENTANAS	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	211CC
213	02.02.03.05	DESMONTAJE DE COBERTURA DE FIBROCEMENTO	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	212CC
214	02.02.03.06	DESMONTAJE DE TIJERALES	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	213CC
215	02.02.03.07	DESMONTAJE DE TRIPLAY	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	214CC
216	02.02.03.08	DESMONTAJE DE LISTONES DE MADERA	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	215CC
217	02.02.03.09	DESMONTAJE DE JUEGO DEPORTIVO (FÚTBOL, BÁSQUET)	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	216CC
218	02.02.03.10	DESMONTAJE DE ASTA	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	217CC
219	02.02.03.11	DESMONTAJE DE POSTE	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	218CC
220	02.02.03.12	DESMONTAJE DE PORTON METALICO	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	219CC
221	02.02.03.13	DESMONTAJE DE COBERTURA DE MALLA RACHEL	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	220CC
222	02.02.03.14	DESMONTAJE SERVICIO SANITARIO	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	221CC
223	02.02.03.15	DESMONTAJE MANUAL DE AULA PREFABRICADA DE MATERIAL TERMICO INC PUERTAS Y VENTANAS	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	222CC
224	02.02.03.16	DEMOLICION DE PLATAFORMA DE CONCRETO	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	223CC
225	02.02.03.17	DEMOLICION DE VEREDA	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	224CC
226	02.02.03.18	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	225CC
227	02.02.03.19	DEMOLICION DE MUROS	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	226CC
228	02.02.03.20	DEMOLICION DE RAMPA	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	227CC
229	02.02.03.21	DEMOLICION DE CUNETA DE DRENAJE	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	228CC
230	02.02.03.22	DEMOLICION DE COLUMNAS	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	229CC
231	02.02.03.23	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	230CC
232	02.02.03.24	DEMOLICION CIMIENTO CORRIDO	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	231CC
233	02.02.03.25	DEMOLICION LOSA ALIGERADA	30 días	sáb 20/06/26	dom 19/07/26	232CC
234	02.02.04	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	729 días	mié 1/04/26	mié 29/03/28	
235	02.02.04.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	729 días	mié 1/04/26	mié 29/03/28	204CC
236	02.02.05	SEGURIDAD EN OBRA	729 días	mié 1/04/26	mié 29/03/28	
237	02.02.05.01	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	729 días	mié 1/04/26	mié 29/03/28	235CC
238	02.02.05.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	729 días	mié 1/04/26	mié 29/03/28	237CC
239	02.02.05.03	SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA	729 días	mié 1/04/26	mié 29/03/28	238CC
240	02.02.05.04	RECURSO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA OBRA	729 días	mié 1/04/26	mié 29/03/28	239CC
241	02.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	157 días	lun 20/07/26	mié 23/12/26	
242	02.03.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL PARA CIMENTACION. PISOS. ETC	45 días	lun 20/07/26	mié 2/09/26	233
243	02.03.02	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE TERRENO NATURAL PARA CIMENTACION. PISOS. ETC	55 días	vie 14/08/26	mié 7/10/26	242FC-20 días
244	02.03.03	PERFILADO DE TERRENO NATURAL MANUAL	32 días	jue 30/07/26	dom 30/08/26	242CC+10 días
245	02.03.04	PERFILADO DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	10 días	lun 28/09/26	mié 7/10/26	243FC-10 días
246	02.03.05	COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE HORMIGON - MANUAL	50 días	lun 31/08/26	lun 19/10/26	244
247	02.03.06	COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO - MANUAL	30 días	jue 10/09/26	vie 9/10/26	246CC+10 días
248	02.03.07	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO PREPARADO (HORMIGON 50% AFIRMADO 50%)	25 días	mié 30/09/26	sáb 24/10/26	247FC-10 días
249	02.03.08	COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAPA DE HORMIGON E=0.20M - MAQUINARIA	30 días	dom 25/10/26	lun 23/11/26	248
250	02.03.09	COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAPA DE AFIRMADO E=0.20M - MAQUINARIA	30 días	dom 25/10/26	lun 23/11/26	249CC
251	02.03.10	COLOCACIÓN, NIVELACIÓN DE CAPA DE ROCA 8"-10"	30 días	mar 24/11/26	mié 23/12/26	249
252	02.03.11	COLOCACIÓN, NIVELACIÓN DE CAPA DE OVER 4"- 6"	30 días	mar 24/11/26	mié 23/12/26	251CC
253	02.03.12	ACARREO MANUAL DE MATERIAL PROPIO PRODUCTO DE EXCAVACION DEMOLICION DISTANCIA APROX. 60 M	30 días	lun 17/08/26	mar 15/09/26	243CC+3 días
254	02.03.13	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA	32 días	jue 20/08/26	dom 20/09/26	253CC+3 días
255	02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	338 días	jue 24/12/26	vie 26/11/27	
256	02.04.01	SOLADO PROP. 1.8 E= 0.10M	20 días	jue 24/12/26	mar 12/01/27	260CC
257	02.04.02	COLOCACIÓN DE FALSO PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E= 0.10 M	11 días	mar 16/11/27	vie 26/11/27	258
258	02.04.03	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA FALSO PISO	23 días	dom 24/10/27	lun 15/11/27	295
259	02.04.04	CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO PROP. 1:8 +25% PM DE A/C MENOR A 0.50	15 días	jue 24/12/26	jue 7/01/27	261CC
260	02.04.05	CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO PROP. 1:10 +30% PG	15 días	jue 24/12/26	jue 7/01/27	259CC
261	02.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CONCRETO CICLOPEO	18 días	jue 24/12/26	dom 10/01/27	252
262	02.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	343 días	mié 13/01/27	mar 21/12/27	
263	02.05.01	ZAPATAS	70 días	mié 13/01/27	mar 23/03/27	
264	02.05.01.01	CONCRETO F'C=280 KG /CM2 - PARA ZAPATAS, CEMENTO TIPO V	38 días	sáb 23/01/27	lun 1/03/27	266CC+10 días
265	02.05.01.02	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA ZAPATAS	55 días	mié 13/01/27	lun 8/03/27	266CC
266	02.05.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	70 días	mié 13/01/27	mar 23/03/27	256
267	02.05.02	VIGA DE CIMENTACION	25 días	jue 4/03/27	dom 28/03/27	
268	02.05.02.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - EN VIGAS DE CIMENTACION. CEMENTO TIPO V	7 días	vie 19/03/27	jue 25/03/27	270FC-10 días
269	02.05.02.02	ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIMENTACION	20 días	jue 4/03/27	mar 23/03/27	264FC+2 días
270	02.05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION	25 días	jue 4/03/27	dom 28/03/27	269CC
271	02.05.03	SOBRECIMIENTO ARMADO	33 días	vie 26/03/27	mar 27/04/27	
272	02.05.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO, CEMENTO TIPO V	10 días	vie 16/04/27	dom 25/04/27	274FC-12 días
273	02.05.03.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	25 días	vie 26/03/27	lun 19/04/27	268
274	02.05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	33 días	vie 26/03/27	mar 27/04/27	273CC
275	02.05.04	COLUMNAS Y PLACAS	65 días	mié 28/04/27	jue 1/07/27	
276	02.05.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS Y PLACAS. CEMENTO TIPO MS	40 días	jue 13/05/27	lun 21/06/27	278FC-48 días
277	02.05.04.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA COLUMNAS Y PLACAS	65 días	mié 28/04/27	jue 1/07/27	272FC+2 días
278	02.05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA Y PLACAS	63 días	mié 28/04/27	mar 29/06/27	277CC
279	02.05.05	COLUMNETAS	38 días	mié 6/10/27	vie 12/11/27	
280	02.05.05.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS, CEMENTO TIPO MS	13 días	vie 29/10/27	mié 10/11/27	282FC-15 días
281	02.05.05.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA COLUMNETA	35 días	mié 6/10/27	mar 9/11/27	282CC
282	02.05.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA	38 días	mié 6/10/27	vie 12/11/27	330CC+5 días
283	02.05.06	VIGAS	60 días	jue 24/06/27	dom 22/08/27	
284	02.05.06.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS, CEMENTO TIPO MS	35 días	dom 11/07/27	sáb 14/08/27	286FC-38 días

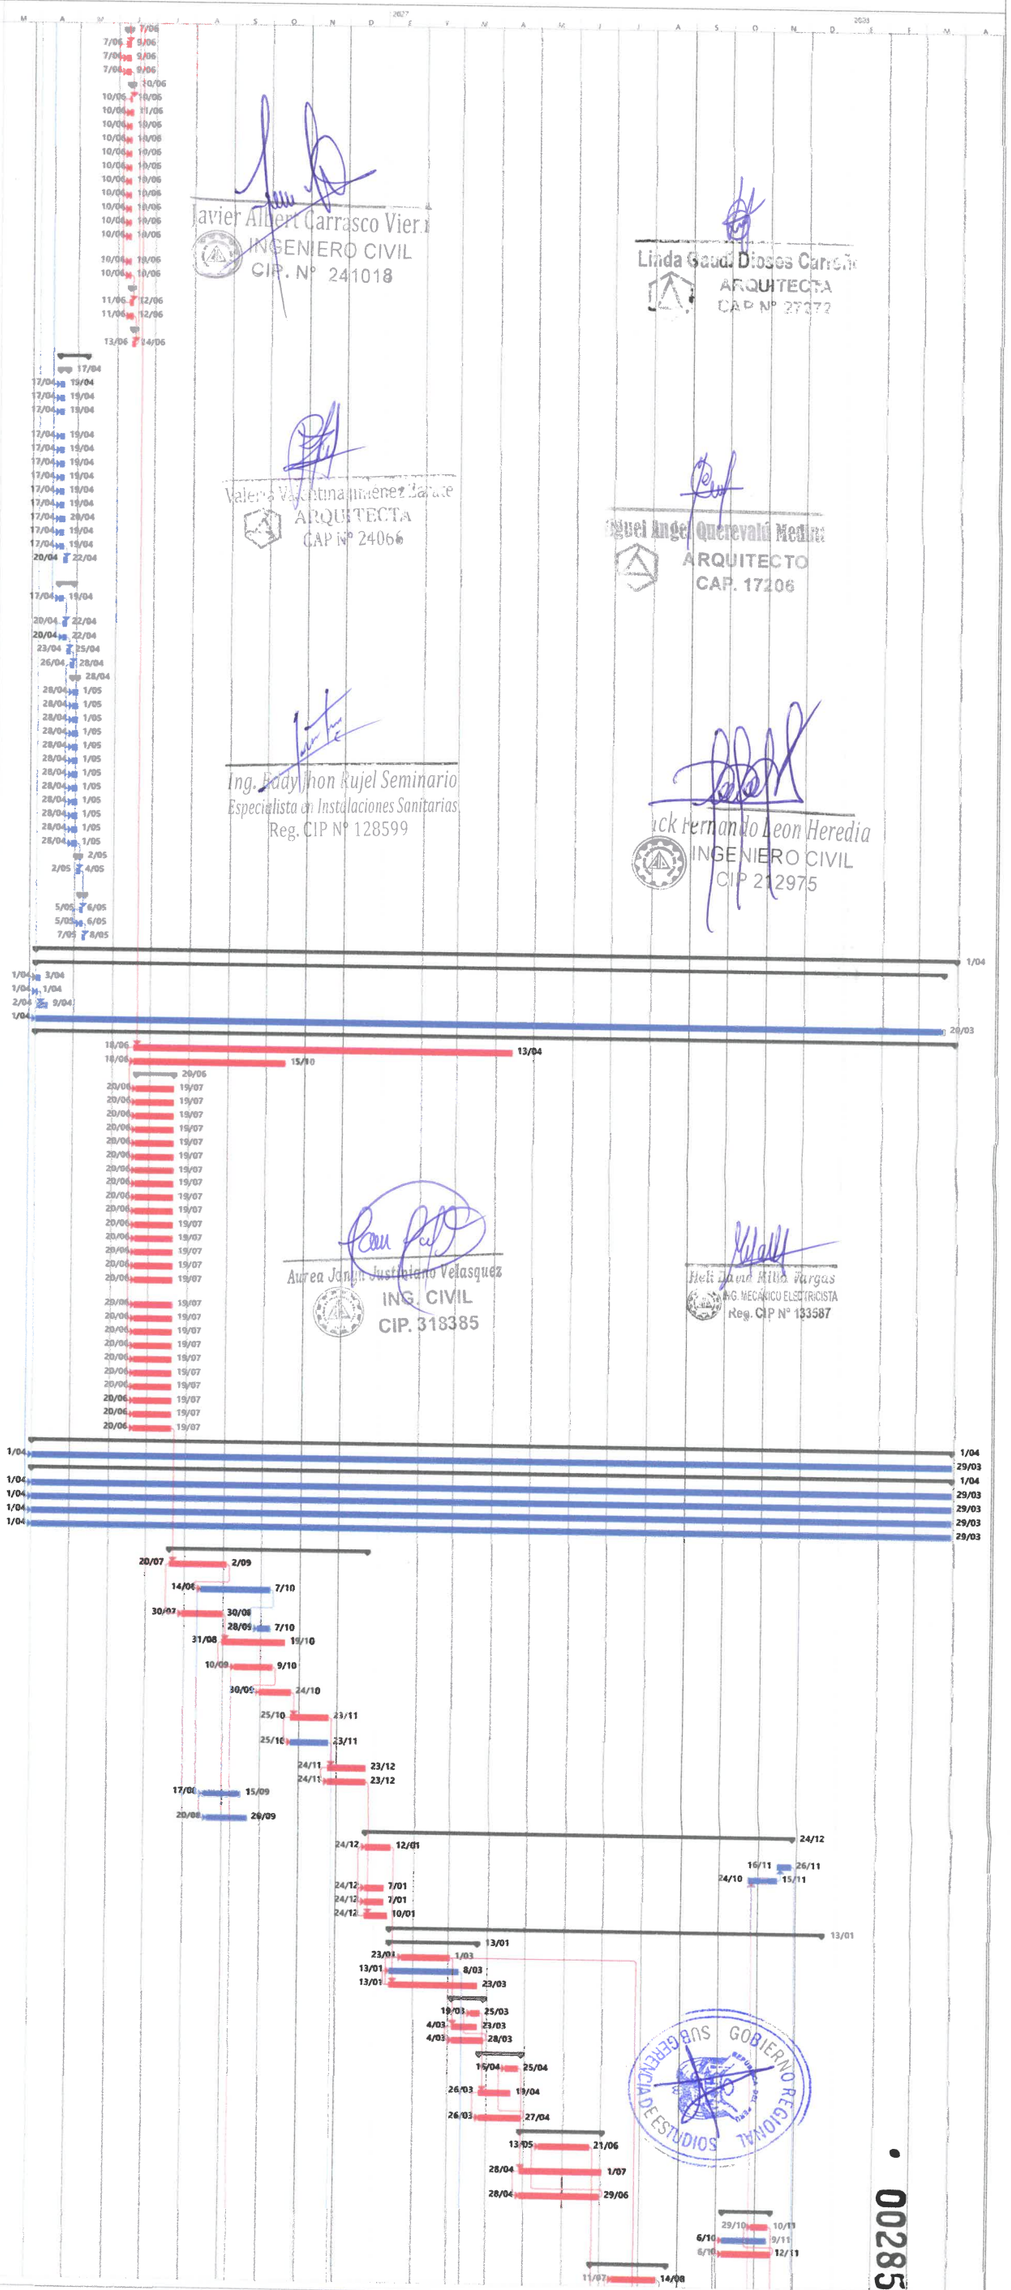

Proyecto: Proyecto2
Fecha: jue 8/01/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Agrupar por sintesis · Tareas resumidas · Tareas criticas resumidas · Hito resumido · Progreso resumido · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duracion · Informe de resumen manual · solo comienzo · solo fin · Resumen manual · solo principio · Informe de resumen manual · Fecha límite · Tarea crítica · Progreso

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
285	02.05.06.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA VIGAS	60 días	jue 24/06/27	dom 22/08/27	276FC+2 días
286	02.05.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	55 días	jue 24/06/27	mar 17/08/27	285CC
287	02.05.07	VIGA DE AMARRE EN MURO	41 días	jue 11/11/27	mar 21/12/27	
288	02.05.07.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGA DE AMARRE, CEMENTO TIPO MS	9 días	lun 13/12/27	mar 21/12/27	290
289	02.05.07.02	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 -VIGA DE AMARRE	22 días	jue 11/11/27	jue 2/12/27	280
290	02.05.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA AMARRE	32 días	jue 11/11/27	dom 12/12/27	289CC
291	02.05.08	LOSA ALIGERADA	117 días	dom 15/08/27	jue 9/12/27	
292	02.05.08.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA,CEMENTO TIPO MS	32 días	dom 19/09/27	mié 20/10/27	295FC-35 días
293	02.05.08.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA LOSA ALIGERADA	70 días	dom 15/08/27	sáb 23/10/27	284
294	02.05.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	75 días	dom 15/08/27	jue 28/10/27	293CC
295	02.05.08.04	LADRILLO DE TECHO 15x30x30 - LOSA ALIGERADA	70 días	dom 15/08/27	sáb 23/10/27	294CC
296	02.05.08.05	MURO BAJO DE CONCRETO F´C= 175 KG/CM2, CEMENTO TIPO MS	9 días	jue 25/11/27	vie 3/12/27	297FC-15 días
297	02.05.08.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO BAJO DE CONCRETO	50 días	jue 21/10/27	jue 9/12/27	298CC
298	02.05.08.07	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 - MURO BAJO	20 días	jue 21/10/27	mar 9/11/27	292
299	02.05.09	LOSA MACIZA	32 días	mié 25/08/27	sáb 25/09/27	
300	02.05.09.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA, CEMENTO TIPO MS	19 días	mié 1/09/27	dom 19/09/27	302FC-25 días
301	02.05.09.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - LOSA MACIZA	26 días	mié 25/08/27	dom 19/09/27	302CC
302	02.05.09.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	32 días	mié 25/08/27	sáb 25/09/27	294CC+10 días
303	02.05.10	ESCALERA	13 días	jue 21/10/27	mar 2/11/27	
304	02.05.10.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2- PARA ESCALERA, CEMENTO TIPO MS	6 días	jue 28/10/27	mar 2/11/27	305FC-3 días
305	02.05.10.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 GRADO 60 -ESCALERA	10 días	jue 21/10/27	sáb 30/10/27	306CC
306	02.05.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA	12 días	jue 21/10/27	lun 1/11/27	292
307	02.05.11	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	20 días	mié 3/11/27	lun 22/11/27	
308	02.05.11.01	CISTERNA	12 días	mié 3/11/27	dom 14/11/27	
309	02.05.11.01.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - PARA CISTERNA, CEMENTO TIPO V	3 días	mié 10/11/27	vie 12/11/27	310
310	02.05.11.01.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA CISTERNA	7 días	mié 3/11/27	mar 9/11/27	311CC
311	02.05.11.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA	12 días	mié 3/11/27	dom 14/11/27	304
312	02.05.11.02	TANQUE ELEVADO	10 días	sáb 13/11/27	lun 22/11/27	
313	02.05.11.02.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 - PARA TANQUE ELEVADO	3 días	sáb 20/11/27	lun 22/11/27	314
314	02.05.11.02.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA TANQUE ELEVADO	7 días	sáb 13/11/27	vie 19/11/27	315CC
315	02.05.11.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO	9 días	sáb 13/11/27	dom 21/11/27	309
316	02.05.12	MUROS DE CONTENCION	25 días	mar 9/03/27	vie 2/04/27	
317	02.05.12.01	CONCRETO F'C=210 KG /CM2 - PARA MURO DE CONTENCION	12 días	vie 19/03/27	mar 30/03/27	319FC-15 días
318	02.05.12.02	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA MURO DE CONTENCION	18 días	mar 9/03/27	vie 26/03/27	265
319	02.05.12.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION	25 días	mar 9/03/27	vie 2/04/27	318CC
320	02.06	COBERTURA AUTOPORTANTE	25 días	mar 22/06/27	vie 16/07/27	
321	02.06.01	COBERTURA AUTOSOPORTADA CURVA DE HACERO GALVANIZADO CALIBRE 20, ESPESOR 0.93MM INC / 5% DE TRANSLUCIDOS DE ÁREA A CUBRIR EN FIBRA DE VIDRIO DE E= 1.60MM (SEGUN DISEÑO) FLECHA 20% DEL ANCHO APROXIMADO	25 días	mar 22/06/27	vie 16/07/27	276
322	02.07	OTROS	247 días	mié 28/07/27	jue 30/03/28	
323	02.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA ASFALTICA E= 1" EN CERCO PERIMETRICO	8 días	mié 26/01/28	mié 2/02/28	325
324	02.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA e=0.05m	10 días	jue 3/02/28	sáb 12/02/28	323
325	02.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LADRILLO PASTELERO DE 24X24X3 CM EN CERCO	10 días	dom 16/01/28	mar 25/01/28	342
326	02.07.04	CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	188 días	mié 28/07/27	lun 31/01/28	264
327	02.07.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	5 días	dom 26/03/28	jue 30/03/28	423
328	03	ARQUITECTURA	182 días	vie 1/10/27	jue 30/03/28	
329	03.01	MUROS Y TABIQUES	70 días	vie 1/10/27	jue 9/12/27	
330	03.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5 X 9 X 23) APAREJO DE SOGA	70 días	vie 1/10/27	jue 9/12/27	292FC-20 días
331	03.01.02	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5 X 9 X 23) APAREJO DE CABEZA	8 días	vie 1/10/27	vie 8/10/27	330CC
332	03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	
333	03.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C.A PROP. 1:4. E=1.5 CM. CEMENTO TIPO MS	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	288FC-20 días
334	03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C.A PROP. 1:4. E=1.5 CM. CEMENTO TIPO MS	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	333CC
335	03.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS PROP. 1:4 E=1.5CM CEMENTO TIPO MS	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	334CC
336	03.02.04	TARRAJEO EN CIELO RASO PROP. 1:4 E=1.5CM CEMENTO TIPO MS	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	335CC
337	03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS PROP. 1:4. e=1.5cm, CEMENTO TIPO MS	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	336CC
338	03.02.06	TARRAJEO DE RAYADO PRIMARIO MEZCLA 1:4	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	337CC
339	03.02.07	REVESTIMIENTO DE DERRAMES H=0.15M PROP. 1:4 E= 1.5CM CEMENTO TIPO MS	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	338CC
340	03.02.08	TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO Y MUROS DE C°PROP. 1:4 E= 1.5CM CEMENTO TIPO MS	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	339CC
341	03.02.09	TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	340CC
342	03.02.10	TARRAJEO EN SARDINELES DE CONCRETO PROP. 1:4 e= 1.5 CM CEMENTO TIPO I	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	341CC
343	03.02.11	TARRAJEO PULIDO DE BANCAS DE CONCRETO COLOREADOS CON OCRE	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	342CC
344	03.02.12	SUPERFICIE CON MICROCEMENTO ACABADO TEXTURA METALICA	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	343CC
345	03.02.13	SUPERFICIE CON MICROCEMENTO ACABADO RUSTICO GRANO FINO	45 días	jue 2/12/27	sáb 15/01/28	344CC
346	03.03	PINTURA	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	
347	03.03.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	368CC+5 días
348	03.03.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	25 días	dom 27/02/28	mié 22/03/28	347CC
349	03.03.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	25 días	dom 27/02/28	mié 22/03/28	348CC
350	03.03.04	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	25 días	dom 27/02/28	mié 22/03/28	349CC
351	03.03.05	PINTURA LATEX EN VIGAS	25 días	dom 27/02/28	mié 22/03/28	350CC
352	03.03.06	PINTURA LATEX EN DERRAMES	15 días	dom 27/02/28	dom 12/03/28	351CC
353	03.04	PISOS Y PAVIMENTOS	102 días	sáb 27/11/27	mar 7/03/28	
354	03.04.01	CONTRAPISO C.A PROP. 1:4, e=5cm	31 días	mar 11/01/28	jue 30/02/28	345FC-5 días
355	03.04.02	PISO PORCELANATO 0.60X0.60M ANTIDESLIZANTE	36 días	lun 17/01/28	lun 21/02/28	358
356	03.04.03	ENCHAPE PORCELANATO (0.60X0.60M)	10 días	sáb 12/02/28	lun 21/02/28	355FC-10 días
357	03.04.04	CORTE EN FALSO PISO e=3MM	5 días	sáb 27/11/27	mié 1/12/27	257
358	03.04.05	CORTE EN CONTRA PISO e=3mm	6 días	mar 11/01/28	dom 16/01/28	354CC
359	03.04.06	PASTA DE CONCRETO PROP. 1:4, E=2.5CM. ACABADO FROTACHADO FINO	25 días	sáb 12/02/28	mar 7/03/28	356CC
360	03.04.07	CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS F'C=175KG/CM2 E=10CM. ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	25 días	sáb 12/02/28	mar 7/03/28	359CC
361	03.04.08	PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO H=4CM	25 días	sáb 12/02/28	mar 7/03/28	360CC
362	03.04.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS SINTETICO	25 días	sáb 12/02/28	mar 7/03/28	361CC
363	03.04.10	LOSAS DEPORTIVAS Y PATIOS DE C° F´C= 175 KG/CM2 E= 0.15 M INC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO FROTACHADO FINO	25 días	sáb 12/02/28	mar 7/03/28	362CC
364	03.04.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE POLIURETANO 10 MM PARA LOSA DEPORTIVA INC. PINTADO	25 días	sáb 12/02/28	mar 7/03/28	363CC
365	03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	20 días	mar 22/02/28	dom 12/03/28	
366	03.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO 80 X 60 CM	20 días	mar 22/02/28	dom 12/03/28	364FC-15 días
367	03.05.02	CONTRA ZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M	20 días	mar 22/02/28	dom 12/03/28	366CC
368	03.05.03	CONTRA ZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30M. COLOREADO CON OCRE GRIS	20 días	mar 22/02/28	dom 12/03/28	367CC
369	03.06	CARPINTERIA DE MADERA	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	
370	03.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (1.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	352FC-10 días
371	03.06.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (1.00X2.30M) CON CERRAJERIA	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	370CC
372	03.06.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (2.00X2.30M) INC. CERRAJERIA	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	371CC
373	03.06.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (0.90X2.30M) CON CERRAJERIA	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	372CC
374	03.06.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (2.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM. CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	373CC
375	03.06.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (1.20X2.30M) INC. CERRAJERIA	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	374CC
376	03.06.07	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO H= 2.30 M CON PUERTA H= 1.90M, SEGUN DISEÑO. INCLUYE ACCESORIOS METALICOS	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	375CC
377	03.06.08	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO EN URINARIO. INCLUYE ACCESORIOS METÁLICOS	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	376CC
378	03.06.09	SUMINISTRO Y COLOCACION CORREAS DE MADERA DE 3" X 2"	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	377CC
379	03.06.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (2.00X2.35M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM. CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	378CC
380	03.06.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (1.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM. CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	379CC
381	03.06.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (2.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM. CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	380CC
382	03.06.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (0.70X2.30M) INC. CERRAJERIA	20 días	vie 3/03/28	mié 22/03/28	381CC
383	03.07	CARPINTERIA METALICA	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	
384	03.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 6MM , INC. ACCESORIOS, SEGUN DISEÑO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	382CC
385	03.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR METÁLICO DE MARCO DE ACERO INOXIDABLE 1" x 2" e=1.5 mm y T" DE ACERO INOXIDABLE INTERIOR DE 1"x1" e= 1.5 mm. SEGUN DISEÑO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	384CC
386	03.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA JUNTAS METÁLICA DE 6" PARA MUROS Y CIELO RASO CON PL DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	385CC
387	03.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE 6" PARA PISOS CON PL DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	386CC
388	03.07.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA JUNTAS EN SEPARACIÓN DE COBERTURA TIPO U Y TIPO L	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	387CC
389	03.07.06	SUMIN. E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO INOX. Ø 1 1/2" ACABADO SATINADO MATE. PARA DISCAPACITADOS L=0.90M	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	388CC
390	03.07.07	SUMIN. E INSTALACIÓN DE BARRA ABATIBLE DE ACERO INOX. Ø1 1/2" ACABADO SATINADO MATE. PARA DISCAPACITADOS	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	389CC
391	03.07.08	SUMIN. E INSTALACIÓN DE APOYO TUBULAR DE ACERO INOX. Ø1 1/2" ACABADO SATINADO MATE. PARA DISCAPACITADOS L=0.60M	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	390CC
392	03.07.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE METÁLICO DE T" 2"X4" E=1.8MM. INC ANCLAJE Y PINTADO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	391CC
393	03.07.10	SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS METALICO DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" SEGUN DISEÑO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	392CC
394	03.07.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA METÁLICA DE T" 3"X2" E=1.8MM. INC PINTADO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	393CC
395	03.07.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORREA METÁLICA DE T" 3"X 1.5" E=2 MM INC. PINTADO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	394CC
396	03.07.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA DE BANDERA	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	395CC
397	03.07.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO CON CANASTILLA L= 16.11m Segun Diseño	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	396CC
398	03.07.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO I SEGUN DISEÑO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	397CC
399	03.07.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	398CC
400	03.07.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSIGNIA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	399CC
401	03.07.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE (1.70x2.10m) SEGUN DISEÑO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	400CC
402	03.07.19	TAPA METALICA DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 3/16" (0.60 x 0.60m) INC ACCESORIOS DE CERRAJERIA	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	401CC
403	03.07.20	CERCO METÁLICO CON T°F°N° 1"X2" E=2.0MM. H=2.60M. INC. ANCLAJE SEGUN DISEÑO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	402CC
404	03.07.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METÁLICA DE (1.55X2.60M) INC. CERRAJERIA SEGUN DISEÑO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	403CC
405	03.07.22	SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANA METALICA ENRROLLABLE DE CANAL U 240X60X2 H= 1.30M. INC. CERRAJERIA SEGÚN DISEÑO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	404CC
406	03.07.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METÁLICA DE (3.50X2.60m) INC. CERRAJERIA SEGUN DISEÑO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	405CC

Javier Albert Carrasco Vierl
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 241013

Linda Gaudi Dioses Carrillo
ARQUITECTA
CAP N° 27272

Valeria Valentina Jiménez Zarate
ARQUITECTA
CAP N° 24066

Ing. Eddy Jhon Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 128599

Ingue. Angel Querevalú Mo...
ARQUITECTO
CAP. 17206

ICK Fernando Leon Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Aurea Janiyn Justiniano Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 318385

Eiva Dana Milla Vargas
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 133587

SUPERVISIÓN Y ESTUDIOS


Proyecto: Proyecto2
Fecha: jue 8/01/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Agrupar por síntesis · Tarea resumida · Tarea crítica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Fecha límite · Tarea crítica · Progreso


002849

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin	Predecesoras
407	03.07.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA METALICA CON MARCO ACERO INOXIDABLE DE 1" x 2" e= 1.5mm y ACERO INOXIDABLE INTERIOR DE 1"x2" e= 1.5 mm, segun Diseño	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	406CC
408	03.07.25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" x 4" e= 1.50 mm	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	407CC
409	03.07.26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA METALICA DE T°F°N° 4"X4" E=3 MM H=3.00M INC. DADO DE C DE 0.40x0.40x0.60m	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	408CC
410	03.07.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO L = 2.25m segun diseño	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	409CC
411	03.07.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" h=1.00m. TIPO II SEGUN DISEÑO	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	410CC
412	03.08	VIDRIOS Y SIMILARES	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	
413	03.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA CON PUERTA ENMARCADA EN ALUMINIO DE VIDRIO LAMINADO DE 6MM Y 8MM	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	411CC
414	03.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENMARCADA EN ALUMINIO DE VIDRIO LAMINADO DE 8MM	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	413CC
415	03.08.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO BISELADO DE 4mm DE 2.60m x 1.00m	15 días	vie 3/03/28	vie 17/03/28	414CC
416	03.09	COBERTURAS	10 días	sáb 18/03/28	lun 27/03/28	
417	03.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA FIBRA VEGETAL 0.95 X 2.00 M	10 días	sáb 18/03/28	lun 27/03/28	415
418	03.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA DE ACERO ALUMINIZADO MODELO TR4 e= 0.30 mm	10 días	sáb 18/03/28	lun 27/03/28	417CC
419	03.09.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL 2.00M X 0.52M	10 días	sáb 18/03/28	lun 27/03/28	418CC
420	03.10	OTROS	69 días	lun 17/01/28	sáb 25/03/28	
421	03.10.01	SELLADO DE JUNTA DE DILATACION VERTICAL CON ESPUMA DE POLIURETANO Y SELLADOR ELASTOMERICO	8 días	sáb 18/03/28	sáb 25/03/28	419CC
422	03.10.02	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN E= 6MM	8 días	sáb 18/03/28	sáb 25/03/28	421CC
423	03.10.03	BRUÑAS E=1CM. EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	8 días	sáb 18/03/28	sáb 25/03/28	422CC
424	03.10.04	SEÑALES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	
425	03.10.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA A PARED DE 0.30X0.30	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	352FC-10 días
426	03.10.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA A PARED DE 0.30X0.40	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	425CC
427	03.10.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	426CC
428	03.10.05	MEDIA CAÑA DE CONCRETO PARA EVACUACIÓN PLUVIAL EN COBERTURAS. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	427CC
429	03.10.06	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA REDIRECCIONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CANALETA MEDIA CAÑA. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	428CC
430	03.10.07	CONTRA PISO E=2" PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	429CC
431	03.10.08	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	430CC
432	03.10.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA DE CULTIVO H=0.20M	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	431CC
433	03.10.10	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBUSTOS	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	432CC
434	03.10.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PODO TÁCTIL DE 0.40X0.40 EN RAMPA	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	433CC
435	03.10.12	SARDINEL DE C' 0.20X0.40 F'C=175KG/CM2. INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	434CC
436	03.10.13	SARDINEL DE C' 0.20X0.65 F'C=175KG/CM2. INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	435CC
437	03.10.14	CONCRETO EN GRADERÍAS PEATONALES F'C=175KG/CM2 E=15CM. ACABADO FROTACHADO FINO INC. SARDINELES	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	436CC
438	03.10.15	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERÍAS PEATONALES	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	437CC
439	03.10.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL DE GRADA PVC GRIS/AMARILLO CON SEÑALIZACION	5 días	vie 3/03/28	mar 7/03/28	438CC
440	03.10.17	MESAS, BANCAS DE CONCRETO	22 días	lun 17/01/28	lun 7/02/28	
441	03.10.17.01	CONCRETO F.C=175 KG/CM2. PARA MESAS, BANCAS	15 días	dom 23/01/28	dom 6/02/28	442FC-10 días
442	03.10.17.02	ACERO CORRUGADO F°Y= 4200 KG/CM2. PARA MESAS, BANCAS	16 días	lun 17/01/28	mar 1/02/28	443CC
443	03.10.17.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS, BANCAS DE CONCRETO	22 días	lun 17/01/28	lun 7/02/28	358
444	03.10.18	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	4 días	mar 8/02/28	vie 11/02/28	
445	03.10.18.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCOS DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET. INC MALLA SEGUN DISEÑO	4 días	mar 8/02/28	vie 11/02/28	443
446	03.10.18.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FULBITO, INC MALLA SEGUN DISEÑO	4 días	mar 8/02/28	vie 11/02/28	445CC
447	04	INSTALACIONES SANITARIAS	291 días	mar 24/11/26	vie 10/09/27	
448	04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	10 días	mié 1/09/27	vie 10/09/27	
449	04.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO)	10 días	mié 1/09/27	vie 10/09/27	331CC-30 días
450	04.01.02	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (URINARIOS)	10 días	mié 1/09/27	vie 10/09/27	449CC
451	04.01.03	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAT. MOD. OVALIN)	10 días	mié 1/09/27	vie 10/09/27	450CC
452	04.01.04	SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (LAVAT. C/PEDESTAL)	10 días	mié 1/09/27	vie 10/09/27	451CC
453	04.01.05	SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (LAVADEROS)	10 días	mié 1/09/27	vie 10/09/27	452CC
454	04.01.06	SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (DUCHAS)	10 días	mié 1/09/27	vie 10/09/27	453CC
455	04.01.07	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	10 días	mié 1/09/27	vie 10/09/27	454CC
456	04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA	65 días	mar 24/11/26	mié 27/01/27	
457	04.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA	25 días	mar 24/11/26	vie 18/12/26	
458	04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2"	25 días	mar 24/11/26	vie 18/12/26	250
459	04.02.02	REDES DE DISTRIBUCION	20 días	mar 24/11/26	dom 13/12/26	
460	04.02.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 CR P/AGUA FRIA D=1"	20 días	mar 24/11/26	dom 13/12/26	458CC
461	04.02.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 CR P/AGUA FRIA D=3/4"	20 días	mar 24/11/26	dom 13/12/26	460CC
462	04.02.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 CR P/AGUA FRIA D=1/2"	20 días	mar 24/11/26	dom 13/12/26	461CC
463	04.02.03	REDES DE ALIMENTACION	20 días	mar 24/11/26	dom 13/12/26	
464	04.02.03.01	TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=2"	20 días	mar 24/11/26	dom 13/12/26	462CC
465	04.02.03.02	TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=1 1/2"	20 días	mar 24/11/26	dom 13/12/26	464CC
466	04.02.03.03	TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=1"	20 días	mar 24/11/26	dom 13/12/26	465CC
467	04.02.03.04	TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=3/4"	20 días	mar 24/11/26	dom 13/12/26	466CC
468	04.02.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	
469	04.02.04.01	ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	
470	04.02.04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	467CC+15 días
471	04.02.04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	470CC
472	04.02.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1/2"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	471CC
473	04.02.04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 DE 1"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	472CC
474	04.02.04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	473CC
475	04.02.04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	474CC
476	04.02.04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC AGUA C-10 1" A 3/4"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	475CC
477	04.02.04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC AGUA C-10 3/4" A 1/2"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	476CC
478	04.02.04.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC AGUA C-10 1" A 1/2"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	477CC
479	04.02.04.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL PVC 1"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	478CC
480	04.02.04.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	479CC
481	04.02.04.02	ACCESORIOS EN REDES DE ALIMENTACION	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	
482	04.02.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC AGUA C-10 2"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	480CC
483	04.02.04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1 1/2"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	482CC
484	04.02.04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	483CC
485	04.02.04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° PVC AGUA C-10 2"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	484CC
486	04.02.04.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 DE 2"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	485CC
487	04.02.04.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC AGUA C-10 1 1/2"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	486CC
488	04.02.04.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC AGUA C-10 1"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	487CC
489	04.02.04.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC AGUA C-10 2" A 1 1/2"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	488CC
490	04.02.04.02.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 2 A 1"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	489CC
491	04.02.04.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC AGUA C-10 1 1/2" A 1"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	490CC
492	04.02.04.02.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4"	30 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27	491CC
493	04.02.05	VALVULAS	25 días	dom 3/01/27	mié 27/01/27	
494	04.02.05.01	VALVULA COMPUERTA PESADA DE PVC DE 3/4"	25 días	dom 3/01/27	mié 27/01/27	492FC-5 días
495	04.02.05.02	VÁLVULA COMPUERTA PESADA DE PVC DE 1"	25 días	dom 3/01/27	mié 27/01/27	494CC
496	04.02.05.03	VÁLVULA COMPUERTA PESADA DE PVC DE 1 1/2"	25 días	dom 3/01/27	mié 27/01/27	495CC
497	04.02.05.04	VÁLVULA COMPUERTA PESADA DE PVC DE 2"	25 días	dom 3/01/27	mié 27/01/27	496CC
498	04.02.05.05	VALVULA CHECK VERTICAL DE 2"	25 días	dom 3/01/27	mié 27/01/27	497CC
499	04.02.05.06	VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 2"	25 días	dom 3/01/27	mié 27/01/27	498CC
500	04.02.05.07	VALVULA PARA CISTERNA Ø 3/4"	25 días	dom 3/01/27	mié 27/01/27	499CC
501	04.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	31 días	jue 28/01/27	sáb 27/02/27	
502	04.03.01	RED COLECTORA DE DRENAJE	15 días	jue 28/01/27	jue 11/02/27	
503	04.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC. UF Ø DE 6"	7 días	jue 28/01/27	mié 3/02/27	500
504	04.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC Ø DE 4"	15 días	jue 28/01/27	jue 11/02/27	503CC
505	04.03.02	MONTANTE DE TECHOS	8 días	vie 12/02/27	vie 19/02/27	
506	04.03.02.01	MONTANTE DE DRENAJE PLUVIAL Ø 4"	8 días	vie 12/02/27	vie 19/02/27	504
507	04.03.03	ACCESORIOS EN MONTANTES	8 días	vie 12/02/27	vie 19/02/27	
508	04.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° Ø 4"	8 días	vie 12/02/27	vie 19/02/27	506CC
509	04.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° Ø 4"	8 días	vie 12/02/27	vie 19/02/27	508CC
510	04.03.04	CAMARAS DE INSPECCION	8 días	sáb 20/02/27	sáb 27/02/27	
511	04.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 12"x24"	8 días	sáb 20/02/27	sáb 27/02/27	509
512	04.04	DESAGUE Y VENTILACION	85 días	dom 28/02/27	dom 23/05/27	
513	04.04.01	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4"	25 días	dom 28/02/27	mié 24/03/27	511
514	04.04.02	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2"	25 días	dom 28/02/27	mié 24/03/27	513CC
515	04.04.03	REDES DE DERIVACION	20 días	jue 25/03/27	mar 13/04/27	
516	04.04.03.01	RED DE DERIVACION DE DESAGUE Ø 4"	20 días	jue 25/03/27	mar 13/04/27	514
517	04.04.03.02	RED DE DERIVACION DE DESAGUE Ø 2"	20 días	jue 25/03/27	mar 13/04/27	516CC
518	04.04.04	REDES COLECTORAS	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	
519	04.04.04.01	RED COLECTORA DE DESAGUE UF DE Ø 6"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	517CC
520	04.04.04.02	RED COLECTORA DE DESAGUE Ø 4"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	519CC
521	04.04.04.03	RED COLECTORA DE DESAGUE Ø 2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	520CC
522	04.04.05	ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE	60 días	jue 25/03/27	dom 23/05/27	
523	04.04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC SAP Ø DE 4"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	521CC
524	04.04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC SAP Ø DE 2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	523CC
525	04.04.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° PVC SAP Ø DE 2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	524CC
526	04.04.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC SAP Ø DE 4"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	525CC
527	04.04.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC SAP Ø DE 2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	526CC
528	04.04.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA PVC SAP Ø DE 4" A 2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	527CC
529	04.04.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA PVC SAP DE Ø2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	528CC
530	04.04.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø DE 4"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	529CC
531	04.04.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø DE 2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	530CC
532	04.04.05.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø 4" A 2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	531CC
533	04.04.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC SAP Ø DE 4" A 2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	532CC
534	04.04.05.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAP Ø DE 2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	533CC
535	04.04.05.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	534CC
536	04.04.05.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BRONCE Ø DE 2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	535CC
537	04.04.05.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P. Ø DE 2"	30 días	jue 25/03/27	vie 23/04/27	536CC
538	04.04.05.16	CAMARAS DE INSPECCION	30 días	sáb 24/04/27	dom 23/05/27	
539	04.04.05.16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 12"x24"	30 días	sáb 24/04/27	dom 23/05/27	537
540	04.04.05.16.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 18" x 24"	30 días	sáb 24/04/27	dom 23/05/27	539CC
541	05	INSTALACIONES ELECTRICAS	162 días	mié 30/09/26	mié 10/03/27	
542	05.01	TABLEROS ELECTRICOS	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	
543	05.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL (TG)	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	602
544	05.01.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG-1P (PRIMARIA)	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	543CC
545	05.01.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG-1S (SECUNDARIA)	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	544CC
546	05.01.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1 01	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	545CC
547	05.01.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1 02	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	546CC
548	05.01.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1 03	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	547CC
549	05.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1 04	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	548CC
550	05.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1 05	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	549CC
551	05.01.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1 06	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	550CC
552	05.01.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1 07	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	551CC

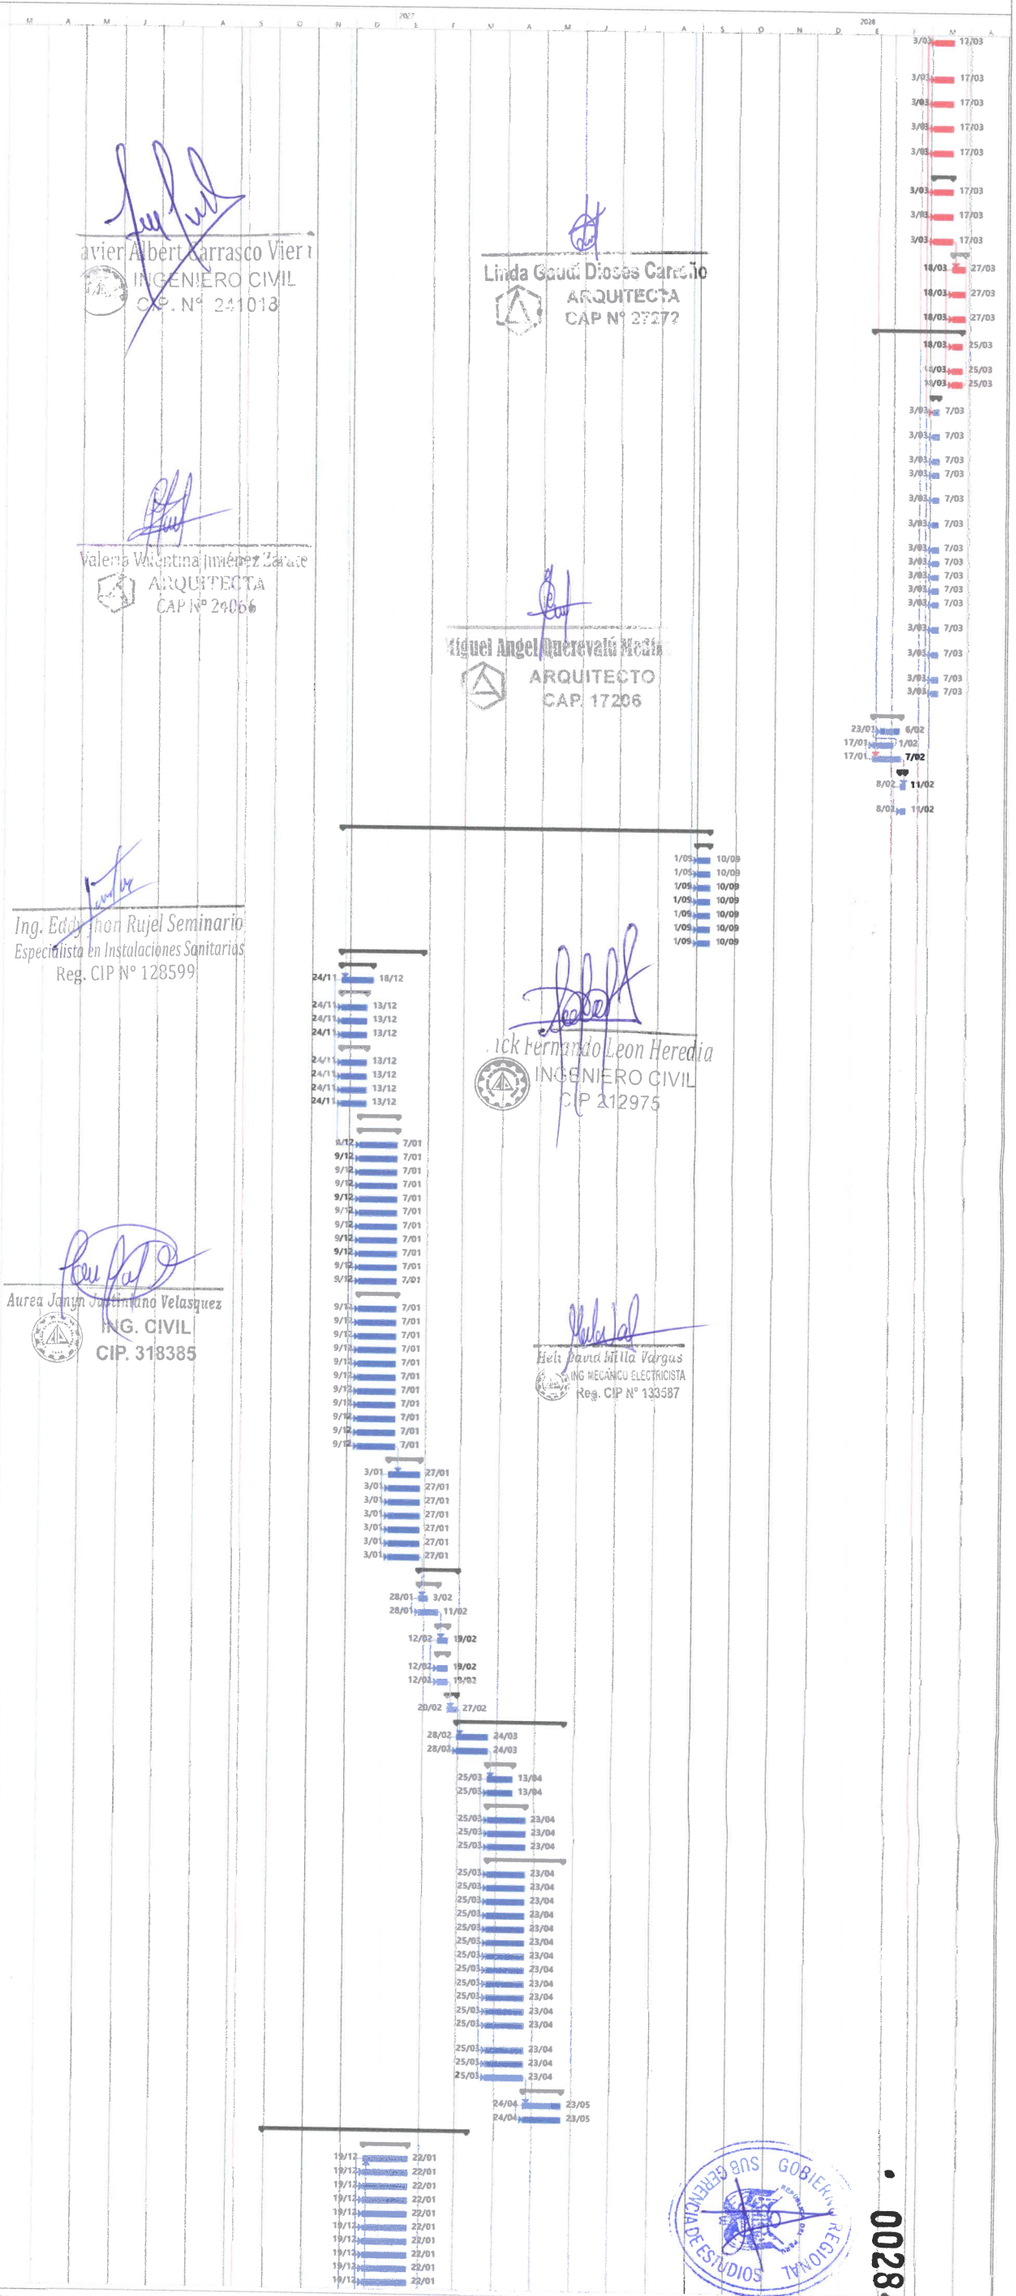
2027
2028
17/03
27/03
25/03
7/03
6/02
11/02
7/02
19/02
24/03
13/04
23/04
23/05
10/09
18/12
13/12
7/01
27/01
3/02
11/02
19/02
19/02
27/02
24/03
24/03
13/04
13/04
23/04
23/04
23

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin	Predecesoras
553	05.01.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1 08 - VIGIL	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	552CC
554	05.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1 09 + (VESTIDOR)	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	553CC
555	05.01.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1 10 (TLD)	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	554CC
556	05.01.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO ST-2 1P	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	555CC
557	05.01.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO ST-2 2S	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	556CC
558	05.01.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2 01	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	557CC
559	05.01.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2 02	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	558CC
560	05.01.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2 03	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	559CC
561	05.01.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2 04	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	560CC
562	05.01.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2 05	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	561CC
563	05.01.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2 06	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	562CC
564	05.01.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2 07	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	563CC
565	05.01.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2 08	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	564CC
566	05.01.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO ST-3 1P	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	565CC
567	05.01.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO ST-3 2S	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	566CC
568	05.01.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3 01	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	567CC
569	05.01.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3 02 (AIP-P)	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	568CC
570	05.01.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3 03	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	569CC
571	05.01.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3 04 (DIRECCION)	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	570CC
572	05.01.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3 05 (AIP-S)	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	571CC
573	05.01.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3 06	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	572CC
574	05.01.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3 07	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	573CC
575	05.01.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_ TABLERO ST-4 1P	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	574CC
576	05.01.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4 01	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	575CC
577	05.01.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4 02	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	576CC
578	05.01.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL EQUIPO SOLAR TPS	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	577CC
579	05.01.37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBA TEB	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	578CC
580	05.01.38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUZON DE CONCRETO	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	579CC
581	05.01.39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA BORNERA 03 CIRCUITOS	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	580CC
582	05.01.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PASE 200x200x100 PVC	35 días	sáb 19/12/26	vie 22/01/27	581CC
583	05.02	CONDUCTORES ALIMENTADORES	35 días	mié 30/09/26	mar 3/11/26	
584	05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 50 + 35mm2 (MEDIDOR A TG)	35 días	mié 30/09/26	mar 3/11/26	247CC+20 días
585	05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 35 + 35 mm2 (TG - STG)	35 días	mié 30/09/26	mar 3/11/26	584CC
586	05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 +16 mm2 (STG - TD)	35 días	mié 30/09/26	mar 3/11/26	585CC
587	05.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 10 + 1 x 10 (N) (TEB)	35 días	mié 30/09/26	mar 3/11/26	586CC
588	05.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 10 mm2 + 6mm (T)	35 días	mié 30/09/26	mar 3/11/26	587CC
589	05.02.06	SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR AUTOPORTANTE CAAI 3-1 x 50 + 1x35mm2	35 días	mié 30/09/26	mar 3/11/26	588CC
590	05.02.07	SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR NLT 2 X 6 mm2	35 días	mié 30/09/26	mar 3/11/26	589CC
591	05.03	INSTALACION DE INTERIORES	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	
592	05.03.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	590FC+5 días
593	05.03.02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTOS	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	592CC
594	05.03.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CUATRO PUNTOS	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	593CC
595	05.03.04	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA SEIS PUNTOS	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	594CC
596	05.03.05	SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W. ADOSADA AL TECHO	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	595CC
597	05.03.06	SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18W	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	596CC
598	05.03.07	SALIDA DE CENTRO DE LUZ CONMUTACION DOBLE: ESCALERA ESCALERA Y PASILLOS	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	596CC
599	05.03.08	SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES DE TECHO	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	597CC
600	05.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	598CC
601	05.03.10	SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE h=0.40m	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	599CC
602	05.03.11	SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTES AREA DE COMPUTADORA AIP	40 días	lun 9/11/26	vie 18/12/26	600CC
603	05.04	ILUMINACION PATIO Y EXTERIOR	15 días	jue 24/12/26	jue 7/01/27	
604	05.04.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO A TIERRA, INC. EXCAVACION	15 días	jue 24/12/26	jue 7/01/27	602FC+5 días
605	05.04.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARTEFACTO BRAQUETE LED (PARTE INTERIOR)	15 días	jue 24/12/26	jue 7/01/27	604CC
606	05.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO FAROLA CONICA C/LUMINARIA LED 30W YCONEXIONADO	15 días	jue 24/12/26	jue 7/01/27	605CC
607	05.04.04	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 6m	15 días	jue 24/12/26	jue 7/01/27	606CC
608	05.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 100 WATTS	15 días	jue 24/12/26	jue 7/01/27	607CC
609	05.05	OTROS	25 días	mar 29/12/26	vie 22/01/27	
610	05.05.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS	25 días	mar 29/12/26	vie 22/01/27	608FC-10 días
611	05.05.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALTAVOZ EXTERIOR PATIO	25 días	mar 29/12/26	vie 22/01/27	610CC
612	05.05.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIMBRE	25 días	mar 29/12/26	vie 22/01/27	611CC
613	05.05.04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA	25 días	mar 29/12/26	vie 22/01/27	612CC
614	05.05.05	DESMONTAJE DE POSTES INTERIORES	25 días	mar 29/12/26	vie 22/01/27	613CC
615	05.06	SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICO PARA CAMPO DE FULBITO 1	20 días	vie 8/01/27	mié 27/01/27	
616	05.06.01	SISTEMA DE EQUIPO SOLAR, INCL. PANEL BATERIA, CONTROLADOR, CABLEADO, ACC.	20 días	vie 8/01/27	mié 27/01/27	614CC+10 días
617	05.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO LED DE 200W	20 días	vie 8/01/27	mié 27/01/27	616CC
618	05.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	20 días	vie 8/01/27	mié 27/01/27	617CC
619	05.07	AIRE ACONDICIONADO	12 días	mié 13/01/27	dom 24/01/27	
620	05.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU. INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS	12 días	mié 13/01/27	dom 24/01/27	618CC+5 días
621	05.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU. INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS	12 días	mié 13/01/27	dom 24/01/27	620CC
622	05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO GENERADOR	15 días	lun 25/01/27	lun 8/02/27	
623	05.08.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPO GENERADOR DE 50HP. ENCAPSULADO EN CASETAS	15 días	lun 25/01/27	lun 8/02/27	621
624	05.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO	15 días	lun 25/01/27	lun 8/02/27	623CC
625	05.09	SUMINISTRO Y PRUEBAS DE RED ELECTRICA	5 días	mar 9/02/27	sáb 13/02/27	
626	05.09.01	PRUEBAS DE RED ELECTRICAS EN BAJA TENSION	5 días	mar 9/02/27	sáb 13/02/27	624
627	05.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DATA	10 días	mar 9/02/27	jue 18/02/27	
628	05.10.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DATA INTERNET (INCLUYE CONTRATO)	10 días	mar 9/02/27	jue 18/02/27	626CC
629	05.10.02	PUNTOS DE PROYECCION EN TECHO DE AULAS	10 días	mar 9/02/27	jue 18/02/27	628CC
630	05.11	TRANSPORTE DE MATERIALES	10 días	mar 9/02/27	jue 18/02/27	
631	05.11.01	TRANSPORTE DE MATERIALES. EXPED. REPLANTEO	10 días	mar 9/02/27	jue 18/02/27	629CC
632	05.12	DERECHO DE CONEXION - ENOSA	10 días	vie 19/02/27	dom 28/02/27	
633	05.12.01	DERECHO DE RECONEXION - ENOSA	10 días	vie 19/02/27	dom 28/02/27	631
634	05.12.02	REUBICACION DE ACOMETIDA TRIFASICA (ESP. TECNICAS)	10 días	vie 19/02/27	dom 28/02/27	633CC
635	05.13	PARARRAYOS	10 días	lun 1/03/27	mié 10/03/27	
636	05.13.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS	10 días	lun 1/03/27	mié 10/03/27	634
637	06	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	
638	06.01	MOBILIARIO - PRIMER NIVEL	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	
639	06.01.01	SILLA PARA DOCENTE	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	347CC
640	06.01.02	ESCRITORIO CON CAJONERA PARA DOCENTE (1.20 M X 0.60 M X 0.75 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	639CC
641	06.01.03	ARMARIO 4 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	640CC
642	06.01.04	PIZARRA ACRILICA DE (4.20 M X 1.20 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	641CC
643	06.01.05	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.27 M X 0.32 M X 0.30 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	642CC
644	06.01.06	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.30 M X 0.34 M X 0.34 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	643CC
645	06.01.07	MESA RECTANGULAR (1.00 M X2 00 M X0.56 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	644CC
646	06.01.08	MESA RECTANGULAR (1.00 M X2 00 M X0.61 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	645CC
647	06.01.09	ESTANTE METALICO (1.50m x 0.60M X 2.00M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	646CC
648	06.01.10	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 MX 0.50 M X 0.58 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	647CC
649	06.01.11	MESA RECTANGULAR PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	648CC
650	06.01.12	PANTALLA ECRAN RETRACTIL DE 150"	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	649CC
651	06.01.13	SILLAS APILABLES	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	650CC
652	06.01.14	SOFA DOBLE	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	651CC
653	06.01.15	ATRIL DE CONFERENCIA	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	652CC
654	06.01.16	MESA RECTANGULAR (1.20 M X 0.80 M X 0.75 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	653CC
655	06.01.17	CAMILLA RODANTE (0.60x1.90m)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	654CC
656	06.01.18	BIOMBO DE 03 CAJONES	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	655CC
657	06.01.19	COCHE MULTIPLES USOS	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	656CC
658	06.01.20	BOTIQUIN	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	657CC
659	06.01.21	MESA RECTANGULAR (1.00 M X2 00 M X0.72 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	658CC
660	06.01.22	BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO (0.90b0 30h0 45m)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	659CC
661	06.01.23	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.40 M X 0.42 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	660CC
662	06.01.24	PIZARRA ACRILICA DE (3.20 M X 1.20 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	661CC
663	06.01.25	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.36 M X 0.38 M X 0.39 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	662CC
664	06.01.26	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.69 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	663CC
665	06.01.27	MESA RECTANGULAR 0.60M x 1.20M	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	664CC
666	06.01.28	LOCKERS (0.40 M X 0.45 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	665CC
667	06.01.29	TABURETE DE MADERA h=0.75m	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	666CC
668	06.02	MOBILIARIO - SEGUNDO NIVEL	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	
669	06.02.01	ESCRITORIO CON CAJONERA PARA DOCENTE (1.20 M X 0.60 M X 0.75 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	667CC
670	06.02.02	SILLA PARA DOCENTE	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	669CC
671	06.02.03	ARMARIO 4 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.80 M X 0.45 M X 1.80 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	670CC
672	06.02.04	PIZARRA ACRILICA DE (4.20 M X 1.20 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	671CC
673	06.02.05	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.36 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	672CC
674	06.02.06	MESA DE TRABAJO (1.00m x 2 00 M x 0.65 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	673CC
675	06.02.07	MESA RECTANGULAR (1 00 M X2 00 M X0.72 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	674CC
676	06.02.08	ESTANTE METALICO (1.50m x 0.60M X 2 00M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	675CC
677	06.02.09	SOFA DOBLE	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	676CC
678	06.02.10	MESA DE CENTRO O DE REVISTAS	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	677CC
679	06.02.11	CREDENZA CON LLAVE (1.20x0.40mx0.70m)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	678CC
680	06.02.12	ARCHIVADORES 0.45 M X 0.70 M	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	679CC
681	06.02.13	MESAS MODULARES (1.00 M X 1 00 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	680CC
682	06.02.14	MESA DE TRABAJO (2.40 M X 0.60 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	681CC
683	06.02.15	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.30 M X 0.34 M X 0.34 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	682CC
684	06.02.16	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.81 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	683CC
685	06.02.17	MESA RECTANGULAR PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	684CC
686	06.02.18	PANTALLA ECRAN RETRACTIL DE 150"	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	685CC
687	06.02.19	MESA PARA COMEDOR	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	686CC
688	06.02.20	SILLA PARA COMEDOR	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	687CC
689	06.02.21	UTENSILIOS DE COCINA	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	688CC
690	06.02.22	JUEGO DE OLLAS INDUSTRIALES	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	689CC
691	06.02.23	JUEGO DE CUBIERTOS (CUCHARA, CUCHARITA, TENEDOR Y CUCHILLO)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	690CC
692	06.02.24	VAJILLA (PLATO TENDIDO, PLATO HONDO, VASO Y TASA)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	691CC
693	06.02.25	SILLA DE ESPERA 4 CUERPOS	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	692CC
694	06.02.26	SILLA GIRATORIA	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	693CC
695	06.02.27	SILLA GERENCIAL GIRATORIA	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	694CC
696	06.02.28	ESCRITORIO TIPO L1	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	695CC
697	06.02.29	SOFA 3 CUERPOS	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	696CC
698	06.02.30	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.36 M X 0.38 M X 0.39 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	697CC
699	06.02.31	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.69 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	698CC
700	06.02.32	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.40 M X 0.42 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	699CC
701	06.02.33	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.72 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	700CC
702	06.02.34	MESA RECTANGULAR (1.00m x 2.00 x 0.75m)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	701CC
703	06.02.35	TABURETE DE MADERA h=0.75m	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	702CC
704	06.02.36	PIZARRA ACRILICA DE (3.20 M X 1.20 M)	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	703CC
705	06.02.37	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE DE BIBLIOTECA	33 días	dom 27/02/28	jue 30/03/28	704CC

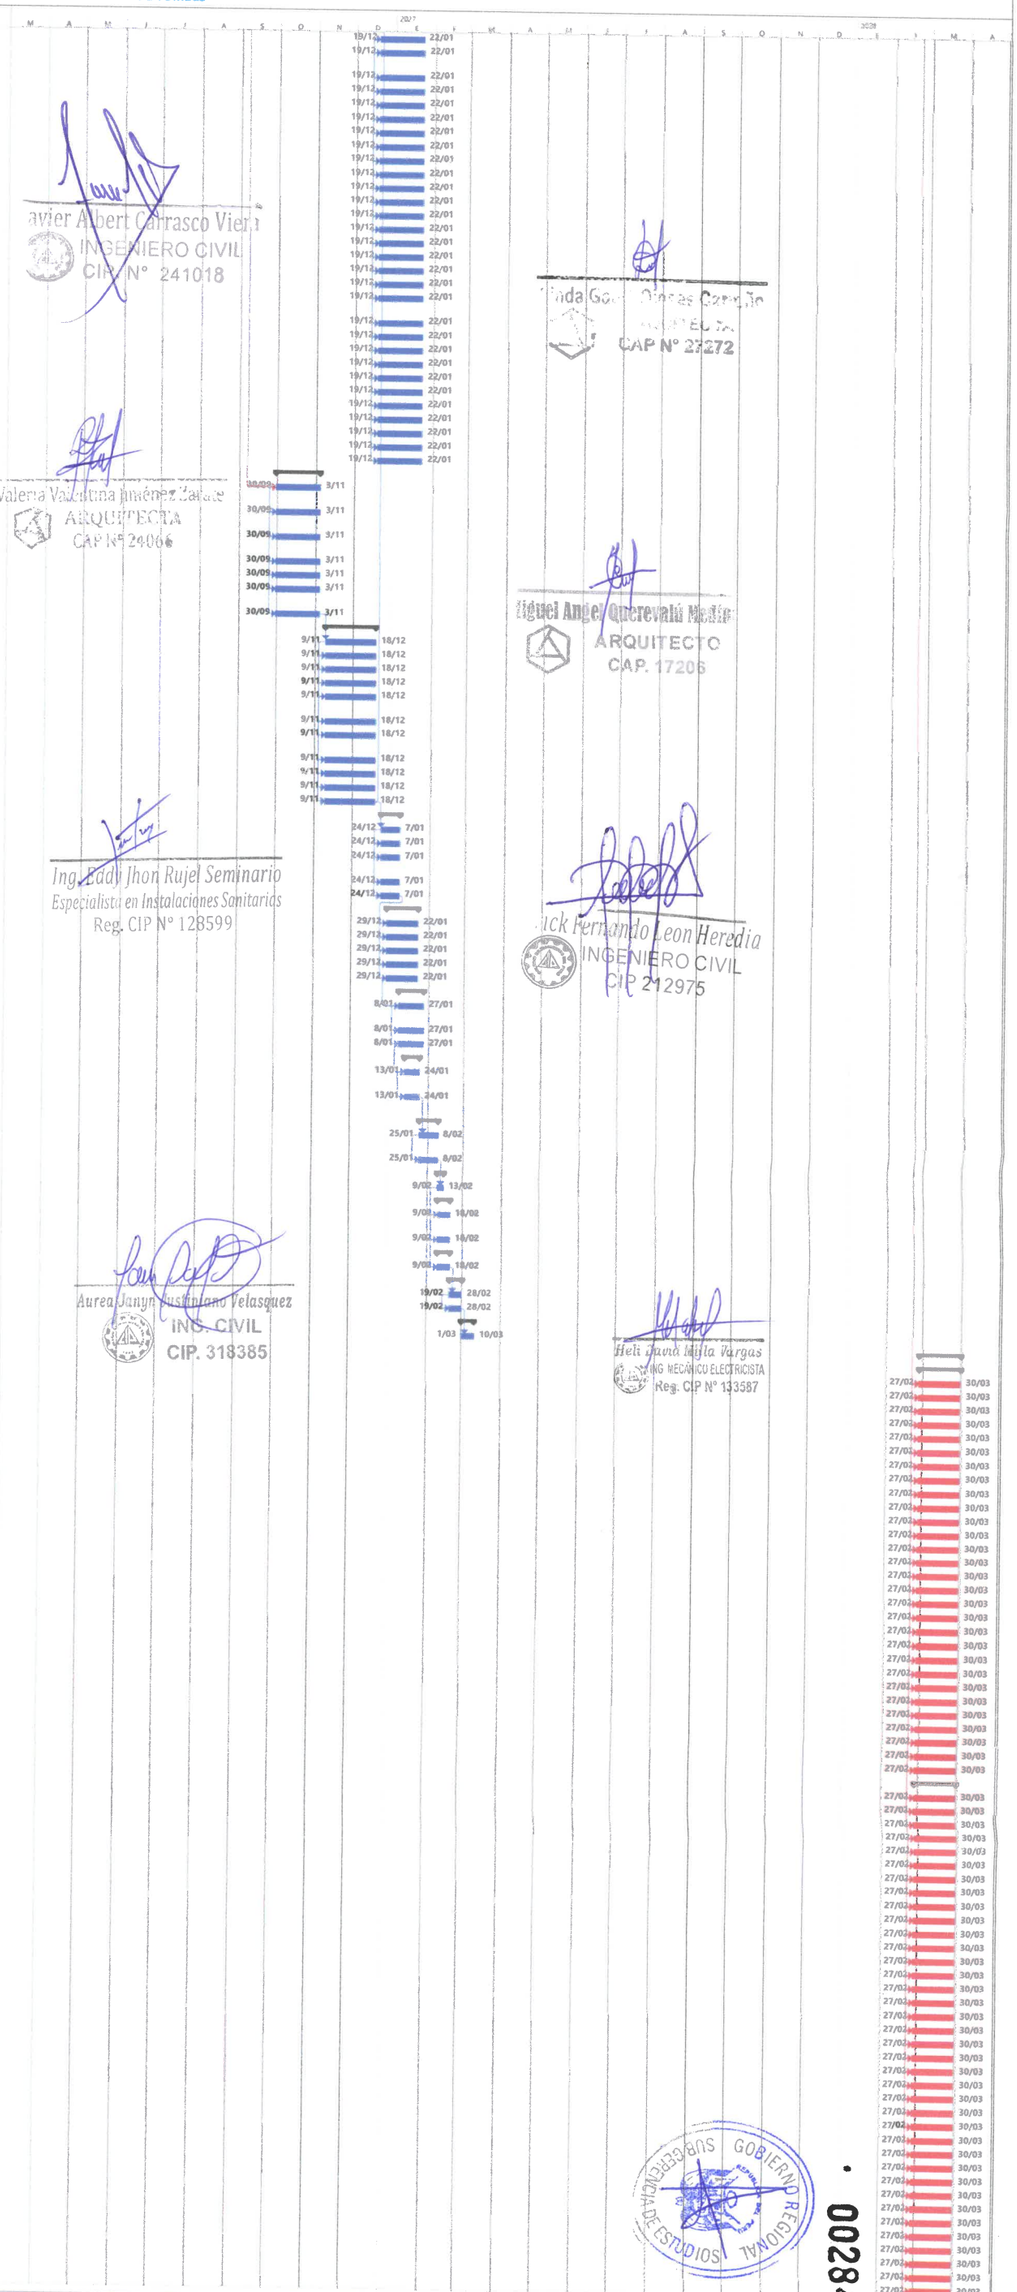

Proyecto: Proyecto2
Fecha: jue 8/01/26

Tarea · Division · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Agrupar por síntesis · Tarea resumida · Tarea critica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Fecha límite · Tarea critica · Progreso

002847

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin	Predecesoras
706	06.02.38	ESCRITORIO TIPO L-2	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	705CC
707	06.02.39	SOFA 4 CUERPOS	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	706CC
708	06.02.40	ESTANTE METALICO 5 DIVISIONES	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	707CC
709	06.02.41	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.41 M X 0.45 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	708CC
710	06.02.42	MESA RECTANGULAR (1.50 M X0.90 M X0.75 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	709CC
711	06.02.43	ESTANTE PARA DEPOSITO DE LIBROS 3.30 x 0.60 h=2.50	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	710CC
712	06.02.44	ESTANTE PARA DEPOSITO DE LIBROS 3.40 x 0.60 h=2.50	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	711CC
713	06.02.45	ESTANTE PARA DEPOSITO DE LIBROS 3.63 x 0.60 h=2.50	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	712CC
714	06.03	MOBILIARIO - TERCER NIVEL	**33 días**	**dom 27/02/2**	**jue 30/03/28**	
715	06.03.01	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.36 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	713CC
716	06.03.02	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60m x 0.50m x 0.66m)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	715CC
717	06.03.03	PIZARRA ACRÍLICA DE (4.20 M X 1.20 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	716CC
718	06.03.04	MESA RECTANGULAR PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	717CC
719	06.03.05	SILLA PARA DOCENTE	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	718CC
720	06.03.06	ARMARIO 4 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	719CC
721	06.03.07	PANTALLA ECRAN RETRACTIL DE 150"	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	720CC
722	06.03.08	ESCRITORIO CON CAJONERA PARA DOCENTE (1.20 M X 0.60 M X 0.75 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	721CC
723	06.03.09	MESA RECTANGULAR (1.00 M X2.00 M X0.66 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	722CC
724	06.03.10	ESTANTE METALICO (1.50m x 0.60M X 2.00M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	723CC
725	06.03.11	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.30 M X 0.34 M X 0.34 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	724CC
726	06.03.12	MESA RECTANGULAR (1.00 M X2.00 M X0.61 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	725CC
727	06.03.13	PIZARRA ACRÍLICA DE (3.20 M X 1.20 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	726CC
728	06.03.14	MESA RECTANGULAR (1.20 M X 0.80 M X 0.75 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	727CC
729	06.03.15	CREDENZA CON LLAVE (1.20x0.40mx0.70m)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	728CC
730	06.03.16	ARCHIVADORES 0.45 M X 0.70 M	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	729CC
731	06.03.17	ANAQUELES METALICOS (0.95 M X 0.45 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	730CC
732	06.03.18	SILLA GERENCIAL GIRATORIA	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	731CC
733	06.03.19	ESCRITORIO TIPO L1	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	732CC
734	06.03.20	LOCKERS (0.40 M X 0.45 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	733CC
735	06.03.21	MESAS MODULARES (1.00 M X 1.00 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	734CC
736	06.03.22	MESA DE TRABAJO 2.40 M X 0.60	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	735CC
737	06.03.23	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.40 M X 0.42 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	736CC
738	06.03.24	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.72 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	737CC
739	06.03.25	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38M X 0.41M X 0.45M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	738CC
740	06.03.26	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.75 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	739CC
741	06.03.27	MESA RECTANGULAR (2.06 M X1.00 M X0.75 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	740CC
742	06.04	MOBILIARIO - CUARTO NIVEL	**33 días**	**dom 27/02/2**	**jue 30/03/28**	
743	06.04.01	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.36 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	741CC
744	06.04.02	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60m x 0.50m x 0.66m)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	743CC
745	06.04.03	PIZARRA ACRÍLICA DE (4.20 M X 1.20 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	744CC
746	06.04.04	MESA RECTANGULAR PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	745CC
747	06.04.05	SILLA PARA DOCENTE	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	746CC
748	06.04.06	ARMARIO 4 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	747CC
749	06.04.07	PANTALLA ECRAN RETRACTIL DE 150"	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	748CC
750	06.04.08	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38M X 0.41M X 0.45M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	749CC
751	06.04.09	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.75 M)	33 días	dom 27/02/2	jue 30/03/28	750CC
752	06.05	EQUIPAMIENTO - PRIMER NIVEL	**31 días**	**mar 29/02/2**	**jue 30/03/28**	
753	06.05.01	COMPUTADORA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	751CC+2 dias
754	06.05.02	ESTABILIZADOR	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	753CC
755	06.05.03	KIT DE DISEÑO O TRABAJO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	754CC
756	06.05.04	KIT SISTEMA SOLAR	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	754CC
757	06.05.05	PROYECTOR MULTIMEDIA, INCLUYE RACK	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	756CC
758	06.05.06	LAPTOP	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	757CC
759	06.05.07	MICROSCOPIOS ELECTRONICOS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	758CC
760	06.05.08	BALANZA DIGITAL	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	759CC
761	06.05.09	MECHEROS BUNSEN	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	760CC
762	06.05.10	MECHEROS DE ALCOHOL	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	761CC
763	06.05.11	PINZAS DE METAL	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	762CC
764	06.05.12	REJILLAS CON ASBESTO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	763CC
765	06.05.13	MULTIMETRO ANALOGICO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	764CC
766	06.05.14	PECERAS DE VIDRIO CON ACCESORIOS COMPLETOS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	765CC
767	06.05.15	TERRARIOS GRANDES	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	766CC
768	06.05.16	ESQUELETO HUMANO INTERACTIVO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	767CC
769	06.05.17	TORSO HUMANO INTERACTIVO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	768CC
770	06.05.18	KIT DE ESPECIALIDAD DE CIENCIAS NATURALES	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	769CC
771	06.05.19	PARLANTE DE AUDIO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	770CC
772	06.05.20	CALCULADORAS CIENTIFICAS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	771CC
773	06.06	EQUIPAMENTO - SEGUNDO NIVEL	**31 días**	**mar 29/02/2**	**jue 30/03/28**	
774	06.06.01	COMPUTADORA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	772CC
775	06.06.02	ESTABILIZADOR	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	774CC
776	06.06.03	KIT DE DISEÑO O TRABAJO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	775CC
777	06.06.04	KIT SISTEMA SOLAR	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	776CC
778	06.06.05	LAPTOP	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	777CC
779	06.06.06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	778CC
780	06.06.07	PROYECTOR MULTIMEDIA, INCLUYE RACK	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	779CC
781	06.06.08	REFRIGERADORA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	780CC
782	06.06.09	LICUADORA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	781CC
783	06.06.10	MICROONDAS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	782CC
784	06.06.11	CONGELADORA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	783CC
785	06.06.12	TV 42" INCLUYE RACK	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	784CC
786	06.06.13	COCINA DE 4 HORNILLAS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	785CC
787	06.06.14	BALON DE GAS Y ACCESORIOS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	786CC
788	06.06.15	MICROSCOPIOS ELECTRONICOS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	787CC
789	06.06.16	BALANZA DIGITAL	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	788CC
790	06.06.17	MECHEROS BUNSEN	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	789CC
791	06.06.18	MECHEROS DE ALCOHOL	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	790CC
792	06.06.19	PINZAS DE METAL	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	791CC
793	06.06.20	REJILLAS CON ASBESTO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	792CC
794	06.06.21	MULTIMETRO ANALOGICO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	793CC
795	06.06.22	PECERAS DE VIDRIO CON ACCESORIOS COMPLETOS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	794CC
796	06.06.23	TERRARIOS GRANDES	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	795CC
797	06.06.24	ESQUELETO HUMANO INTERACTIVO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	796CC
798	06.06.25	TORSO HUMANO INTERACTIVO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	797CC
799	06.06.26	KIT DE ESPECIALIDAD DE CIENCIAS NATURALES	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	798CC
800	06.06.27	PIZARRA INTERACTIVA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	799CC
801	06.06.28	PARLANTE DE AUDIO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	800CC
802	06.06.29	CALCULADORAS CIENTIFICAS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	801CC
803	06.07	EQUIPAMENTO - TERCER NIVEL	**31 días**	**mar 29/02/2**	**jue 30/03/28**	
804	06.07.01	PROYECTOR MULTIMEDIA, INCLUYE RACK	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	802CC
805	06.07.02	PIZARRA INTERACTIVA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	804CC
806	06.07.03	COMPUTADORA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	805CC
807	06.07.04	ESTABILIZADOR	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	806CC
808	06.07.05	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	807CC
809	06.07.06	LAPTOP	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	808CC
810	06.07.07	FRIGOBAR	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	809CC
811	06.07.08	MICROONDAS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	810CC
812	06.08	EQUIPAMENTO - CUARTO NIVEL	**31 días**	**mar 29/02/2**	**jue 30/03/28**	
813	06.08.01	PROYECTOR MULTIMEDIA, INCLUYE RACK	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	811CC
814	06.09	EQUIPO DE EDUCACION FISICA	**31 días**	**mar 29/02/2**	**jue 30/03/28**	
815	06.09.01	PARANTES CON SISTEMA TELESCOPICO, INC. NET Y DADO CONCRETO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	813CC
816	06.09.02	SILBATOS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	815CC
817	06.09.03	PELOTAS DE BASQUET N°7	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	816CC
818	06.09.04	TABURETES DE MADERA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	817CC
819	06.09.05	CRONOMETRO DIGITAL A PILAS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	818CC
820	06.09.06	PELOTAS DE VOLEY	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	819CC
821	06.09.07	PELOTAS DE FUTBOL N°5	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	820CC
822	06.09.08	BALANZA ELECTRONICA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	821CC
823	06.09.09	COLCHONETAS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	822CC
824	06.09.10	PESA DE 20 KG CONVERTIBLE	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	823CC
825	06.09.11	PESAS RUSAS 6.6 KG	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	824CC
826	06.09.12	SOGA PARA SALTAR CON PESO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	825CC
827	06.09.13	CENTRO DE JUEGOS DE MADERA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	826CC
828	06.09.14	JUEGO DE CONOS PARA DEPORTE	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	827CC
829	06.10	EQUIPAMIENTO BANDA	**31 días**	**mar 29/02/2**	**jue 30/03/28**	
830	06.10.01	TROMPETA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	828CC
831	06.10.02	BOMBO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	830CC
832	06.10.03	TAROLA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	831CC
833	06.10.04	SET DE PLATILLOS	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	832CC
834	06.10.05	PANDERETA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	833CC
835	06.10.06	BAJO DE VIENTO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	834CC
836	06.10.07	LIRA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	835CC
837	06.10.08	TROMBON DE VARA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	836CC
838	06.10.09	CORNETA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	837CC
839	06.10.10	CLARINETE	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	838CC
840	06.10.11	SAXO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	839CC
841	06.10.12	TAMBORES	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	840CC
842	06.11	TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO	**31 días**	**mar 29/02/2**	**jue 30/03/28**	
843	06.11.01	TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OBRA	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	841CC
844	06.11.02	COLOCACION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	31 días	mar 29/02/2	jue 30/03/28	814CC
845		FIN	0 días	jue 30/03/28	jue 30/03/28	844

Javier Albert Carrasco Vieira
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 111113

Linda Gaudi Dioses Carrillo
ARQUITECTA
CAP N° 27272

Valeria Valentina Jiménez Zarate
ARQUITECTA
CAP N° 24066

Miguel Angel Quecevala Mallo
ARQUITECTO
CAP. 17206

Ing. Eddy Leon Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 128599

Jack Fernando Leon Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Aurea Janyn Castiniano Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 318385

Heli David Milla Vargas
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 133587

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS GOBIERNO REGIONAL TUMBES

002846

Proyecto: Proyecto2
Fecha: jue 8/01/26

Tarea · Division · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Agrupar por sinteris · Tarea resumida · Tarea crítica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Fecha límite · Tarea crítica · Progreso
