



RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL

CPM - RUTA CRITICA

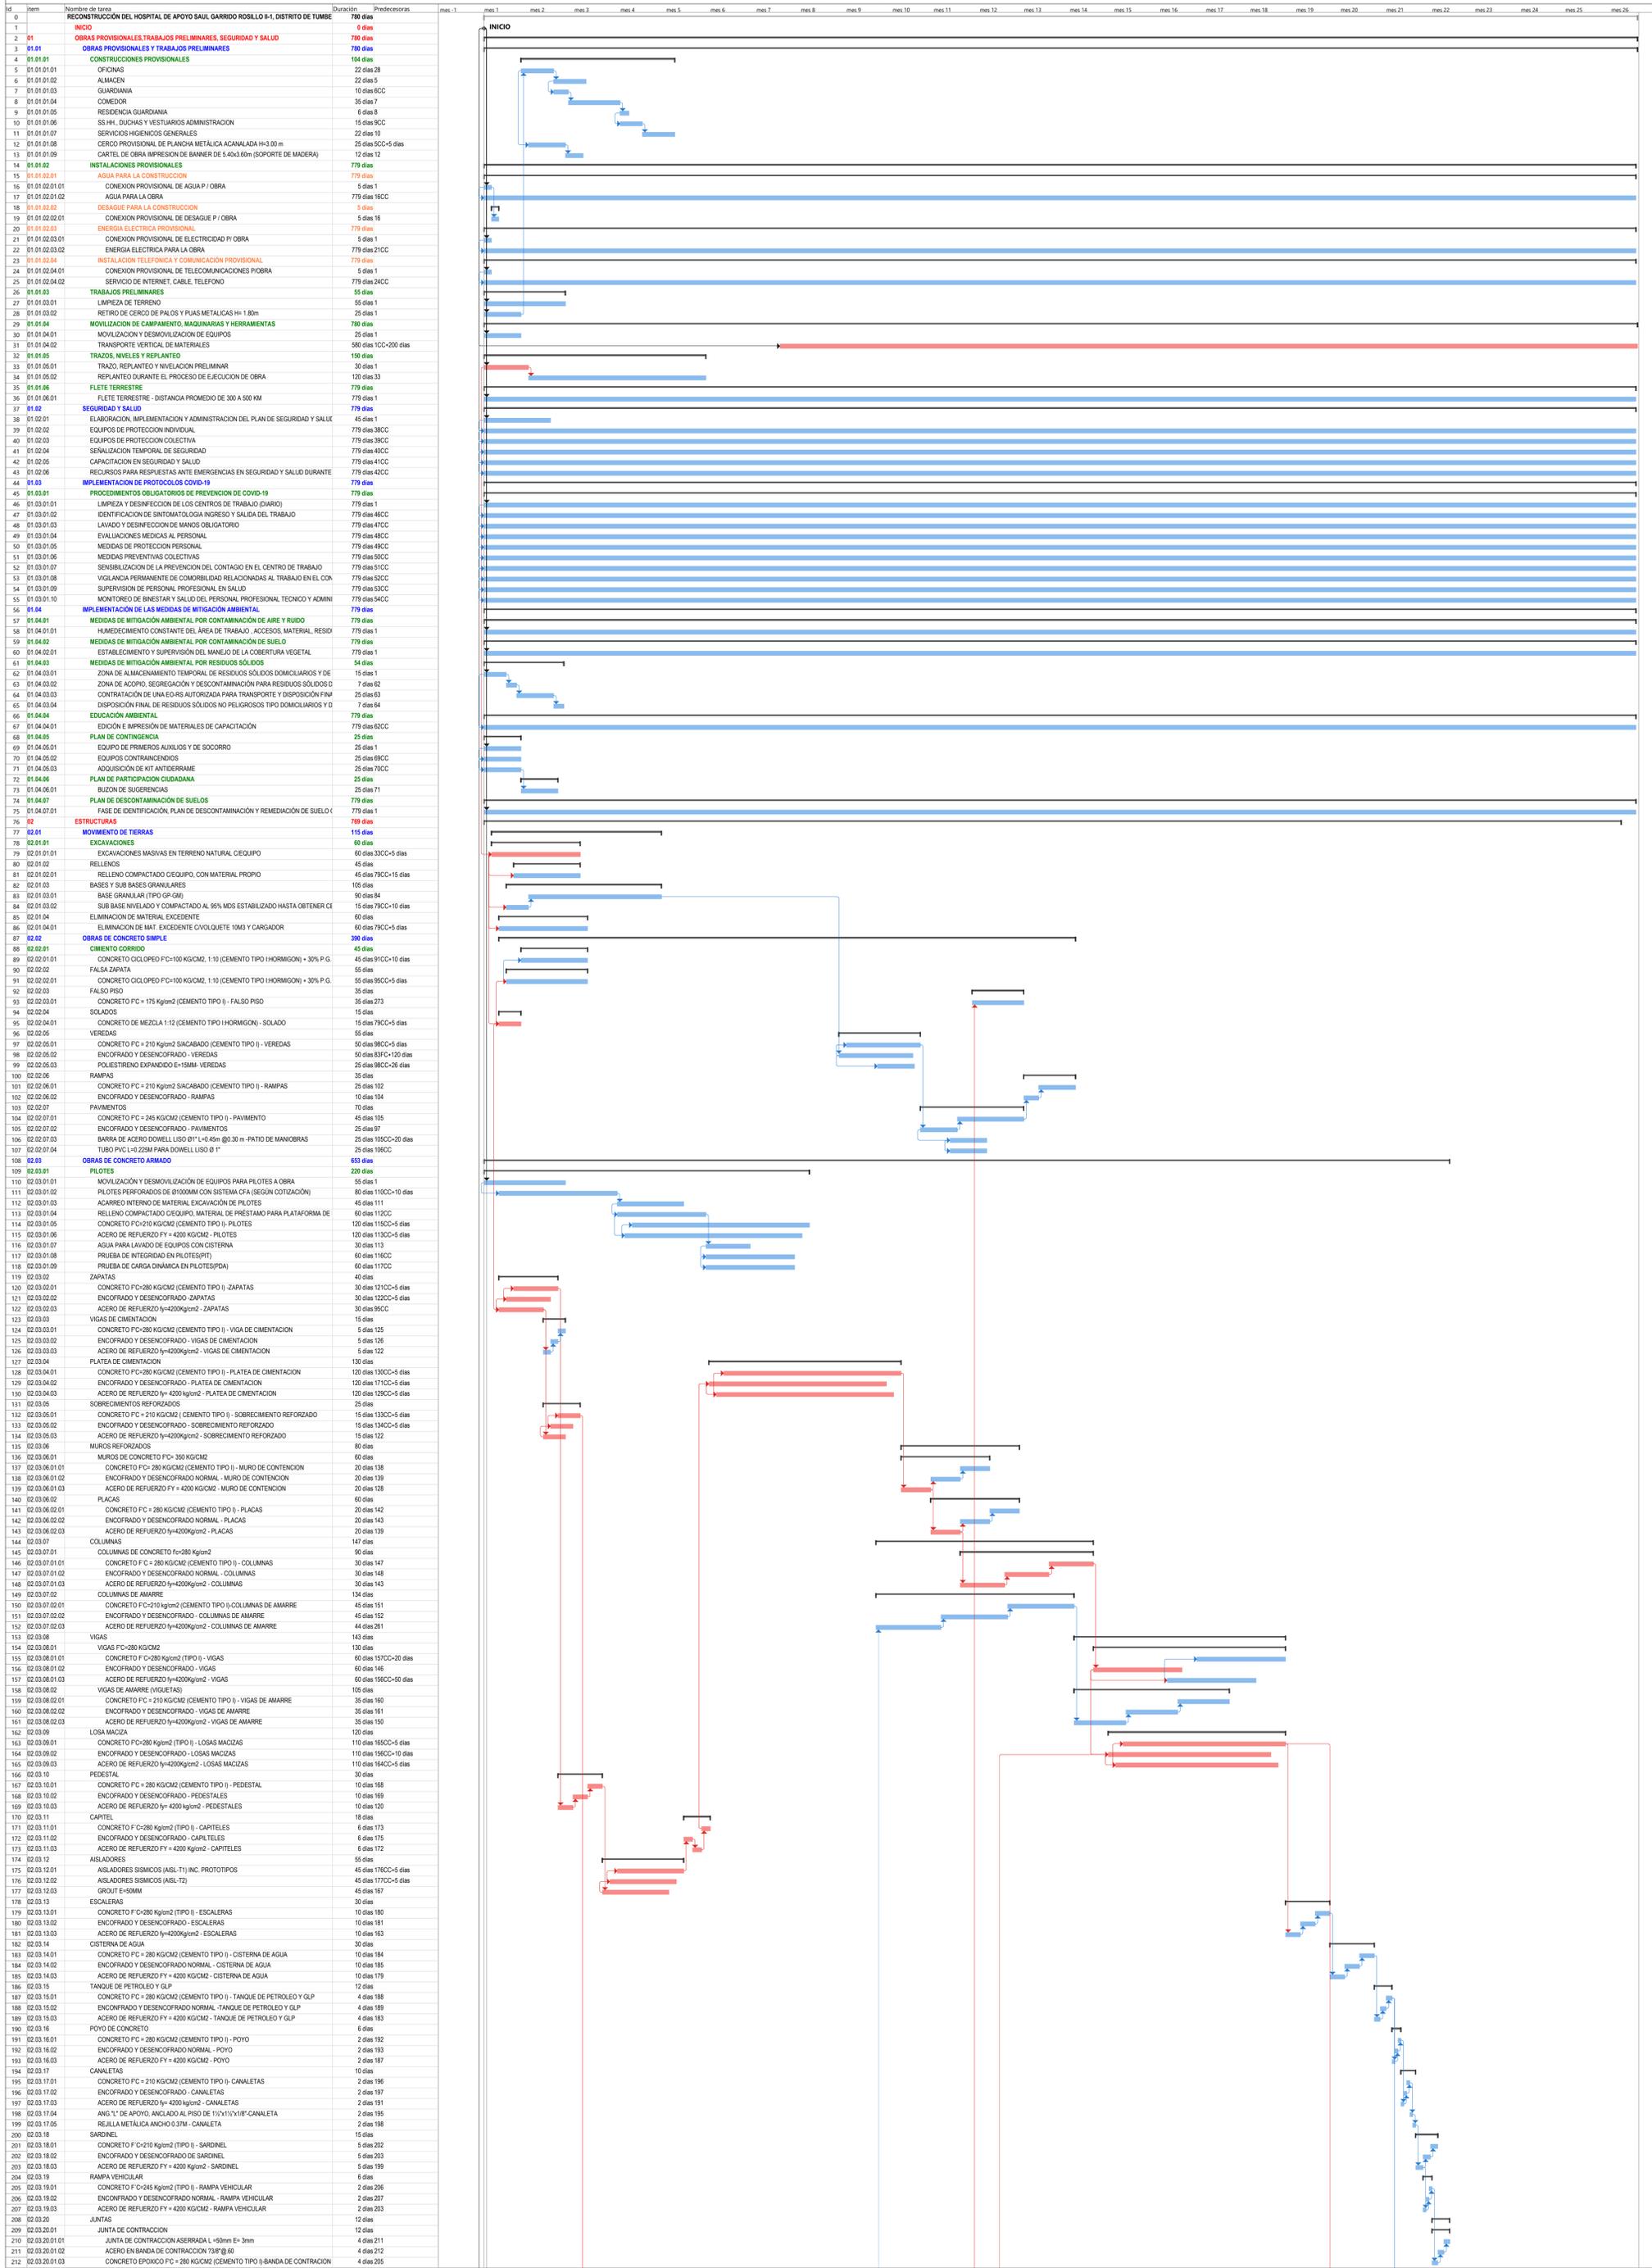


RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL

CPM - RUTA CRITICA

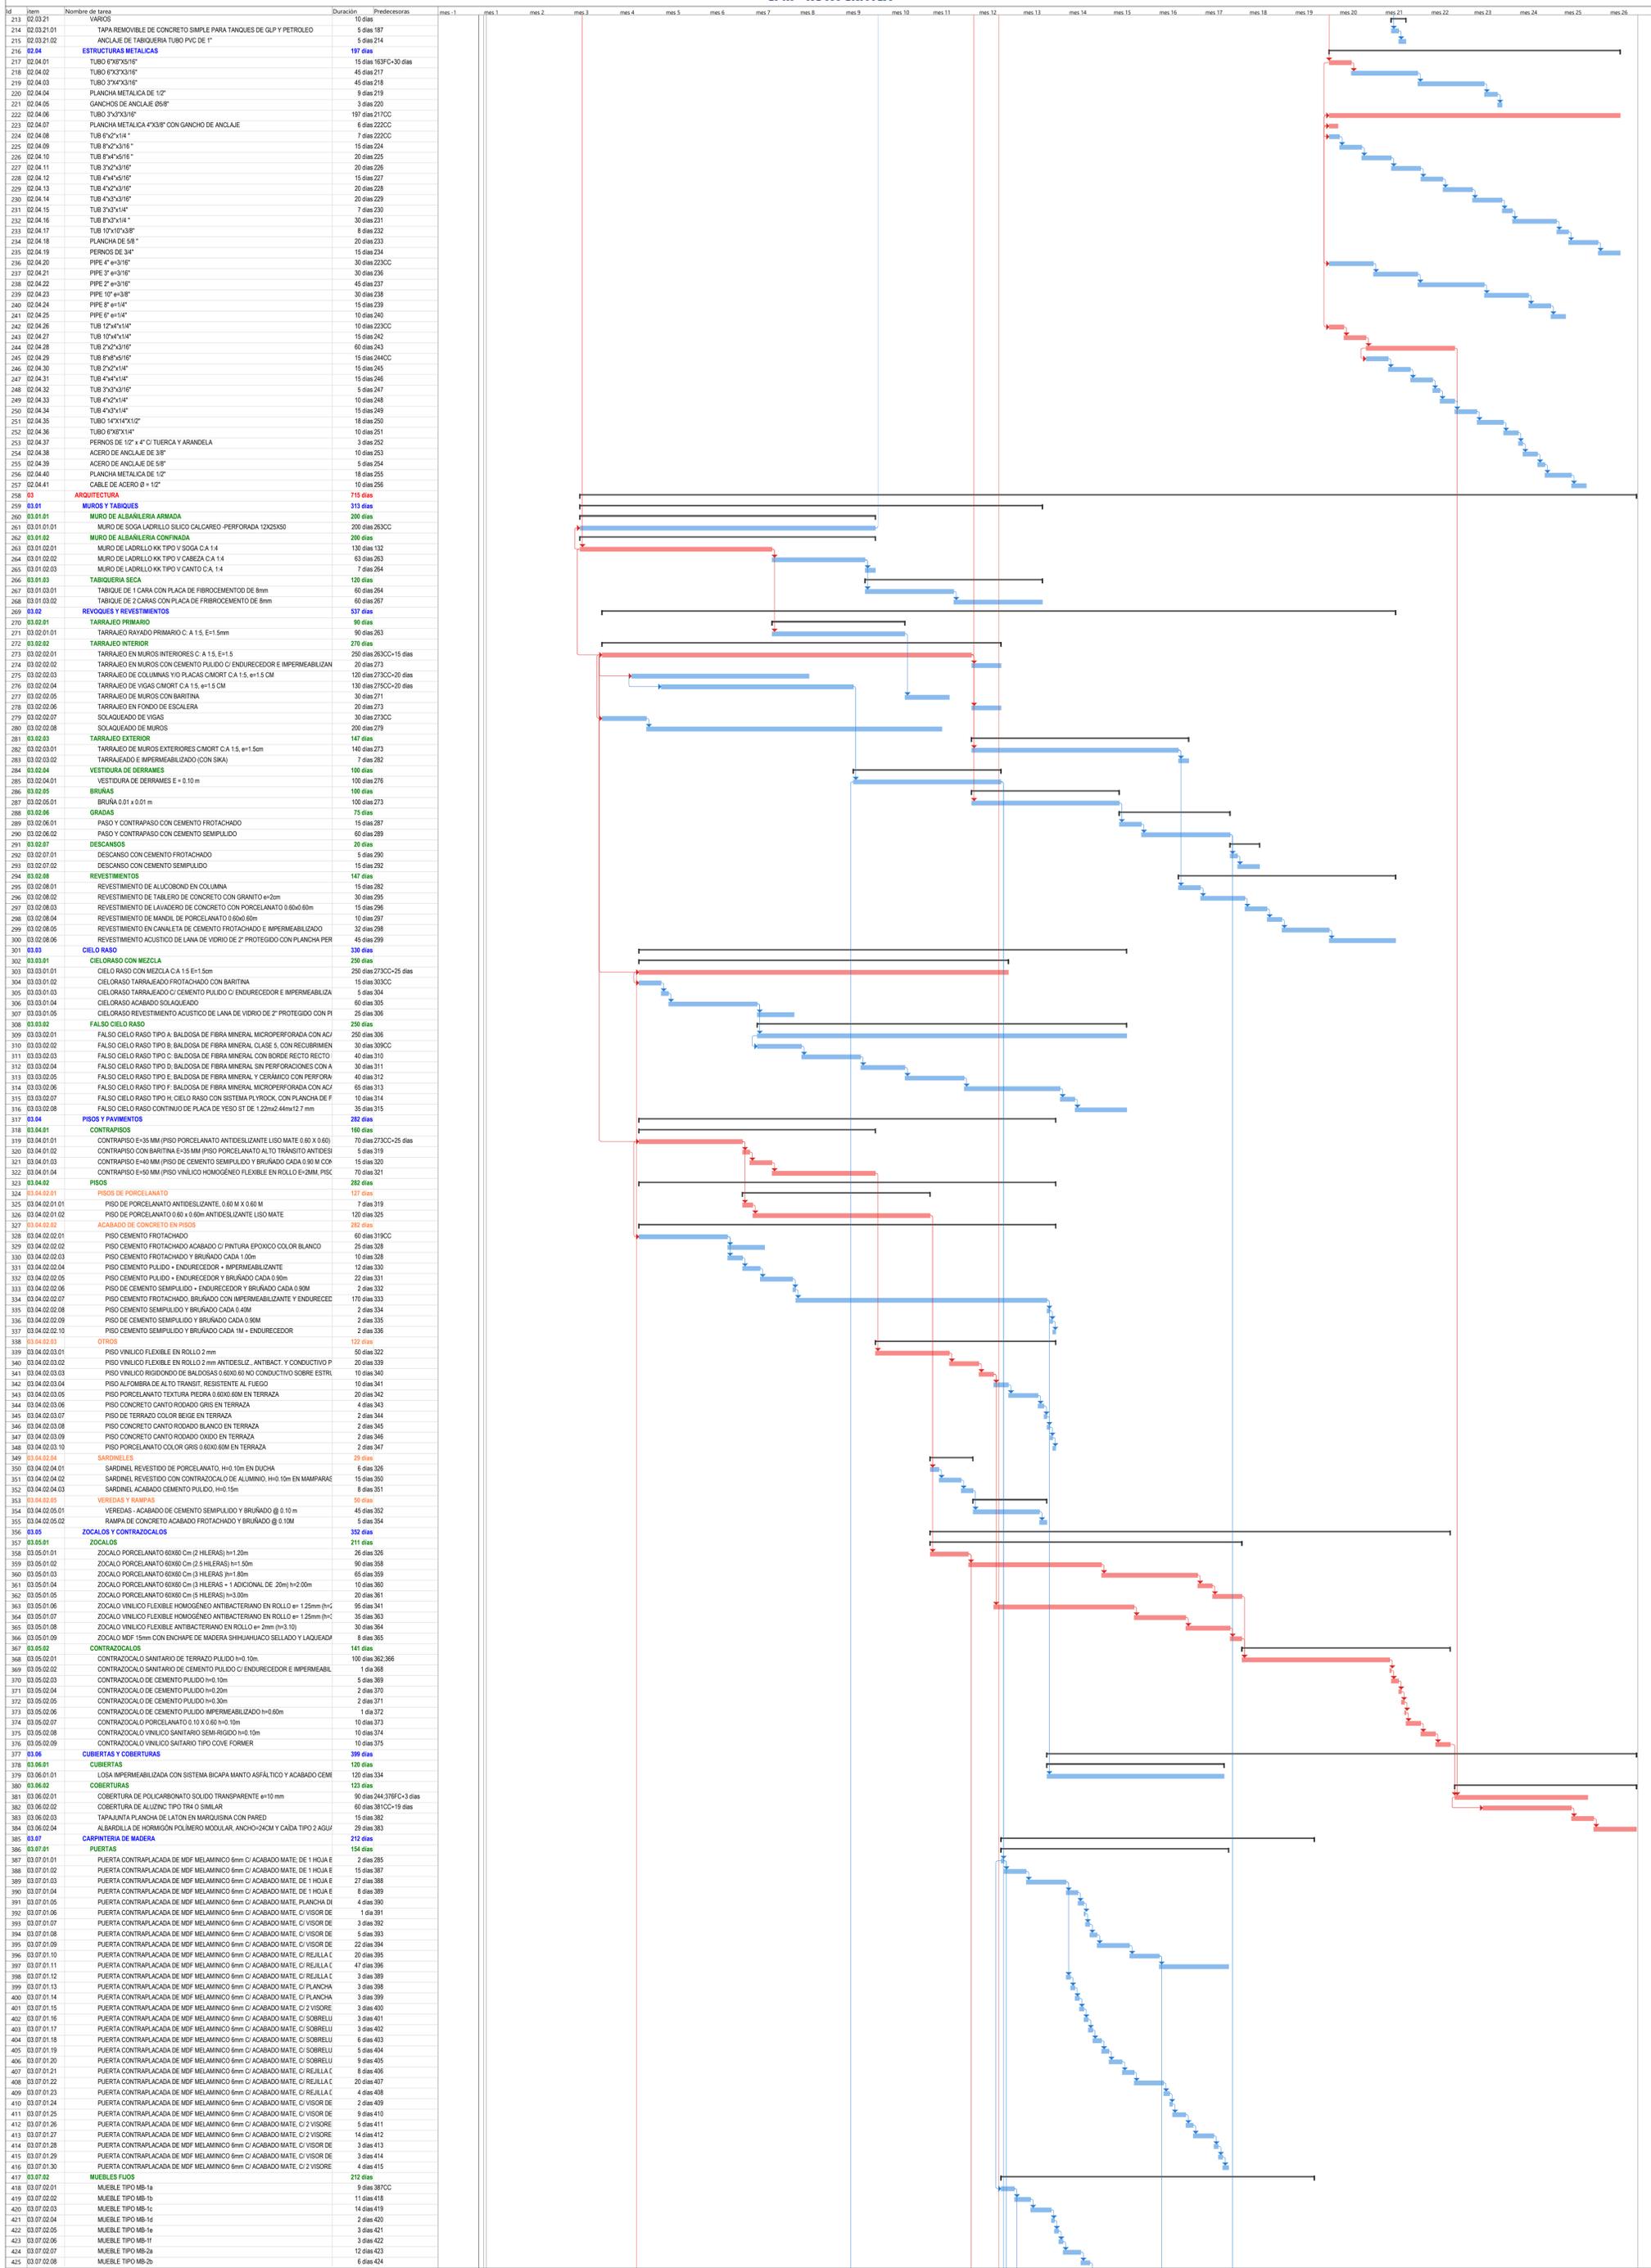

RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL


CPM - RUTA CRITICA

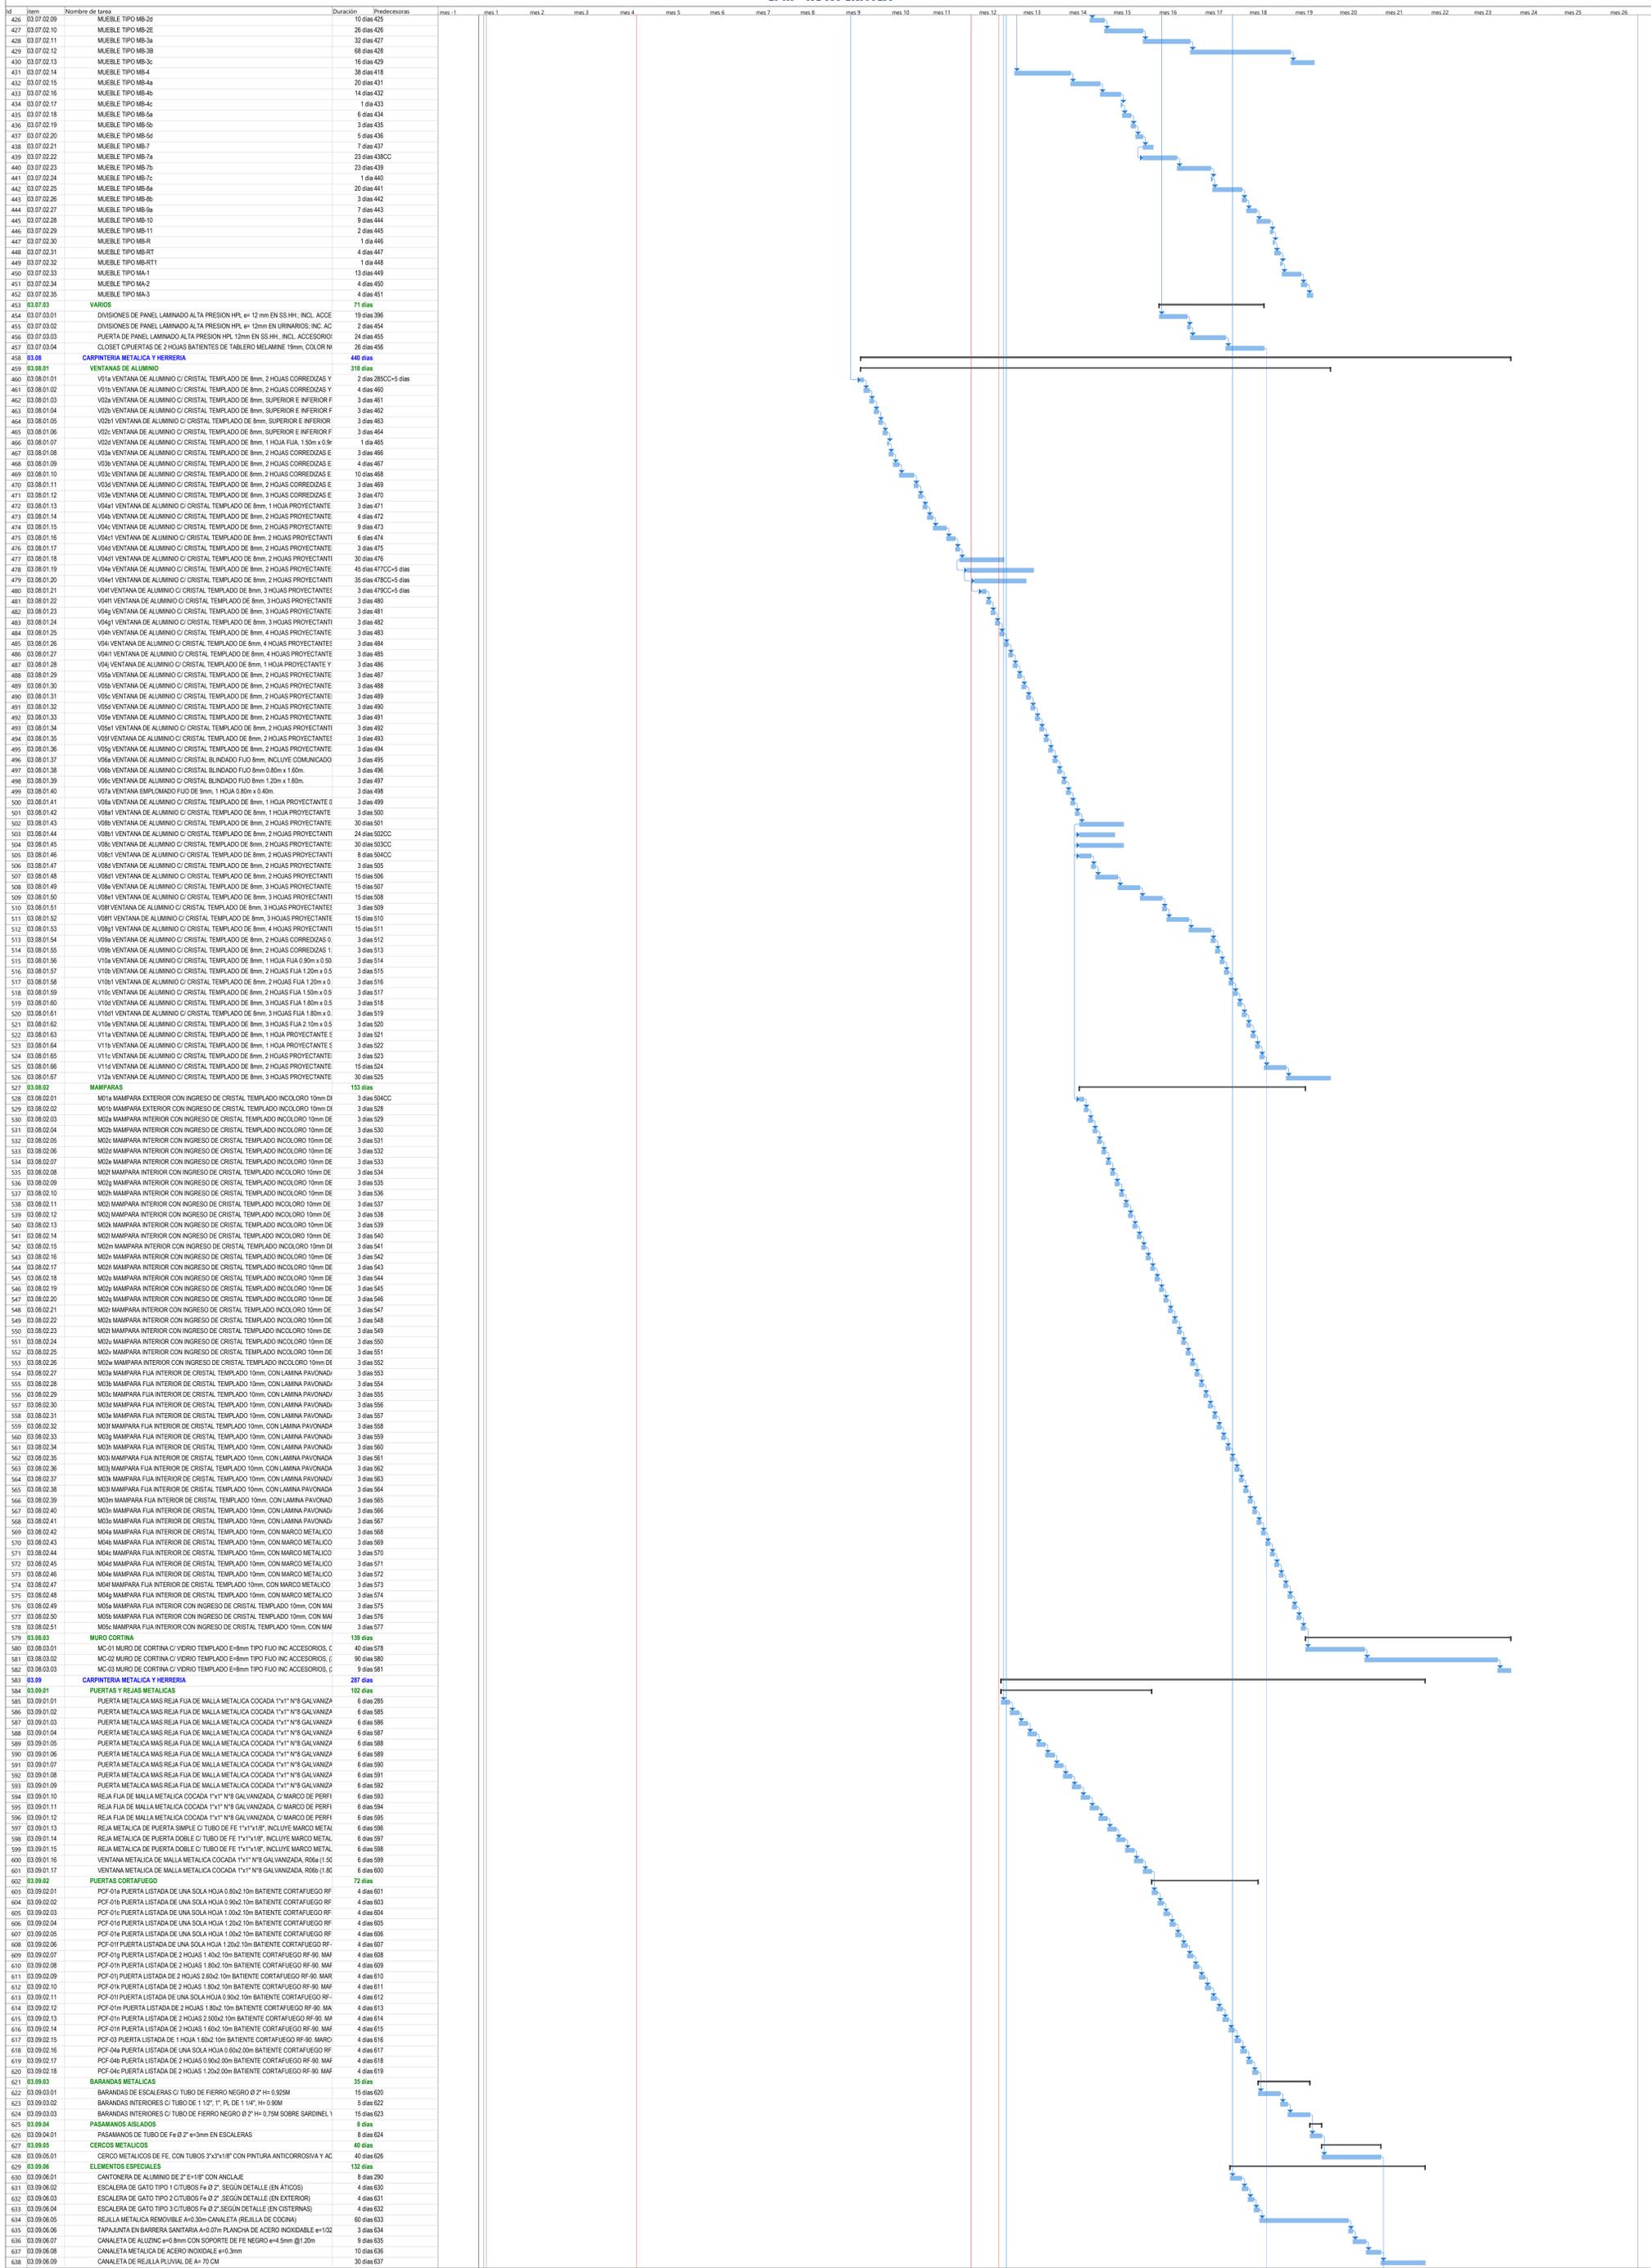

Proyecto	Reconstrucción	Tarea	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Resumen inactivo	Tarea manual	Informe de resumen manual	solo el comienzo	3	Tareas externas	Hito externo	Fecha límite	Tareas críticas	División crítica	Progreso manual	Progreso
----------	----------------	-------	------	----------------------	---------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	---	-----------------	--------------	--------------	-----------------	------------------	-----------------	----------

RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL

CPM - RUTA CRITICA

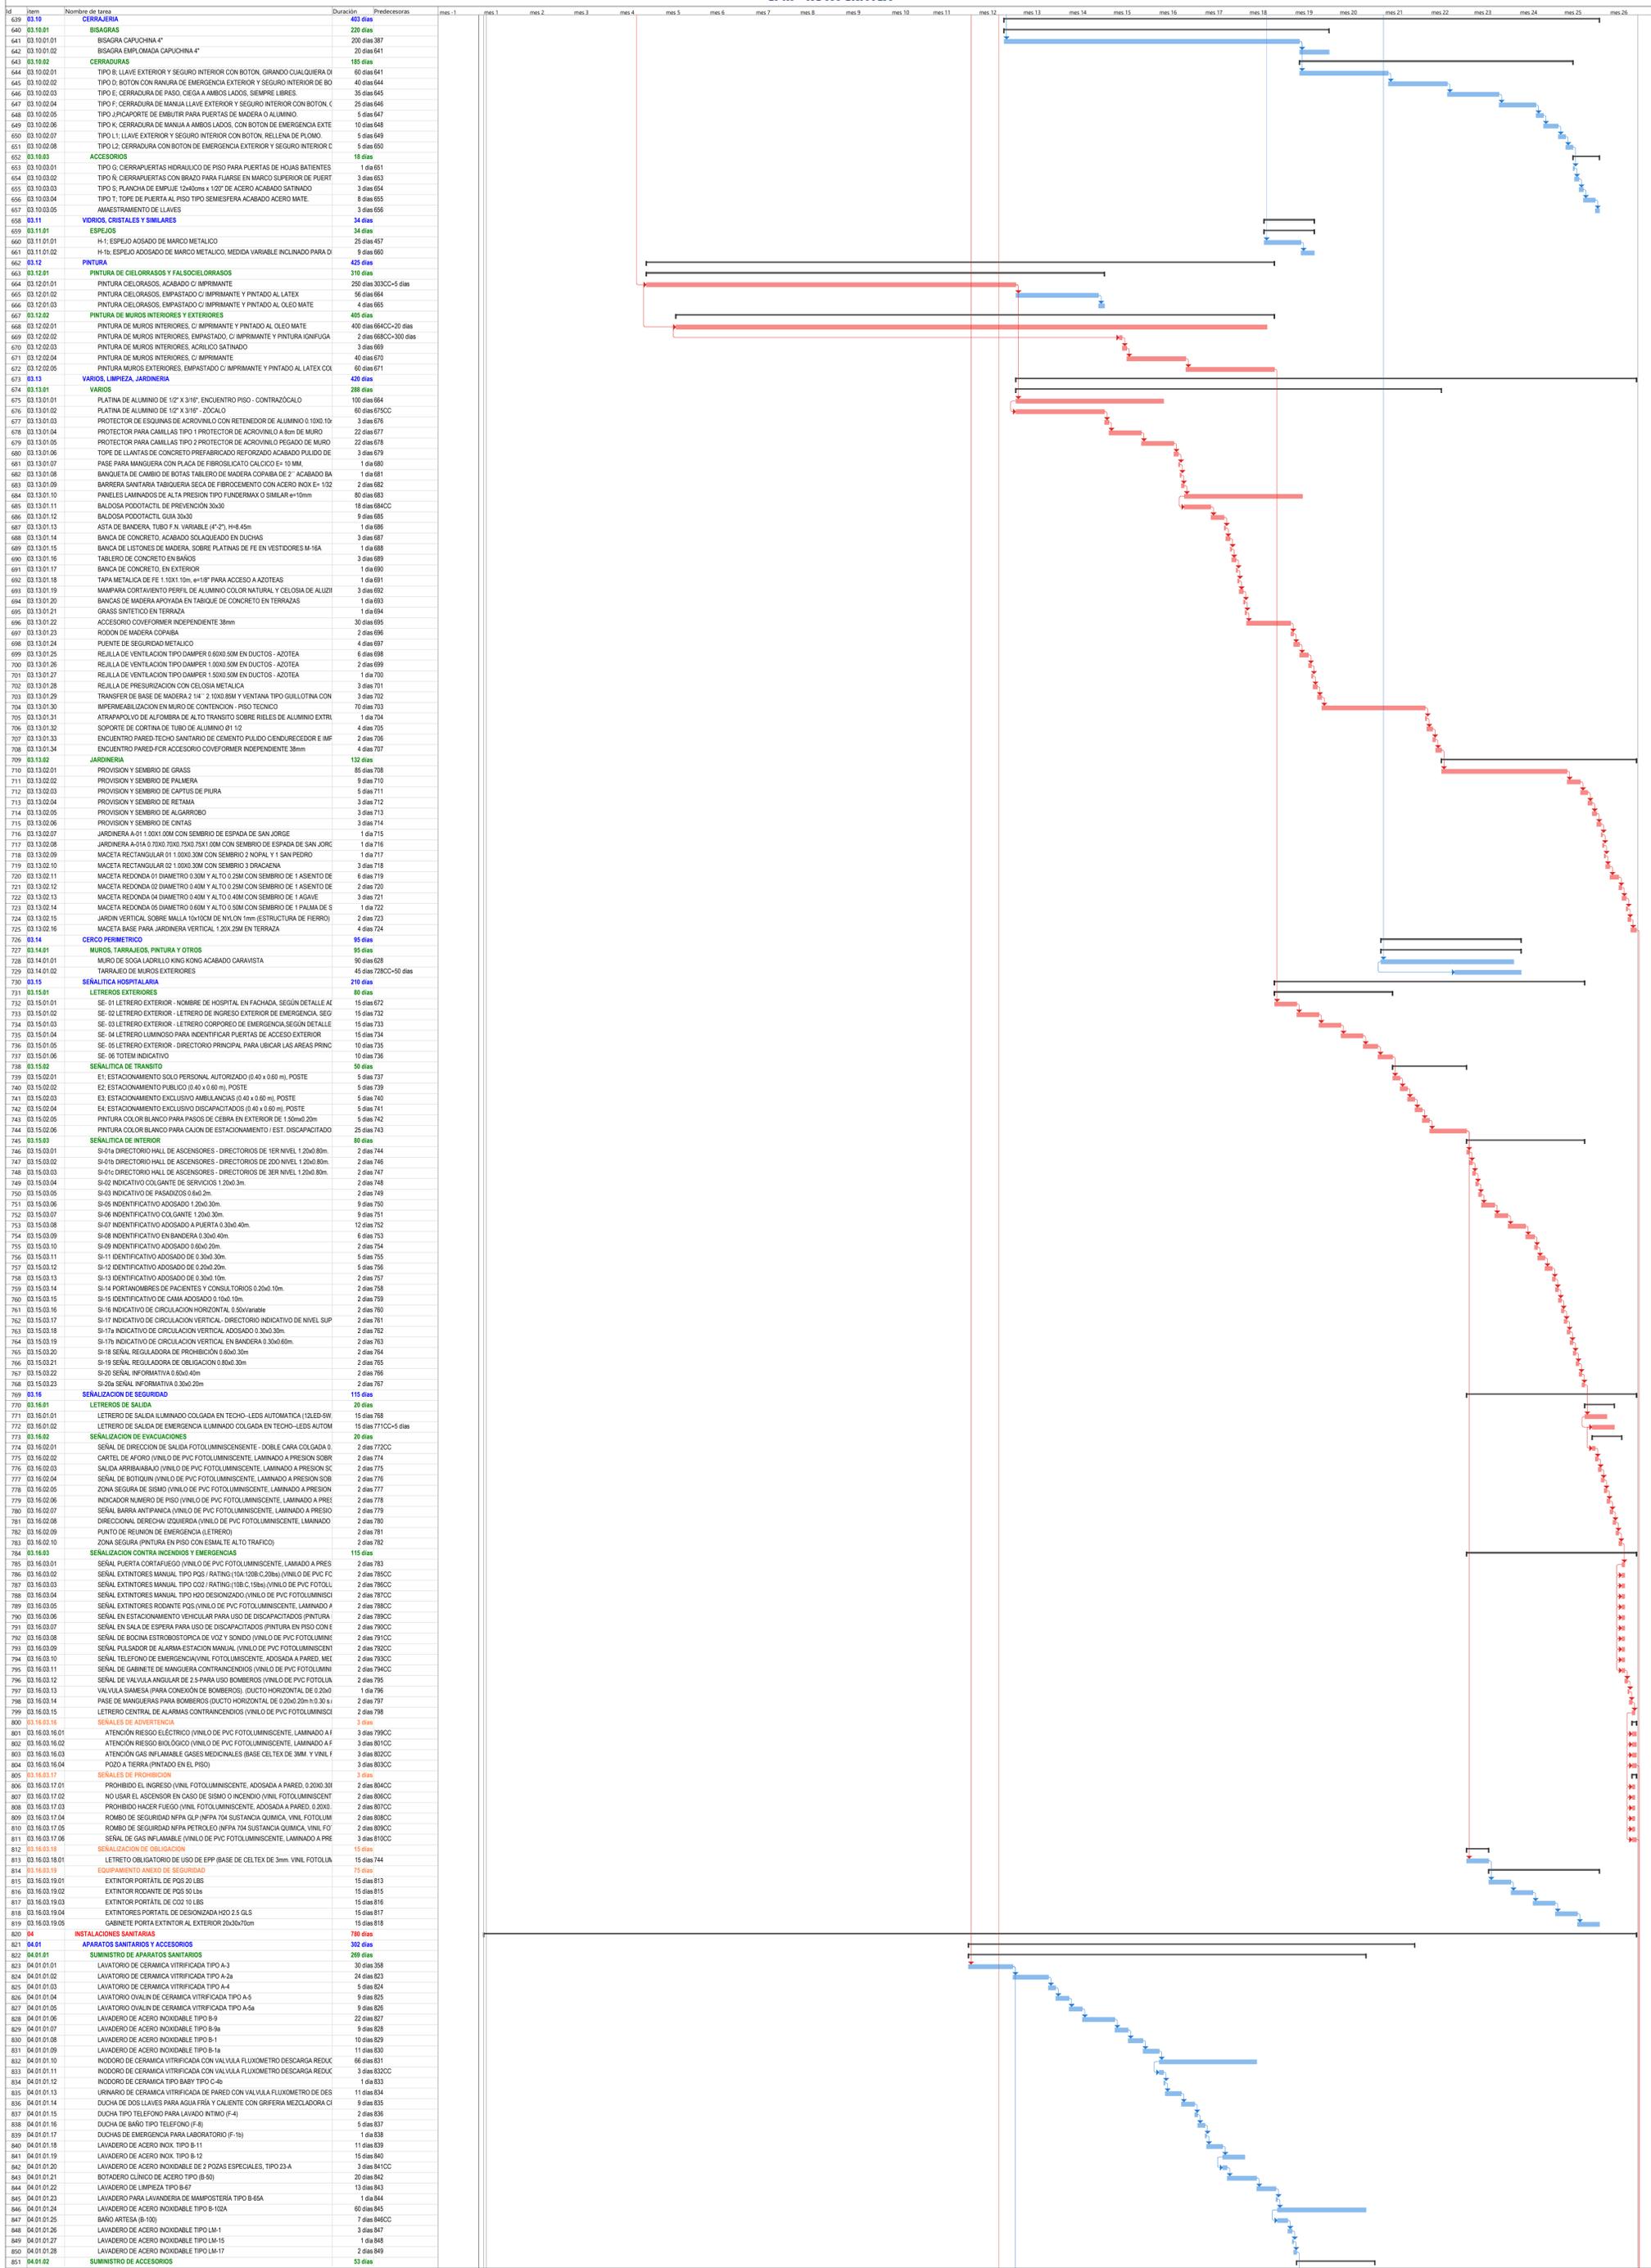

Item	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25
639	03.10	<b>CERRAJERIA</b>																										
640	03.10.01	BISAGRAS																										
641	03.10.01.01	BISAGRA CAPUCHINA 4"																										
642	03.10.01.02	BISAGRA EMPLOMADA CAPUCHINA 4"																										
643	03.10.02	<b>CERRADURAS</b>																										
644	03.10.02.01	TIPO B: LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DI																										
645	03.10.02.02	TIPO D: BOTON CON RANURA DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BO																										
646	03.10.02.03	TIPO E: CERRADURA DE PASO, CERRA A AMBOS LADOS, SIEMPRE LIBRES																										
647	03.10.02.04	TIPO F: CERRADURA DE MANILLA LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, C																										
648	03.10.02.05	TIPO J: JAPICAPORTE DE EMBUTIR PARA PUERTAS DE MADERA O ALUMINIO																										
649	03.10.02.06	TIPO K: CERRADURA DE MANILLA A AMBOS LADOS, CON BOTON DE EMERGENCIA EXTE																										
650	03.10.02.07	TIPO L: LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, RELLENA DE PLOMO																										
651	03.10.02.08	TIPO M: CERRADURA CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR C																										
652	03.10.03	<b>ACCESORIOS</b>																										
653	03.10.03.01	TIPO G: CERRAPUERTAS HIDRAULICO DE PISO PARA PUERTAS DE HOJAS BATEDENTES																										
654	03.10.03.02	TIPO N: CERRAPUERTAS CON BRAZO PARA FLARSE EN MARCO SUPERIOR DE PUERT																										
655	03.10.03.03	TIPO S: PLANCHA DE EMPUJE 12x40cm x 1/2" DE ACERO ACABADO SATINADO																										
656	03.10.03.04	TIPO T: TOPE DE PUERTAS AL PISO TIPO SEMIESFERA ACABADO ACERO MATE																										
657	03.10.03.05	ARMASERVIAMIENTO DE LLAVES																										
658	03.11	<b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>																										
659	03.11.01	<b>ESPEJOS</b>																										
660	03.11.01.01	H-1: ESPEJO ADOSSADO DE MARCO METALICO																										
661	03.11.01.02	H-1b: ESPEJO ADOSSADO DE MARCO METALICO, MEDIDA VARIABLE INCLINADO PARA DI																										
662	03.12	<b>PINTURA</b>																										
663	03.12.01	<b>PINTURA DE CIELORRASOS Y FALSOCIELORRASOS</b>																										
664	03.12.01.01	PINTURA CIELORRASOS, ACABADO C/ IMPRIMANTE																										
665	03.12.01.02	PINTURA CIELORRASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX																										
666	03.12.01.03	PINTURA CIELORRASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE																										
667	03.12.02	<b>PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES</b>																										
668	03.12.02.01	PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE																										
669	03.12.02.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EMPASTADO, C/ IMPRIMANTE Y PINTURA KGNFUGA																										
670	03.12.02.03	PINTURA DE MUROS INTERIORES, ACRILICO SATINADO																										
671	03.12.02.04	PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE																										
672	03.12.02.05	PINTURA MUROS EXTERIORES, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX CO																										
673	03.13	<b>VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA</b>																										
674	03.13.01	<b>VARIOS</b>																										
675	03.13.01.01	PLATINA DE ALUMINO DE 12" X 31/8", ENCUNTRRO PISO - CONTRAZÓCALO																										
676	03.13.01.02	PLATINA DE ALUMINO DE 12" X 31/8", ZÓCALO																										
677	03.13.01.03	PROTECTOR DE ESQUINAS DE ACRÓVINOYL CON RETENEDOR DE ALUMINO Ø 10x10 10x																										
678	03.13.01.04	PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 1 PROTECTOR DE ACRÓVINOYL 48cm DE MURO																										
679	03.13.01.05	PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 2 PROTECTOR DE ACRÓVINOYL PEGADO DE MURO																										
680	03.13.01.06	TOPE DE LLANTAS DE CONCRETO PREFABRICADO REFORZADO ACABADO PULIDO DE																										
681	03.13.01.07	PASE PARA MANGUERA CON PLACA DE FIBROSLICATO CALCICO E= 10 MM.																										
682	03.13.01.08	BANQUETA DE CAMBIO DE BOTAS TABLERO DE MADERA COPABA DE 2" ACABADO BA																										
683	03.13.01.09	BARRERA SANITARIA TABQUERA SECA DE FIBROCEMENTO CON ACERO INOX E= 12																										
684	03.13.01.10	PANELES LAMINADOS DE ALTA PRESION TIPO FUNDERMAX O SIMILAR e=10mm																										
685	03.13.01.11	BALDOSA PODOCTIL DE PREVENCIÓN 30x30																										
686	03.13.01.12	BALDOSA PODOCTIL GUJA 30x30																										
687	03.13.01.13	ASTA DE BANDERA, TUBO F.N. VARIABLE (4"X2"), H=8.45m																										
688	03.13.01.14	BANCA DE CONCRETO, ACABADO SOLAJUADO EN DUCHAS																										
689	03.13.01.15	BANCA DE LISTONES DE MADERA, SOBRE PLATINAS DE FE EN VESTIDORES M-16A																										
690	03.13.01.16	TABLERO DE CONCRETO EN BAÑOS																										
691	03.13.01.17	BANCA DE CONCRETO, EN EXTERIOR																										
692	03.13.01.18	TAPA METALICA DE FE 1 10x110m, e=18" PARA ACCESO A AZOTEA																										
693	03.13.01.19	MAMPARRA CORTAVIENTO PERFILE DE ALUMINO COLOR NATURAL Y CELOSIA DE ALUMI																										
694	03.13.01.20	BANCAS DE MADERA APOYADA EN TABIQUE DE CONCRETO EN TERRAZAS																										
695	03.13.01.21	GRASS SINTETICO EN TERRAZA																										
696	03.13.01.22	ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm																										
697	03.13.01.23	RODÓN DE MADERA COPABA																										
698	03.13.01.24	PIENTE DE SEGURIDAD METALICO																										
699	03.13.01.25	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 8.00X3.50M EN DUCTOS - AZOTEA																										
700	03.13.01.26	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.00X3.50M EN DUCTOS - AZOTEA																										
701	03.13.01.27	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.50X3.50M EN DUCTOS - AZOTEA		</																								

RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL

CPM - RUTA CRITICA

